

**T.C.
BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ
2018 YILI YATIRIMLARI**



YATIRIM ve UYGULAMALAR

- 228 Proje
- 102.545.962 TL Ödenek

- 190 Proje Tamamlandı
- 94.137.766 TL Harcama

- %83 Proje Uygulaması
- %92 Harcama

İL ÖZEL İDARESİ YATIRIM PROJELERİ ve UYGULAMALARI

(31.12.2018 Tarihi İtibariyle)

BİRİM ADI	YILI PROGRAMI ve ÖDENEĞİ				UYGULAMA ve HARCAMA						
	TOPLAM PROJE (Ad)	ÖZEL İDARE	GENEL İDARE	TOPLAM ÖDENEK	BİTEN PROJE	DEVAM EDEN PROJE	İHALE AŞAMASINDA PROJE	BAŞLAMAYAN	TOPLAM HARCAMA	PROJE UYGULAMA ORANI (%)	HARCA MA ORANI (%)
1.YOL ve ULAŞIM HİZMETLERİ MÜD.	77	6.272.813	13.312.049	19.584.862	74	2	-	1	19.356.253	%96	%99
2.SU ve KANAL HİZMETLERİ MÜD.	63	3.914.069	4.502.046	8.416.115	59	-	-	4	5.446.776	%94	%65
3.PLAN PROJE YATIRIM ve İNŞAAT MÜD.	78	4.012.487	68.803.133	72.815.620	49	23	-	6	67.723.764	%63	%93
4.ÇEVRE KORUMA ve KONTROL MÜD.	5	1.522.365	-	1.522.365	4	-	-	1	1.472.365	%80	%97
5.KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜD.	5	207.000	-	207.000	4	-	-	1	138.608	%80	%67
İL ÖZEL İDARESİ GENEL TOPLAMI	228	15.928.734	86.617.228	102.545.962	190	25	-	13	94.137.766	%83	%92



BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ

**YOL ve ULAŞIM HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ**

YOL ve ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İÇMALI

SAYFA: 1

İŞİN ADI	PROGRAM (Proje Ad.)	UYGULAMA (Proje Ad.)	PROGRAM (Km)	UYGULAMA (Km)	Fiziki (%)	ÖZEL İDARE ÖDENEK	GENEL İDARE ÖDENEK	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA (TL)	MADDİ (%)	AÇIKLAMALAR
1.TESVİYE	2	2	15,00	15,00	%100						Bitti.
2.ONARIM	20	20	84,00	84,00	%100						Bitti.
3.STABİLİZE KAPLAMA	21	21	134,00	134,00	%100						Bitti.
4.BSK	15	13	93,30	71,30	%76	1.191.233	8.031.319	9.222.552	9.222.552	%100	Devam Ediyor.
5.SATHİ KAPLAMA	4	4	8,30	8,30	%100						Bitti.
6.BETON YOL	1	1	3,00	3,0	%100	-	768.139	768.139	768.139	%100	Bitti.
7.ASFALT YAPIM	1	1			%100	-	1.150.000	1.150.000	1.150.000	%100	Bitti.
8.BAKIM PROGRAMLARI											
GREYDERLİ BAKIM	1	1		750 Km							Bitti.
ASFALT BAKIM (YAMA)	1	1		400 Km							Bitti.
ASFALT YAMA (Malzeme Alımı)	1	1			%100	1.000.000	-	1.000.000	992.152	%99	Bitti.
ASFALT YAMA (Hizmet Alımı)	1	1			%100	361.010	-	361.010	355.397	%98	Bitti.
ASFALT YOL YAPIM ve MALZEME GİDERİ	1	1			%100	1.750.000	2.378.306	4.128.306	4.128.306	%100	Bitti.

YOL ve ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İÇMALI

SAYFA: 2

İŞİN ADI	PROGRAM (Proje Ad.)	UYGULAMA (Proje Ad.)	PROGRAM (Km)	UYGULAMA (Km)	Fiziki (%)	ÖZEL İDARE ÖDENEK	GENEL İDARE ÖDENEK	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA (TL)	MADDİ (%)	AÇIKLAMALAR
9.SANAT YAPILARI	1	1			%100	128.000	-	128.000	127.452	%100	Bitti.
10.TRAFİK LEVHALARI	1	1			%100	189.911	102.100	292.011	266.582	%91	Bitti.
11.İŞ MAKİNALARI ALIMI (İLLER BANKASI)	1	1			%100	1.166,764	-	1.166.764	1.166.764	%100	2 Ad.Renault Kango 2 Ad.Toyota Hilux 1 Ad Ford Minibüs 2 Ad Ekskavatör 1 Ad Kanal Kazıcı 1 Ad Volvo Yükleyici 4 Ad.Kamyon
12.YOL İŞARETLEME	1	1			%100	23.895	254.880	278.775	278.775	%100	Bitti.
13.PAZARYERİ KARADEDE KÖYYOLU KÖPRÜ YAPIMI	1	1			%100	222.358	-	100.000	83.187	%100	Bitti.
14.BOZÜYÜK HAMİDİYE KÖYYOLU MENFEZ YAPIMI	1	-			-	50.000	-	50.000	0	-	Başlamadı.
15.İŞ MAKİNALARI ALIMI	1	1			%100	189.642	-	189.642	189.642	%100	1 Ad.Silindir 1 Ad. Römork
16.PARKE TAŞI	1	1			%100	-	627.305	627.305	627.305	%100	Bitti.(27.305m2)
GENEL TOPLAM	77	74			%96	6.272.813	13.312.049	19.584.862	19.356.253	99%	

Merkez Gölümbe BSK Serimi




Merkez Beyce - Cumalı - İlyasça Grup Köyyolu PMT+BSK SERİMİ




Merkez Dy.İlt.-Koyunköy-Bahçecik-Bursa İnegöl Hd. Grup Köyyolu PMT+BSK SERİMİ



Bozüyük Çaydere – Kapanalan - Kuyupınar Grup Köyü PMT+BSK SERİMİ

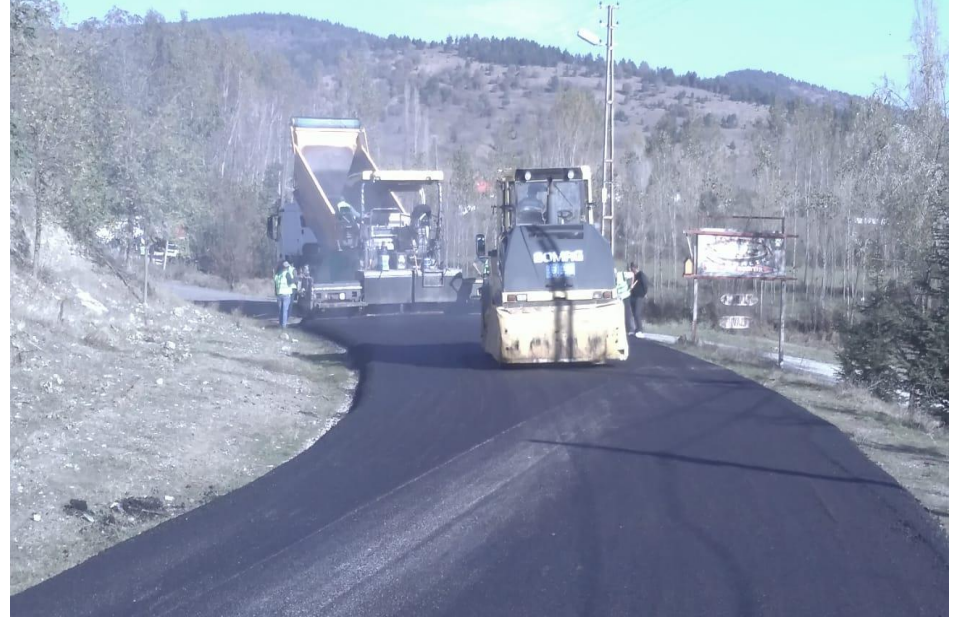

Bozüyük Poyra PMT+BSK SERİMİ

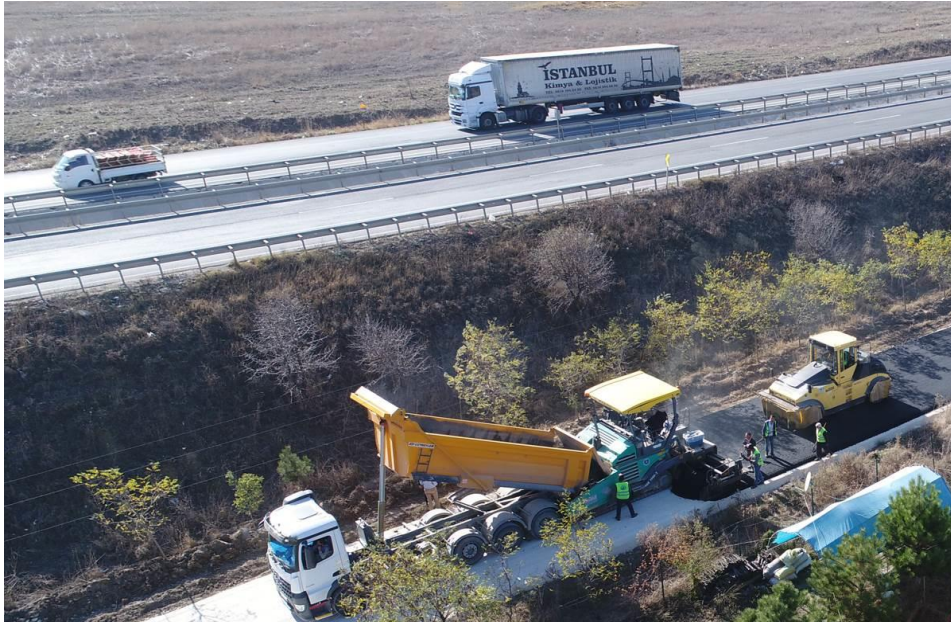

GÖLPAZARI SEYFİLER KÖPRÜCEK GRUP KÖYYOLU PMT + BSK SERİMİ



İnhisar Samrı Ortaca Grup Köyyolu Beton Yol Yapımı




İnhisar Samrı Ortaca Grup Köyyolu Beton Yol Yapımı



İnhisar Çayköy-Akköy-Harmanköy-Gölpazarı Hd.Grup Köyüolu PMT+BSK Yapımı



Osmaneli Soğucakpınar – Borçak Grup Köyyolu PMT + BSK SERİMİ

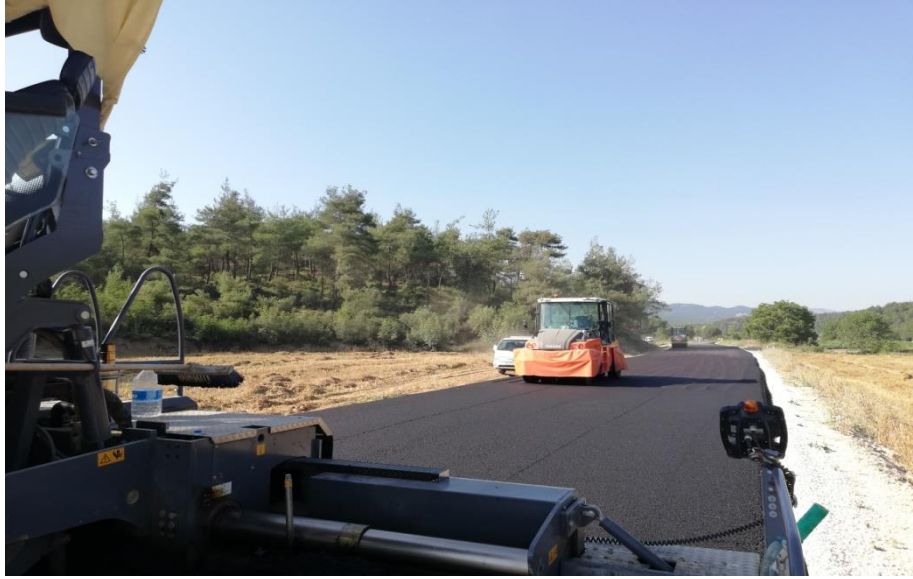

Söğüt-Kızılsaray-Savcıbey-Hayriye-Bozüyük Hd.İlt. Grup Köyyolu PMT + BSK SERİMİ



Sögüt Ortaca Menfez Yapımı



Pazaryeri Karadede Menfez Yapımı





BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ

**SU ve KANAL HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ**

SU ve KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İCMALİ

İşin Adı	Program (Proje Ad.)	Uygulama (Proje Ad.)	Fiziki (%)	Program Ödeneği (TL)			Harcama (TL)			Maddi (%)
				Özel İdare	Genel İdare	TOPLAM	Özel İdare	Genel İdare	TOPLAM	
1.İÇMESUYU PROJELERİ	44	44	%100	2.680.000	4.452.046	7.132.046	1.511.404	2.988.676	4.500.080	%63
2.KANALİZASYON PROJELERİ	9	9	%100	527.520	50.000	577.520	487.797	50.000	537.797	%93
3.SULAMA PROJELERİ	2	2	%100	149.999	-	149.999	148.251	-	148.251	%99
4.DİĞER TARIM PROJELERİ	8	4	%50	556.550		556.550	260.648		260.648	%47
GENEL TOPLAM	63	59	%94	3.914.069	4.502.046	8.416.115	2.408.100	3.038.676	5.446.776	%65

İÇMESUYU PROJELERİ

İşin Adı	PROGRAM (Proje Ad.)	UYGULAMA (Proje Ad.)	Fizi ki (%)	Program Ödeneği (TL)			HARCA MA (TL)	Mad di (%)	AÇIKLAMALAR
				Özel İdare	Genel İdare	TOPLAM ÖDENEK			
1.İÇMESUYU PROJELERİ	41	41	%100	-	4.452.046	4.452.046	2.988.676	%67	Muhtelif Köy ve Ünitelerde içmesuyu şebeke hattı, isale hattı, sondaj, drenaj ve depo bakım onarımları tamamlanmıştır.
2.İÇMESUYU BAKIM ONARIM	1	1	%100	2.340.000	0	2.340.000	1.304.564	%56	78 Köyde İçmesuyu borusu ve malzeme verilerek Devlet-Vatandaş işbirliği ile pür emanet olarak tesislerinin bakım onarımları tamamlandı.
3.İÇMESUYU DEPOLARI KLOR ALIMI	1	1	%100	150.000	0	150.000	22.243	%15	İhtiyacı olan muhtelif köy ve ünitelere dağıtımlar tamamlandı.
4.OTOMATİK KLORLAMA CİHAZI ALIM BAKIM ve ONARIM	1	1	%100	190.000	0	190.000	184.597	%97	Bitti.
GENEL TOPLAM	44	44	%100	2.680.000	4.452.046	7.132.046	4.500.080	%63	

MERKEZ KÜNÇEĞİZ İNŞ + ENH BİTTİ



BOZÜYÜK CİHANGAZİ İNŞ + ENH BİTTİ



GÖLPAZARI SARIHACILAR-CANSIZLAR MAH.İNŞ+ENH



OSMANELİ KIZILÖZ KÖYÜ İÇME SUYU TESİSİ BAKIM ONARIM İŞİ



YENİPAZAR DOĞUBELENÖREN SONDAŞ İŞİ



GÖLPAZARI DEREÇİKÖREN SONDAJ İŞİ



PAZARYERİ ALINCA DRENAJ ÇALIŞMASI



İNİSAR MURATÇA DRENAJ ÇALIŞMASI



İÇMESULARI BAKIM ONARIM (KLORLAMA BİNALARI) İŞLERİ



İÇMESUYU BAKIM ONARIM İŞLERİ



KANALİZASYON PROJELERİ

İŞİN ADI	PROGRAM (Proje Ad.)	UYGULAMA (Proje Ad.)	Fiziki (%)	PROGRAM ÖDENEĞİ (TL)			HARCAMA (TL)	MADDİ (%)	AÇIKLAMALAR
				ÖZEL İDARE	GENEL İDARE	TOPLAM			
1.KANALİZASYON YENİ İŞLER	5	5	%100	0		0	0		Bozüyük-Aşağıarmutlu, Kuyupınar, Ormangöze – Gölpazarı Büyüksürmeli, Büyüksürmeli-Küçüksürmeli Mahallesi Bitti
2.KANALİZASYON BAKIM ONARIM İŞLERİ	1	1	%100	300.000		300.000	260.742	%87	31 Köyde Korige boru ve malzeme yardımı yapılarak Devlet-Vatandaş işbirliği ile pür emanet olarak kanalizasyon hatlarının bakım onarımları tamamlandı.
3.FOSSEPTİK YAPIMI	1	1	%100	81.000		81.000	80.774	%100	Gölpazarı-Aktaş-Beşevler Mahallesi Bitti.
4.DOĞAL ARITMA	1	1	%100	143.520	50.000	193.520	193.520	%100	Yenipazar-Karahasanlar Bitti.
5.VİDANJÖR KİRALAMA ve TEMİZLİK HİZ.	1	1	%100	3.000		3.000	2.761	%92	Bitti.
GENEL TOPLAM	9	9	%100	527.520	50.000	577.520	537.797	93%	

BOZÜYÜK AŞAĞIARMUTLU YENİ KANALİZASYON BİTTİ



BOZÜYÜK KUYUPINAR YENİ KANALİZASYON BİTTİ



GÖLPAZARI BÜYÜKSÜRMEİ KÜÇÜKSÜRMEİ YENİ KANALİZASYON BİTTİ



SÖĞÜT OLUKLU KANALİZASYON YENİLEME BİTTİ



GÖLPAZARI AKTAŞ-BEŞEVLER FOSSEPTİK YAPIMI BİTTİ



YENİPAZAR-KARAHANLAR DOĞAL ARITMA YAPIMI BİTTİ



SULAMA PROJELERİ

İŞİN ADI	PROGRAM (Proje Ad.)	UYGULAMA (Proje Ad.)	Fiziki (%)	PROGRAM ÖDENEĞİ (TL)			HARCA MA (TL)	MADDİ (%)	AÇIKLAMALAR
				ÖZEL İDARE	GENEL İDARE	TOPLAM			
1-TARIMSAL ENH.PRJ.	2	2	%100	149.999	0	149.999	148.251	%99	Merkez-Aşağıköy ve Osmaneli-Medetli Bitti.
GENEL TOPLAM	2	2	%100	149.999	0	149.999	148.251	%99	

DİĞER TARIM PROJELERİ

İŞİN ADI	PROGRAM (Proje Ad.)	UYGULAMA (Proje Ad.)	Fiziki (%)	PROGRAM ÖDENEĞİ (TL)			HARCAMA (TL)	MADDİ (%)	AÇIKLAMALAR
				ÖZEL İDARE	GENEL İDARE	TOPLAM			
1.Yem Bitkileri geliştirme projesi	1	1	%100	175.000		175.000	175.000	%100	TAHAGEL aracılığı ile 500 çiftçiye Macar Fiğ ve Yonca Tohumu %40 destk.Dağıtıldı.
2.Tahagel Payı	1	1	%100	37.550		37.550	37.550	%100	TAHAGEL bütçesi desteklendi.
3.Sebze Sınıflandırma ve Paketleme	1	-		40.000		40.000	-	-	Kalkınma Ajansı Projesi Yapıldı
4.Söğüt Çaltı Köyü Sebze Sınıflandırma ve Paketleme Tesisi Yapımı	1	-		125.000		125.000	-	-	Kalkınma Ajansı Proje Desteği olarak ayrıldı
5.İnhisar Tarpak Köyü Sebze Sınıflandırma ve Paketleme Tesisi Yapımı	1	-		125.000		125.000	-	-	Ödenek yetersiz. Proje safhasında
6.Örtü Altı Topraksız Çilek Yetiştiriciliği	1	1	%100	35.000		35.000	35.000	%100	Gölpazarı KHGB.nce Kurşunlu Köyüne Sera yapıldı.
7.Ağaçlandırma Faliyetleri	1	-		4.000		4.000	-	-	
8.Mevsimlik İşçilerin Yaşam Şart.İyileş.	1	1	%100	15.000		15.000	13.098	%87	Bitti.Hazır WC ve Duş alımı yapıldı
GENEL TOPLAM	8	4	%50	556.550		556.550	260.648	%47	



BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ

**PLAN PROJE YATIRIM VE
İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ**

PLAN PROJE YATIRIM ve İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

İCMALİ

İşin Adı	Program (Ad.)	Uygulama (Ad.)	Fiziki (%)	Program Ödeneği (TL)			Harcama (TL)			Mad di (%)
				Özel İdare	Genel İdare	TOPLAM	Özel İdare	Genel İdare	TOPLAM	
1.EĞİTİM HİZMETLERİ	49	36	73%	3.883.300	55.470.759	59.354.059	3.883.300	53.119.400	57.002.700	96%
2.SAĞLIK HİZMETLERİ	7	0	0%	0	5.288.077	5.288.077	0	2.567.580	2.567.580	49%
3.GÜVENLİK HİZMETLERİ	10	9	90%	0	4.179.686	4.179.686	0	4.179.686	4.179.686	100%
4.TESİS BAKIM ONARIM	8	3	38%	109.187	636.607	745.794	109.187	636.607	745.794	100%
5.KÜLTÜR VE TURİZM	3	1	33%	0	3.228.004	3.228.004	0	3.228.004	3.228.004	100%
6.SOSYAL HİZMETLER	1	0	0%	20.000	0	20.000	0	0	0	0%
GENEL TOPLAM	78	49	63%	4.012.487	68.803.133	72.815.620	3.992.487	63.731.277	67.723.764	93%

EĞİTİM HİZMETLERİ

PROJE NO	PROJENİN ADI	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	PROGRAM ÖDENEĞİ	TOPLAM HARCAMA	Fiziki (%)	AÇIKLAMALAR
EĞİTİM HİZMETLERİ (ONARIMLAR)							
1	Pazaryeri Halk Eğitim Peyzaj ve Çevre Düzenleme İşi.	389.000		444.822	444.822	100%	Bitti.
2	Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hiz.Bin. Güçlendirme ve On.İşi	855.000		1.109.200	1.109.200	100%	Bitti.
3	Bilecik Osmaniye 75.Yıl Lisesi Spor Salonu Çatı Onarım İşi	81.150		95.757	95.757	100%	Bitti.
4	Bilecik Endüstri Meslek Lisesi Ana Pano Yapım İşi.	39.400		45.952	45.952	100%	Bitti.
5	Bilecik İl Özel İdaresi İzolasyonlu Prefabrikte Depo Alımı İşi.	210.000		247.800	247.800	100%	Bitti.
6	Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yeni Hiz.Bin. Çevre Düz. İşi	268.400		316.712	316.712	100%	Bitti.
7	Bilecik Merkez Prefabrikte Depo Temel İmalatlarının Yapılması İşi.	53.100		62.658	62.658	100%	Bitti.
8	Bilecik Osmaniye Yeni ÇPL Binası 400KVA Trafo Tesisi Yapım İşi.	109.000		137.536	137.536	100%	Bitti.
9	Bilecik Gölpazarı İsmail Kara Anaokulu Doğalgaz Dön.ve On.İşi	130.000		150.127	150.127	100%	Bitti.
10	Bilecik Bozüyük Şeyh Edebali MTAL Wc Onarım İşi	86.749		101.524	101.524	100%	Bitti.
11	Bilecik Bozüyük Halime Hatun Anaokulu Onarım İşi	54.000		63.595	63.595	100%	Bitti.
12	Bilecik Bozüyük Kandilli İlkokulu-Ortaokulu Bakım Onarım İşi.	43.000		50.740	50.740	100%	Bitti.
T O P L A M :		2.318.799		2.826.423	2.826.423		

EĞİTİM HİZMETLERİ

PROJE NO	PROJENİN ADI	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	PROGRAM ÖDENEĞİ	TOPLAM HARCAMA	Fiziki (%)	AÇIKLAMALAR
	NAKLİ YEKÜN	2.318.799		2.826.423	2.826.423		
EĞİTİM HİZMETLERİ (ONARIMLAR)							
13	Bozüyük Mustafa Şeker Anadolu Lis.Isıtma Tes.Kaskad Sis. Dön. İşi.	175.000		206.500	206.500	100%	Bitti.
14	Merkez Ertuğrulgazi İlkokulu Ana Bina Çatı Onarım İşi	30.200		35.636	35.636	100%	Bitti.
15	Merkez Toki İlkokulu Kalorifer Kazanının Kaskad Sistemi Dön.İşi.	103.750		122.425	122.425	100%	Bitti.
16	Merkez Edebalı Ortaokulu Bak.On.	76.700		90.448	90.448	100%	Bitti.
17	Merkez Murat Hüdavendigar Ortaokulu Bakım Onarım İşi	104.500		123.310	123.310	100%	Bitti.
18	Bilecik Pazaryeri Atatürk Ortaokulu Onarım İşi	22.900		25.149	25.149	100%	Bitti.
19	Bilecik Osmaneli Anaokulu Bakım ve Onarım İşi	42.000		49.560	49.560	100%	Bitti.
20	Bilecik Pazaryeri Şehit Zafer Koyuncu İmam Hatip Ort.On.İşi	47.000		54.867	54.867	100%	Bitti.
21	Bilecik Gölpazarı 15 Temmuz Şeh. Pan.Doğalgaz Dön.ve Genel On.İşi.	223.000		252.141	252.141	100%	Bitti.
22	Bilecik Gölpazarı Halk Eğitim Merkezi Doğalgaz Dön.ve On.İşi	141.000		163.259	163.259	100%	Bitti.
23	Bilecik Gölpazarı Köprülü Mehmetpaşa MTAL Onarım İşi	284.000		335.120	335.120	100%	Bitti.
24	Bilecik Pazaryeri Çok Programlı Lisesi Bakım Onarım İşi	71.000		79.750	79.750	100%	Bitti.
	T O P L A M :	3.639.849		4.364.588	4.364.588		

EĞİTİM HİZMETLERİ

PROJE NO	PROJENİN ADI	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	PROGRAM ÖDENEĞİ	TOPLAM HARCAMA	Fiziki (%)	AÇIKLAMALAR
	NAKLİ YEKÜN	3.639.849		4.364.588	4.364.588		
EĞİTİM HİZMETLERİ (ONARIMLAR)							
25	Bilecik İnhisar Atatürk İlkokulu Yemek.ve Kapalı Spor Sal.Çatı On.İşi	32.100		27.388	27.388	100%	Bitti.
26	Bilecik Söğüt 700.Yıl Mesleki Tek.An.Lis.Derslik Bin.Çatı On.İşi	39.870		42.191	42.191	100%	Bitti.
27	Osmaneli Osmangazi İlkokulu Bahçe Bakım Onarımı ve Pratoner Yapım İşi	39.750		46.905	46.905	100%	Bitti.
28	Söğüt Çaltı İlkokulu Onarım İşi	54.000		49.866	49.866	100%	Bitti.
29	Gölpazarı Güner Orbay MTAL Doğalgaz Dönüşüm İşi	79.000		88.887	88.887	100%	Bitti.
30	Osmaneli 75.Yıl Anadolu Lisesi Çatı Onarım İşi	59.400		70.092	70.092	100%	Bitti.
EĞİTİM HİZMETLERİ (GÜÇLENDİRMELER)							
1	Bilecik Bozüyük Mustafa Şeker Anadolu Lisesi Derslik ve Pansiyon Bin.Güçlendirme ve On. İkmal İşi	637.200		689.159	689.159	100%	Bitti.
2	Merkez Osmangazi Ortaokulu Güçlendirme İşi	1.710.410		1.025.144	1.319.883	65%	Devam Ediyor.
3	Bilecik Söğüt Anadolu İmam Hatip Lisesi Güçlendirme ve Onarım İşi	1.114.156		1.305.458	568.706	50%	Devam Ediyor.
	T O P L A M :	7.405.735		7.709.678	7.267.665		

EĞİTİM HİZMETLERİ

PROJE NO	PROJENİN ADI	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	PROGRAM ÖDENEĞİ	TOPLAM HARCAMA	Fiziki (%)	AÇIKLAMALAR
	NAKLİ YEKÜN	7.405.735		7.709.678	7.267.665		
EĞİTİM HİZMETLERİ (YENİ YAPIMLAR)							
1	Merkez Anadolu İmam Hatip Lis. 100 Öğrenci Kap.Pan.Bin.Yap.İşi	3.747.680	3.893.800	101.680	101.680	100%	Bitti.
2	Osmaneli 22 Derslikli Ç.P.L. Atölye Bin.ile Gen.Altıyapı ve Çevre Düz.	6.360.200	2.988.415	3.433.144	3.433.144	100%	Bitti.
3	Pazaryeri 16 Derslik Sağlık Mes.Lis. ve 200 Öğrencilik Pan.Bin.	6.176.120	2.287.638	4.212.982	4.212.982	100%	Bitti.
4	Osmaneli 100 öğrenci kapasiteli Orta Öğretim Pansiyon Binası	4.386.650	894.649	3.505.988	3.505.988	99%	Geçici Kabul Aşamasında
5	Söğüt 100 öğrenci Kapasiteli Pansiyon Binası ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi	4.262.160	1.279.030	2.961.365	2.961.365	100%	Bitti.
6	Söğüt Salih ve Ömer Musaoğlu İlkokulu 21 Ek Derslikli Bina Yap.	3.479.820	472.855	3.114.712	3.114.712	100%	Bitti.
7	Gölpazarı 21 derslikli İmam Hatip Lis.ve100 öğrencili pan.binası tatbikat Camii ve çevre düz.işi	9.667.740	1.574.383	7.409.080	7.409.080	87%	Devam Ediyor.
8	Osmaneli 24 Derslik Balaban İlkokulu	5.233.300		4.739.691	4.739.691	91%	Devam Ediyor.
9	Bozüyük 24 Derslikli Mesleki Tek.Anadolu Lisesi	6.360.200		5.054.497	5.054.497	79%	Devam Ediyor.
10	Gölpazarı 20 Derslikli Şehit Kemal AY Anadolu Lis.	7.232.220		4.443.509	4.443.509	50%	Devam Ediyor.
	T O P L A M :	64.311.825	13.390.770	46.686.326	46.244.313		

EĞİTİM HİZMETLERİ

PROJE NO	PROJENİN ADI	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	PROGRAM ÖDENEĞİ	TOPLAM HARCAMA	FİZİKİ (%)	AÇIKLAMALAR
	NAKLİ YEKÜN	64.311.825	13.390.770	46.686.326	46.244.313		
EĞİTİM HİZMETLERİ (YENİ YAPIMLAR)							
11	Bilecik Bilim Sanat Merkezi Yap.İşi	6.690.600		2.835.907	2.835.907	40%	Devam Ediyor.
12	Merkez Ertuğrulgazi Lis.100 Öğrenci kapasiteli Pansiyon Binası Yapım işi	5.426.820		1.438.341	1.438.341	23%	Devam Ediyor.
13	Merkez 20 Derslikli Hayme Ana Meslek ve Tek.Lis.	8.108.960		4.425.810	2.516.464	17%	Devam Ediyor.
14	Söğüt Ertuğrulgazi Mesleki ve Tek.Anadolu Lisesi Spor Salonu	2.174.740		594.424	594.424	27%	Devam Ediyor.
15	Bilecik Merkez 8 Derslikli Anaokulu Yap.İşi	3.291.020		1.108.650	1.108.650	20%	Devam Ediyor.
16	Bozüyük 32 Derslikli Ortaokulu Yap.İşi	11.139.200		2.264.601	2.264.601	13%	Devam Ediyor.
	EĞİTİM HİZMETLERİ TOPLAMI	101.143.165	13.390.770	59.354.059	57.002.700		

Osmaneli 22 Ders.Ç.P.L., Atölye Binası ile Genel Altyapı ve Çevre Düzenleme Yapım İşi

İhale Bedeli : 6.421.560,00 TL
Yüklenici Firma : Hazantem
Tem.İnş.Gıda Otom.Taah.San.Tic.Ltd.Şti.
Sözleşme Tarihi : 20.01.2017
Yer Teslim Tarihi : 24.01.2017
İşin süresi : 500 gün
İşin bitiş tarihi : 08.06.2018
Fiziki gerçekleşme : % 100
Mevcut Durum : (Bitti.)



Pazaryeri 16 Ders.Sağlık Mes.Lis. Ve 200 Öğr.Kapasiteli Pans.Bin.ve Çevre Düz. Yap.İşi

İhale Bedeli : 6.500.620,00 TL
Yüklenici Firma : Ak Him Yapı Müh.Turz.
Gıda Yat.San.ve Tic.Ltd.Şti.
Sözleşme Tarihi : 09.03.2017
Yer Teslim Tarihi : 13.03.2017
İşin süresi : 450 gün
İşin bitiş tarihi :05.06.2018
Fiziki gerçekleşme : % 100
Mevcut Durum : (Bitti.)



Bilecik Osmaneli 100 öğrenci Kapasiteli Orta Öğretim Pansiyon Binası Yapım İşi

İhale Bedeli : 4.386.650,00 TL
Yüklenici Firma : Cihat AKTUNA-AKM Yapı
Dek. İnş.San. Ve Tic.Ltd.Şti. İş Ortak.
Sözleşme Tarihi : 01.05.2017
Yer Teslim Tarihi : 08.05.2017
İşin süresi : 450+59 gün
İşin bitiş tarihi : 29.09.2018
Fiziki gerçekleşme : % 99
Mevcut Durum :Geçici Kabul Aşamasında



Bilecik Söğüt 100 öğrenci Kapasiteli Pansiyon Binası ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi

İhale Bedeli	: 4.262.160,00 TL
Yüklenici Firma	: Ali Enver BAĞAN
Sözleşme Tarihi	:24.05.2017
Yer Teslim Tarihi	: 29.05.2017
İşin süresi	: 450 gün
İşin bitiş tarihi	:21.08.2018
Fiziki gerçekleşme	: % 100
Mevcut Durum	: BİTTİ



Bilecik Söğüt Salih ve Ömer Musaoğlu İlkokulu 21 Ek Derslik Binası Yapımı İşi

İhale Bedeli : 3.587.567,02 TL
Yüklenici Firma : Oraka İnş.Taah.Gıda
San.ve Tic.Ltd.Şti.
Sözleşme Tarihi : 30.06.2017
Yer Teslim Tarihi : 05.07.2017
İşin süresi : 450 gün
İşin bitiş tarihi :27.09.2018
Fiziki gerçekleşme : % 100
Mevcut Durum : (Bitti.)




Bilecik Gölpaazarı 21 Ders.İmam Hatip Lis. 100 Öğr.Pans.Bin., Tatbikat Camii ve Çevre Düz.İşi.

İhale Bedeli : 9.667.740,00 TL
Yüklenici Firma : Mehmet Salih
ÇELİK/Mehmet AYTAŞ İş Ortaklığı.
Sözleşme Tarihi : 20.06.2017
Yer Teslim Tarihi : 23.06.2017
İşin süresi : 700 gün
İşin bitiş tarihi : 24.05.2019
Fiziki gerçekleşme : % 87
Mevcut Durum :Devam Ediyor.



Bilecik Osmaneli 24 Derslikli Balaban İlkokulu Yapım İŖi.

İhale Bedeli : 5.233.300,00 TL
Yüklenici Firma : Hazantem Tem.İnŖ.Ğıda
Otomosyon Taah.San.Tic.Ltd.Ŗti.
İhale Tarihi : 20.11.2017
İŖe BaŖlama Tarihi : 18.12.2017
İŖin süresi : 500 gün
İŖin bitiŖ tarihi : 01.05.2019
Fiziki gerçekteŖme : % 91
Mevcut Durum : Devam Ediyor.

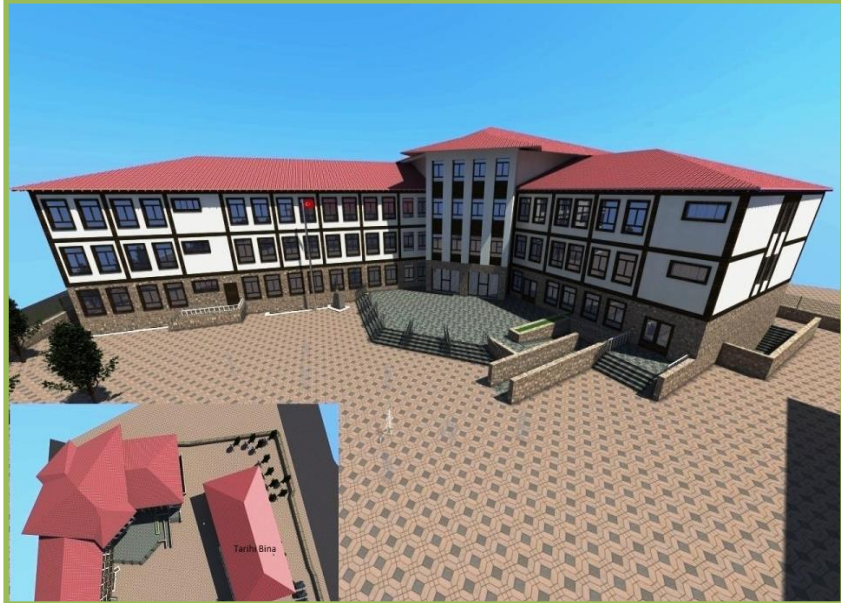

BİLECİK BOZÜYÜK 24 DERSLİKLİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ YAPIM İŞİ

İhale Bedeli : 6.360.200,00 TL
Yüklenici Firma : Hazantem Tem. İnş. Gıda
Otomasyon Taah. San. Tic. Ltd. Şti.
İhale Tarihi : 20.11.2017
İşe Başlama Tarihi : 18.12.2017
İşin süresi : 550 gün
İşin bitiş tarihi : 20.06.2019
Fiziki gerçekleşme : % 79
Mevcut Durum : Devam Ediyor.



Gölpazarı 20 Derslikli Şehit Kemal AY Anadolu Lisesi Yapım İşi

İhale Bedeli : 7.232.220,00 TL
Yüklenici Firma : MEHMET SALİH ÇELİK-
Mehmet AYTAŞ İş Ortaklığı
İhale Tarihi : 12.02.2018
İşe Başlama Tarihi : 12.03.2018
İşin süresi : 450 gün
İşin bitiş tarihi : 05.06.2019
Fiziki gerçekleşme : % 50
Mevcut Durum : Devam Ediyor.



BİLECİK GÖLPAZARI ŞEHİT KEMAL AY LİSESİ



GÖKSEL TUR. İNŞ. VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
İstiklal Mh. Santral Sk. No:1 / 16 ESKİŞEHİR
0222 230 41 48 / www.gokselinsaat.com.tr



Bilecik Bilim Sanat Merkezi Yapım İŖi

İhale Bedeli	: 6.690.600,00 TL
Yüklenici Firma	: Ufuk AYKAÇ-Utay Dek. İnŖ. Müh. San. Tic. Ltd.Ŗti. İŖ Ortaklığı
İhale Tarihi	: 27.02.2018
İŖe BaŖlama Tarihi	: 30.03.2018
İŖin süresi	: 400 gün
İŖin bitiŖ tarihi	: 04.05.2019
Fiziki gerçekteŖme	: % 40
Mevcut Durum	: Devam Ediyor.



Bilecik Bozüyük Meliha Ercan 24 Derslikli Ortaöğretim Bina Yapım İşi

İhale Bedeli :
Yüklenici Firma : Bien Seramik tarafından
yaptırılmaktadır.
Fiziki gerçekleşme : %40
Mevcut Durum : Devam Ediyor.



Bilecik Merkez Ertuğrul Gazi Lisesi 100 Öğrenci Kapasiteli Pansiyon Binası Yapım İşi

İhale Bedeli : 4.599.000TL
Yüklenici Firma : Mevlut Ali KONYA
İhale Tarihi : 21.05.2018
İşe Başlama Tarihi : 18.06.2018
İşin süresi : 360 Gün
İşin bitiş tarihi : 12.06.2019
Fiziki gerçekleşme : % 23
Mevcut Durum : Devam Ediyor.



Bilecik Bozüyük 32 DERSLİKLİ ORTAOKULU YAPIM İŞİ

İhale Bedeli : 9.440.000 TL
Yüklenici Firma : Korgun Yapı San.ve
Tic.Ltd.Şti.-Mehmet Kızıl İş Ortaklığı
İhale Tarihi : 23.07.2018
İşe Başlama Tarihi : 17.08.2018
İşin süresi : 360 Gün
İşin bitiş tarihi :12.08.2019
Fiziki gerçekleşme : % 13
Mevcut Durum : Devam Ediyor.



BİLECİK BOZÜYÜK 32 DERSLİKLİ ORTAOKULU PROJESİ



TMH MÜHENDİSLİK

MİMARİ PROJE
MEHMET PINAREVLİ Y. MİMAR (0010)



Bilecik Merkez Anaokulu Yapım İŖi

İhale Bedeli : 2.789.000 TL
Yüklenici Firma :Ufuk AYTAÇ/ Utay
Dek.İnŖ. Müh.San.Tic.Ltd.Ŗti. İŖ Ortaklıđı
İhale Tarihi : 09.07.2018
İŖe BaŖlama Tarihi : 31.07.2018
İŖin süresi : 240 Gün
İŖin bitiŖ tarihi :28.03.2019
Fiziki gerçekteŖme : % 20
Mevcut Durum : Devam Ediyor.



Söğüt Ertuğrulgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu Yapım İşi

İhale Bedeli	: 1.843.000 TL
Yüklenici Firma	: Alve İnş.İnş.Malz.Gıda
San.Tic.Ltd.Şti.	
İhale Tarihi	: 26.06.2018
İşe Başlama Tarihi	: 23.07.2018
İşin süresi	: 210 Gün
İşin bitiş tarihi	: 18.02.2019
Fiziki gerçekleşme	: % 27
Mevcut Durum	: Devam Ediyor.



Merkez 20 Derslikli Hayme Ana Meslek ve Tek.Lise Yapım İŖi

İhale Bedeli : 6.872.000 TL
Yüklenici Firma : Alve İnŖ.İNŖ.Malz.Gıda
San.Tic.Ltd.Ŗti.
İhale Tarihi : 06.06.2018
İŖe BaŖlama Tarihi : 13.07.2018
İŖin süresi : 300 Gün
İŖin bitiŖ tarihi : 09.05.2019
Fiziki gerçekteŖme : % 17
Mevcut Durum : Devam Ediyor.



Bilecik Merkez Osmangazi Ortaokulu Güçlendirme ve Büyük Onarım İşi

İhale Bedeli : 1.449.500 TL
Yüklenici Firma : Mes-Ko
İnş.Müh.Mim.Bilg.San.Tic.Ltde.Şti.-Ezgin KAYA
İhale Tarihi : 02.07.2018
İşe Başlama Tarihi : 21.01.2018
İşin süresi : 180 Gün
İşin bitiş tarihi : 09.05.2019
Fiziki gerçekleşme : % 65
Mevcut Durum : Devam Ediyor.



Bilecik Söğüt İmam Hatip Lisesi Güçlendirme ve Büyük Onarım İşi

İhale Bedeli	: 944.200.00TL
Yüklenici Firma	: Abdulsamet GÜVEN
İhale Tarihi	: 19.06.2018
İşe Başlama Tarihi	: 23.07.2018
İşin süresi	: 180 Gün
İşin bitiş tarihi	: 19.01.2018
Fiziki gerçekleşme	: % 50
Mevcut Durum	: Devam Ediyor.



SAĞLIK HİZMETLERİ

PROJE NO	PROJENİN ADI	PROJE TUTARI	PROGRAM ÖDENEĞİ	TOPLAM HARCAMA	FİZİKİ (%)	AÇIKLAMALAR
1	BOZÜYÜK 5-6 Hek.ASM+TSM+112 ASHİ Bina Yapım işi	2.781.260	1.577.330	1.100.386	35%	Devam Ediyor.
2	Osmaneli 5-6 Hek.ASM+TSM+112 ASHİ Bina Yapım işi	3.363.000	1.585.000	1.141.447	34%	Devam Ediyor.
3	Yenipazar Entegre Has. Ek Bina işi	1.716.900	325.747	325.747	19%	Devam Ediyor.
4	Bilecik Merkez Hürriyet Mah.4-5 Hekimli ASM Merkezi Yapım İşi	1.223.660				Yer Teslimi Yapılmıştır.
5	Bozüyük Palyotif TRSM+Diş Protez Merk.Yapımı	1.500.000	1.500.000	0		Bakanlık Onayı Gelmiş Uygulama Projelerine Başlanmıştır.
6	BOZÜYÜK 5-6 Hek.ASM+TSM+112 ASHİ Bina Yapım işi					Projeler Revize Edilecektir.
7	Merkez 2 Hek.ASM+TSM Bina yap.ışi	300.000	300.000	0		Proje Yeri Değerlendirilmektedir.
	SAĞLIK HİZMETLERİ TOPLAMI	10.884.820	5.288.077	2.567.580		

BOZÜYÜK 5-6 Hek.ASM+TSM+112 ASHİ Bina Yapım İşi

İhale Bedeli : 2.357.000.00TL
Yüklenici Firma : Mehmet TANYELİ
İnş.Pet.Ür.Mob.Day.Tük.Mal.San.ve Tic.Ltd.Şti
İhale Tarihi : 12.06.2018
İşe Başlama Tarihi : 06.07.2018
İşin süresi : 270 Gün
İşin bitiş tarihi : 02.04.2019
Fiziki gerçekleşme : % 35
Mevcut Durum : Devam Ediyor.



Osmaneli 5-6 Hek.ASM+TSM+112 ASHİ Bina Yapım işi

İhale Bedeli : 2.850.000.00TL
Yüklenici Firma :Muhammet KOCAMAN-
Özay Mad.Müh.İnş.San.Tic. Ltd. Şti.
İhale Tarihi : 17.08.2018
İşe Başlama Tarihi : 18.09.2018
İşin süresi : 270 Gün
İşin bitiş tarihi :15.06.2019
Fiziki gerçekleşme : % 34
Mevcut Durum : Devam Ediyor.



Yenipazar Entegre Has. Ek Bina işi

İhale Bedeli : 1.455.000.00TL
Yüklenici Firma : Hanet İnş.San.ve
Tic.Ltd.Şti./ Tekin Tanış İnş.Taah.Temz.Hizm.İş
Ortaklığı
İhale Tarihi : 06.05.2018
İşe Başlama Tarihi : 31.07.2018
İşin süresi : 270 Gün
İşin bitiş tarihi : 27.04.2018
Fiziki gerçekleşme : % 19
Mevcut Durum : Devam Ediyor.



BİLECİK MERKEZ HÜRRİYET MAH. 4-5 HEKİMLİ ASM MERKEZİ YAPIM İŞİ

İhale Bedeli	: 1.031.472.40TL
Yüklenici Firma	:MEHMET ZEKİ ADIYAMAN
İhale Tarihi	: 14.11.2018
İşe Başlama Tarihi	: 07.12.2018
İşin süresi	: 180 GÜN
İşin bitiş tarihi	: 05.06.2018
Fiziki gerçekleşme	: 0
Mevcut Durum	: YER TESLİMİ YAPILMIŞTIR.



GÜVENLİK HİZMETLERİ

PROJE NO	PROJENİN ADI	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	PROGRAM ÖDENEĞİ	TOPLAM HARCAMA	Fiziki (%)	AÇIKLAMALAR
1	Bilecik Merkez Çarşı Polis Merkez Amirliği ve Olay Yeri İnceleme Müd.Hiz. Binası	3.589.560	3.738.734	137.963	137.963	100%	Bitti.
2	Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası Yap.İşi	2.259.700	912.477	1.524.223	1.524.223	100%	Bitti.
3	Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı Elektrik Havai Hattı Yeraltına Alınması İşi	6.313.000	6.246.259	692.812	692.812	100%	Bitti.
4	Bilecik Söğüt Jand. Ulaştırma Tabur Kom. Yatakhane Bin. Man.ve On.İşi	398.840		392.274	392.274	100%	Bitti.
5	Bilecik Mrk. 2. Jand. Eğt. Tug.Kom. 2 Tab. Hiz.Bin.Man.ve Büyük On.	966.420		1.008.900	1.008.900	100%	Bitti.
6	Bilecik Merkez Emniyet Müd.Ek Hiz.Çevre Düzenleme İşi	140.000		137.588	137.588	100%	Bitti.
7	Bozüyük Bölge Trafik Denetleme İst.Amirliği Hiz.Bin.Proje Haz.İşi.	36.698		36.698	36.698	100%	Bitti.
8	Bilecik Gölpazarı İlçe Emniyet Amirliği Hizmet Binası Doğalgaz Dönüşüm İşi	94.164		91.981	91.981	100%	Bitti.
9	Bilecik Gölpazarı İlçe Emniyet Amirliği Loj.Doğalgaz Dönüşüm İşi	125.552		87.627	87.627		Devam Ediyor.
10	Bilecik Merkez Yeni Bölge Trafik Hizmet Bin.Doğalgaz Dönüşüm İşi	69.620		69.620	69.620	100%	Bitti.
	GÜVENLİK HİZMETLERİ TOPLAMI	13.993.554	10.897.470	4.179.686	4.179.686		

Bilecik İli Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası Yapım İşi

İhale Bedeli	: 2.259.700,00 TL
Yüklenici Firma	: Gençbilaloğlu İnş.Gıd.Mad. Tekstil Orman Ürünleri Tic.Ltd.Şti.
Sözleşme Tarihi	: 18.05.2017
Yer Teslim Tarihi	: 22.05.2017
İşin süresi	: 400 gün
İşin bitiş tarihi	: 26.06.2018
Fiziki gerçekleşme	: % 100
Mevcut durum	: Bitti.



Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı Elektrik Havai Hattı Yeraltına Alınması İşi

İhale Bedeli : 6.313.000,00 TL
Yüklenici Firma : Bilçelik Elektrik İnş.Turz.San. Ve Tic.Ltd.Şti.
Sözleşme Tarihi : 21.06.2017
Yer Teslim Tarihi : 23.06.2017
İşin süresi : 365gün
İşin bitiş tarihi : 22.06.2018
Fiziki gerçekleşme : % 100
Mevcut Durum : Bitti.



Bilecik Bozüyük Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliđi Hizmet Binası Yapım İŖi

Ödenek Beklenmektedir.



KÜLTÜR TURİZM HİZMETLERİ

PROJE NO	PROJENİN ADI	PROJE TUTAR	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	PROGRAM ÖDENEĞİ	TOPLAM HARCAMA	FİZİKİ (%)	AÇIKLAMALAR
1	Hükümet Konağı Restorasyon Yapım işi	3.633.951	577.659	2.872.329	2.872.329	60%	Devam Ediyor.
2	Söğüt Borçak köyü İsa Sofu Türbesi Restorasyon ve Onarım işi	91.588	91.588	0	0	100%	Bitti.
3	Malhatun İlkokulu Eski Taş Mektep Bin.Restorasyon Yap.İşi	1.307.277		355.677	355.677	10%	Devam Ediyor.
	KÜLTÜR ve TURİZM TOPLAMI	5.032.816	669.247	3.228.004	3.228.004		

SOSYAL HİZMETLER

PROJE NO	PROJENİN ADI	PROJE TUTAR	PROGRAM ÖDENEĞİ	TOPLAM HARCAMA	FİZİKİ (%)	AÇIKLAMALAR
1	Semt Sahaları Bakım ve Onarımı	20.000	20.000	0	-	Başlamadı.
1	SOSYAL HİZMETLER TOPLAMI	20.000	20.000	0		

Hükümet Konağı Restorasyon Yapım İşi

İhale Bedeli : 3.633.951,00 TL
Yüklenici Firma : Emine Yavuz-Yavuz
Mimarlık-
Sözleşme Tarihi : 07.03.2017
Yer Teslim Tarihi : 13.03.2017
İşin süresi : 600 gün
İşin bitiş tarihi : 28.01.2019
Fiziki gerçekleşme : % 60
Mevcut Durum : İş artışı ödeneği beklenmektedir.



Malhatun İlkokulu Eski Taş Mektep Binası Restorasyon İşi Yapılması

İhale Bedeli : 1.107862,27 TL
Yüklenici Firma : Emine Yavuz-Yavuz
Mimarlık-
Yer Teslim Tarihi : 28.09.2018
İşin süresi : 300 gün
İşin bitiş tarihi : 25.07.2019
Fiziki gerçekleşme : % 10
Mevcut Durum :Devam Ediyor.



TESİS BAKIM ONARIM HİZMETLERİ

PROJE NO	PROJENİN ADI	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	PROGRAM ÖDENEĞİ	TOPLAM HARCAMA	FİZİKİ (%)	AÇIKLAMALAR
1	Bilecik Gölpazarı Kaymakamlık Lojmanı Binası Yapım İşi	413.000		495.935	495.935	100%	Bitti.
2	Bilecik Osmaneli Kaymakamlık Lojmanı Binası Proje Yapım İşi	22.420		22.420	22.420	100%	Bitti.
3	Bilecik İl Seçim Kurulu Başkanlığı Hiz.Binası On.İşi	112.100		109.187	109.187	100%	Bitti.
4	Bilecik Çocuk Evleri Spor Salonu Onarım İşi	97.940		91.702	91.702		Devam Ediyor.
5	Yeniköy Teşhir Tanzim Merkezi (BEBKA)	82.470					Devam Ediyor.
6	Bilecik Vezirhan Belediyesi Sentetik Kap.Spor Sahası Yap.İşi	345.740		26.550	26.550		Devam Ediyor.
7	Edebalı Türbesi Asansör Yap. İşi						TOBB Tarafından İhale edilecektir.
8	Bilecik Valilik Yerleşkesi Proje çalışması						Proje Çalışmaları devam Etmektedir.
	TESİS BAKIM ONARIM TOPLAMI	1.073.670		745.794	745.794		

BİLECİK GÖLPAZARI KAYMAKAMLIK LOJMANI BİNASI YAPIM İŞİ

İhale Bedeli : 413.000,00 TL
Yüklenici Firma : Alış Mühendislik
İşe Başlama Tarihi : 01.11.2017
İşin süresi : 90 gün
İşin bitiş tarihi : 30.01.2018
Fiziki gerçekleşme : % 100
Mevcut Durum : Bitti.



Edebalı Türbesi Asansör Yapımı



Bilecik Yeniköy Yöresel Ürün Merkezi Yapımı



Ertuğrulgazi Türbesi Mescidi ve Müştemilatı Yapım İşi

Bilecik-Söğüt Mescidi



Pafta no: 1

**Konya Selçuklu
Belediyesi ve
Ertuğrulgazi
Birlik Başkanlığı
Protokolü
Gereği
Yapılacaktır.**


Ertuğrulgazi Türbesi Mescidi ve Müştemilatı Yapım İşi

Bilecik-Söğüt Mescidi



Pafta no:5

Bilecik Valilik Yerleşkesi Proje Çalışması

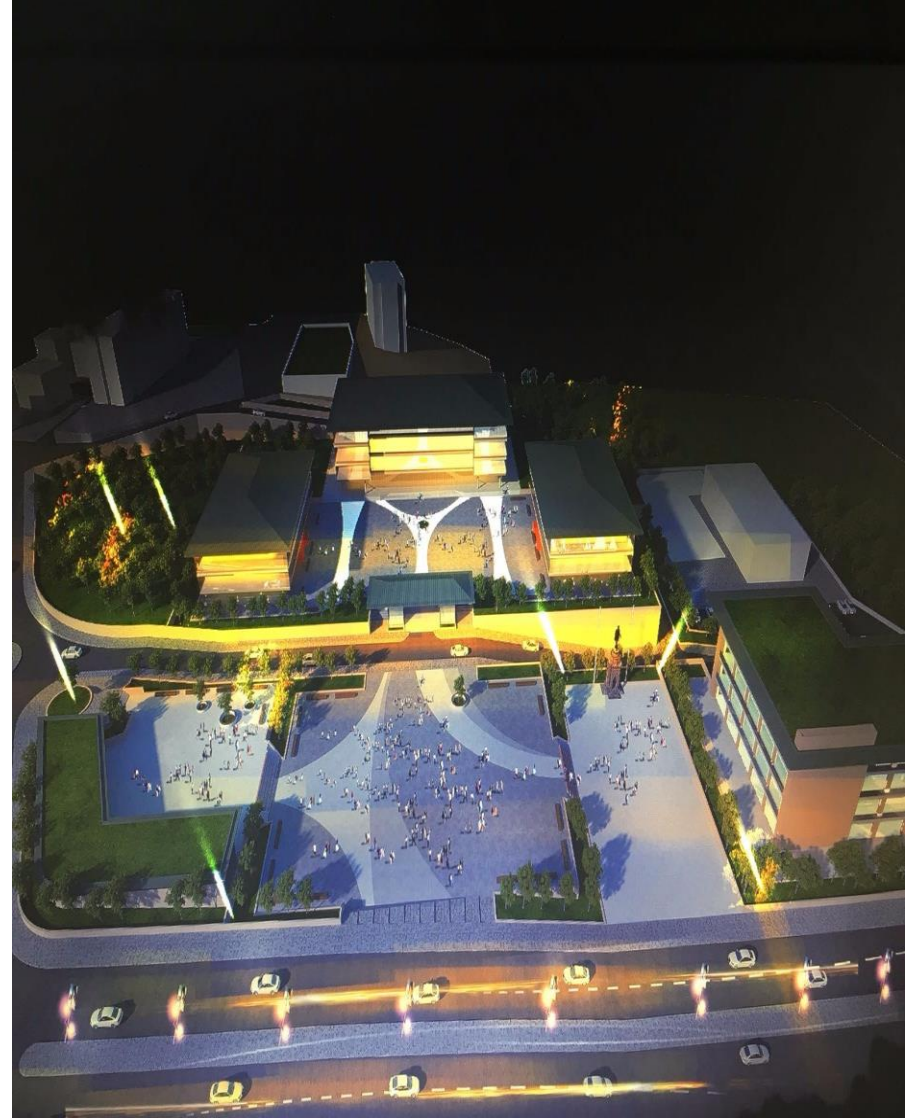



BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ

**ÇEVRE KORUMA ve
KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ**

ÇEVRE KORUMA ve KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE NO	PROJENİN ADI	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	PROGRAM ÖDENEĞİ	TOPLAM HARCAMA	Fiziki (%)	AÇIKLAMALAR
1	Çocuk Oyun Grubu	122.366	0	122.366	122.366	100%	Merkez KHGB'ye Aktarıldı. 10 Adet Köye Kuruldu.
2	Çöp Kamyonu Alımı	570.198		570.198	570.198	100%	DMO'dan 3 adet Çöp Kamyonu Alındı.
3	Osmaneli Selimiye Köyü Mesire Alanı Çevre Düzenlemesi	50.000		50.000	50.000	100%	Osmaneli KHGB'ye Aktarıldı. Bitti.
4	Çöp Konteynırı Alımı	729.801		729.801	729.801	%100	Merkez KHGB'ye Aktarıldı. 842 Adet Çöp Konteynırı Alındı.
5	Jeotermal Sahaları Çevre Düzenlemesi	50.000		50.000	0		Başlamadı.
5	ÇEVRE KORUMA ve KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAMI	1.522.365		1.522.365	1.472.365		

Çocuk Oyun Grubu Yapımları



Çöp Konteyniri Alımı



Çöp Kamyonu Alımı





BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ

**KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER
MÜDÜRLÜĞÜ**

KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE NO	PROJENİN ADI	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	PROGRAM ÖDENEĞİ	TOPLAM HARCAMA	Fiziki (%)	AÇIKLAMALAR
1	Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Yardımı	85.000	0	85.000	75.314	%100	Bitti.
2	Tanıtım, Fuar Organizasyon Prj.	50.000	0	50.000	2.409	%100	Bitti.
3	El Sanatları Geliştirme Projesi	20.000	0	20.000	10.885	%100	Bitti.
4	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	50.000	0	50.000	50.000	%100	Bitti.
5	Muhtaç Asker Ailelerine Yardım	2.000	0	2.000			Başlamadı.
5	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAMI	207.000	0	207.000	138.608		

2018 YILI
KÖYDES PROJELERİ UYGULAMALARI

(31.12.2018 Tarihi İtibariyle)

BİLECİK İLİNE YILLAR İTİBARIYLA TAHSİS EDİLEN KÖYDES ÖDENEKLERİ İCMALİ

TAHSİS EDİLEN ÖDENEK	YILLAR														TOPLAM
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
KÖY YOLLARI	508.000	11.330.750	10.625.000	2.076.976	1.333.351	1.378.338	3.232.105	2.580.000	4.056.000	2.471.631	2.444.603	2.477.747	8.567.533	8.761.959	61.843.993
İÇME SULARI	315.000	1.085.000	1.230.000	1.313.024	1.209.649	1.211.714	1.181.000	820.000	1.574.503	1.438.087	1.594.337	1.727.123		4.783.303	19.482.740
KANALİZASYON		273.250													273.250
SULAMA		701.000				1.368.674	1.405.000	100.000	26.497			145.606			3.746.777
ORTAK ALIM (Trafik Levhaları)									30.000					356.978	386.978
SAYISAL HARİTA						175.000	125.000							356.982	656.982
YÖNETİM GİDERLERİ											45.782	12.000		20.000	77.782
TOPLAM	823.000	13.390.000	11.855.000	3.390.000	2.543.000	4.133.726	5.943.105	3.500.000	5.687.000	3.909.718	4.084.722	4.362.476	8.567.533	14.279.222	86.468.502

KÖYYOLLARI UYGULAMALARI

(31.12.2018 Tarihi İtibariyle)

İLÇE ADI	2018 YILI TAHSİS EDİLEN ÖDENEK (TL)	KÖYDES ÖNCEKİ YILLAR VE BİRLİK ÖDENEKLERİ (TL)	TOPLAM ÖDENEK (TL)	HARCAMA (TL)	UYGULAMA (Km)			Biten	Devam Eden	İhale Aşamasında	TOPLAM	AÇIKLAMALAR
					BSK (Km)	BETON YOL (Km)	PARKE TAŞI (m2)					
MERKEZ	1.980.402	575.746	2.556.148	2.556.148	11,00			3			3	1.Dy.İlt.-Beyce-Cumalı-Osmaneli Hd.İlt.Grup Köyyolu Altyapı Bitti. 2.Dy.İlt.-Beyce-Cumalı-Osmaneli Hd.İlt.Grup Köyyolu BSK Bitti. 3.Gr.Ky.İlt.-İlyasça Bitti.
BOZÜYÜK	1.091.410		1.091.410	1.091.410	4,50			1			1	1.İly.İlt.-Çaydere-Kapanalan-Kuyupınar Grup Köyyolu Bitti.
GÖLPAZARI	1.200.000		1.200.000	1.200.000	3,00			1	1		2	1.Gölpazarı-Seyfiler-Köprücek Grup Köyyolu Bitti. 2.Gölpazarı-Hacıdurmuşlar-Köprücek Grup Köyyolu Dev.Ed.
İNHİSAR	676.655	518.845	1.195.500	1.195.500	20,50	3,0		3			3	1.İly.İlt.Çayköy-Akköy-Harmanköy-Gölpazarı Hd.İlt. Altyapı Bitti 2.İly.İlt.Çayköy-Akköy-Harmanköy-Gölpazarı Hd.İlt. BSK Bitti 3.Söğüt Hd.İlt.-Samrı-Söğüt Hd.İlt.Grup Köyyolu Bitti.
OSMANELİ	1.806.699		1.806.699	1.806.699	8,0			2			2	1.Osmaneli-Soğucakpınar-Gölpazarı Hd.İlt.Grup Köyyolu Bitti. 2.Gr.Ky.İlt.-Borçak Bitti.
PAZARYERİ	740.407		740.407	700.407	2,5			1		1	2	1.İly.İlt.-Karadede-Bilecik Hd.İlt.Grup Köyyolu Bitti. 2.Bulduk Köyü Köyiçi Trapez Kanal Kanalı Sanat Yapısı İh.Aş.
SÖĞÜT	1.252.401		1.252.401	1.252.401	11,0			1			1	1.Söğüt-Kızılsaray-Savcıbey-Hayriye-Bozüyük Hd.İlt. Grup Bitti.
YENİPAZAR	553.985	73.320	627.305	627.305				1			1	1.Muhtelif Köylere Parke Taşı Bitti. Aşağıboğaz, Batıbelenören, Belkese, Caferler, Danişment, Dereköy, Doğubelenören, Esenköy, Karahasanlar, Katran, Kavacık, Köşüre, Kuşça, Kükürt, Nasuhlar, Selim, Sorguncukahiler, Tohumlar, Ulucak, Yukarıboğaz, Yukarıçaylı ve Yumaklı köyleri
TOPLAM	9.301.959	1.167.911	10.469.870	10.429.870	60,5	3,0	27.305	13	1	1	15	

İÇMESULARI UYGULAMALARI (31.12.2018 Tarihi İtibariyle)

İLÇE ADI	2018 YILI TAHSİS EDİLEN ÖDENEK (TL)	KÖYDES ÖNCEKİ YILLAR VE BİRLİK ÖDENEKLERİ (TL)	TOPLAM ÖDENEK (TL)	HARCAMA (TL)	UYGULAMA DURUMU					AÇIKLAMALAR
					BİTEN	DEVAM EDEN	İHALE AŞAMASINDA	BAŞLAMAYAN	TOPLAM	
MERKEZ	656.000	188.992	844.992	835.329	4				4	1.Künçeğiz İnş+ENH Bitti. 2.Deresakarı İsale Hattı Bitti. 3.İlyasbey Dp.On.Bitti., 4.Kızıldamlar Son.İNŞ+ENH Bitti.
BOZÜYÜK	666.000	464	666.464	577.433	5				5	1.Cihangazi Depo Yapımı Bitti. 2.Muratdere Grubu İsale Hattı Yenileme Bitti., 3.Yenidodurga Depo Onarımı Bitti., 4.Düzdağ Depo Onarımı Bitti. 5.Günyarık İsale Hattı Bitti.
GÖLPAZARI	1.546.303		1.546.303	772.465	6	1		3	10	1.Sarıhacılar-Cansızlar Mah.İNŞ+ENH Bitti., 2.İncirli-Bostancılar Mahallesi İnş Bitti., 3.Üyük İnş Bitti. 4. Kümbet İnş+ENH Bitti 5.Gözaçanlar Sondaj Bitti., 6.Muhtelif Köyler Su Araştırması Bitti. (Kuşçaören, Söğütçük, Çukurören, Keskin, Akçakavak, Derecikören ve Armutçuk Köyleri) 7.Bedi İnş+ENH Devam Ed., 8.Armutçuk İsale Hattı Başlamadı. 9.Derecikören İnş.Başlamadı., 10.Gözaçanlar Sondaj Başlamadı.
İNHİSAR										
OSMANELİ	100.000	19.287	119.287	119.287	2				2	1.Kızılöz Depo Onarımı Bitti. 2.Çiftlik Depo On.Bitti.
PAZARYERİ	525.000		525.000	268.502	5				5	1.Bozcaarmut Depo Onarımı Bitti. 2.Alınca Depo On. Bitti. 3.Arapdede Dp.On.Bitti. 4.Bahçesultan Grubu Dp.On.Bitti. 5.Muh.Köyler Su Araştırması Bitti. (Arpadere ve Esemen)
SÖĞÜT	270.000		270.000	118.753	2				2	1.Çaltı Depo On.Bitti., 2.Muh.Köylere Himaye Çiti Yap.Bitti. (Zemzemiye-Yenimahalle, Oluklu, Geçitli ve Hamitabat)
YENİPAZAR	480.000		480.000	296.907	4				4	1.Caferler-Ümitler Mah, Esenköy-Tekeçiler Mah, Caferler ve Sorguncukahiler Köyü Sondaj Bitti., 2.Aşağıçaylı Depo Yapımı Bitti., 3.Muhtelif Köyler Su Araştırması Bitti. (Doğubelenören ve Kösüre Köyleri) 4.Kükürt Bitti.
TOPLAM	4.243.303	208.743	4.452.046	2.988.676	28	1		3	32	
