

T.C.
BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ
2019 YILI YATIRIMLARI



YATIRIM ve UYGULAMALAR

- 234 Proje
- 85.367.869 TL Ödenek

- 198 Proje Tamamlandı
- 66.236.654 TL Harcama

- % 85 Proje Uygulaması
- % 78 Harcama

İL ÖZEL İDARESİ YATIRIM PROJELERİ ve UYGULAMALARI

(31.12.2019 Tarihi İtibariyle)

BİRİM ADI	YILI PROGRAMI ve ÖDENEĞİ				UYGULAMA ve HARCAMA						
	TOPLAM PROJE (Ad)	ÖZEL İDARE	GENEL İDARE	TOPLAM ÖDENEK	BİTEN PROJE	DEVAM EDEN PROJE	İHALE AŞAMASINDA PROJE	BAŞLAMAYAN	TOPLAM HARCAMA	PROJE UYGULAMA ORANI (%)	HARCA MA ORANI (%)
1.YOL ve ULAŞIM HİZMETLERİ MÜD.	91	17.532.393	14.616.380	32.148.773	89	1	-	1	27.624.833	%98	%86
2.SU ve KANAL HİZMETLERİ MÜD.	62	2.876.396	2.000.000	4.876.396	54	-	-	8	2.554.151	%87	%52
3.PLAN PROJE YATIRIM ve İNŞAAT MÜD.	72	12.002.145	35.548.675	47.550.820	49	9	-	14	35.712.288	%68	%75
4.ÇEVRE KORUMA ve KONTROL MÜD.	6	500.000	61.880	561.880	3	-	-	3	307.947	%50	%55
5.KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜD.	3	230.000	0	230.000	3	-	-	-	37.435	%100	%16
İL ÖZEL İDARESİ GENEL TOPLAMI	234	33.140.934	52.226.935	85.367.869	198	10	-	26	66.236.654	%85	%78



BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ

**YOL ve ULAŞIM HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ**

YOL ve ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İÇMALI

SAYFA: 1

İŞİN ADI	PROGRAM (Proje Ad.)	UYGULAMA (Proje Ad.)	PROGRAM (Km)	UYGULAMA (Km)	Fiziki (%)	ÖZEL İDARE ÖDENEK	GENEL İDARE ÖDENEK	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA (TL)	MAD Dİ (%)	AÇIKLAMALAR
1.TESVİYE	1	1	15,0	15,0	%100						Bitti.
2.ONARIM	13	13	39,0	39,0	%100						Bitti.
3.STABİLİZE KAPLAMA	43	43	102,4	102,4	%100						Bitti.
4.BSK	13	13	61,9	61,9	%100	3.971.516	11.242.851	15.214.367	13.654.259	%90	Bitti.
5.BETON YOL	3	3	15,0	15,0	%100	1.196.707	1.900.000	3.096.707	2.261.454	%73	Bitti.
6.SATHİ KAPLAMA	4	3	8,0	7,0	%88		1.288.567	1.288.567	1.200.000	%93	
7.SANAT YAPILARI	1	1			%100	289.170		289.170	207.572	%72	Bitti.(2867 mt.)
8.TRAFİK LEVHALARI	1	1			%100	150.000	184.962	334.962	139.948	%42	Bitti. (5035 ad.)
BAKIMLAR											
9.GREYDERLİ BAKIM	1	1		863,0							Bitti.
10.ASFALT BAKIM	1	1		457,0							Bitti.

YOL ve ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İCMALI

SAYFA: 2

İŞİN ADI	PROGRAM (Proje Ad.)	UYGULAMA (Proje Ad.)	PROGRAM (Km)	UYGULAMA (Km)	Fiziki (%)	ÖZEL İDARE ÖDENEK	GENEL İDARE ÖDENEK	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA (TL)	MAD Dİ (%)	AÇIKLAMALAR
11.ASFALT YAMA (MALZEME ALIM)	1	1			%100	500.000		500.000	387.950	%78	Bitti.
12.ASFALT YAMA (HİZMET ALIM)	1	1			%100						Bitti.
13.ASFALT YOL YAPIM ve MALZEME GİDERLERİ	1	1			%100	11.345.000		11.345.000	9.763.210	%86	Bitti.
14.BOZÜYÜK HAMİDİYE KÖYYOLU MENFEZ YAPIMI	1	1			%100						Bitti.
15.YOL İŞARETLEME	1	1			%100	30.000		30.000	10.440	%35	Bitti.
16.PAZARYERİ KARADEDE KÖYYOLU KÖPRÜ YAPIMI	1	1			%100						Bitti.
17.PARKE TAŞI ALIM	4	3			%75	50.000		50.000			69,050 m2 parke taşı alımı yapıldı.
GENEL TOPLAM	91	89			%98	17.532.393	14.616.380	32.148.773	27.624.833	%86	


Merkez-Çakırpınar SS Beton Yol Çalışması



İnhisar-Samrı Klasik Beton Yol Çalışması



Sögüt Yeşilyurt-Ortaca Klasik Beton Yol Çalışması

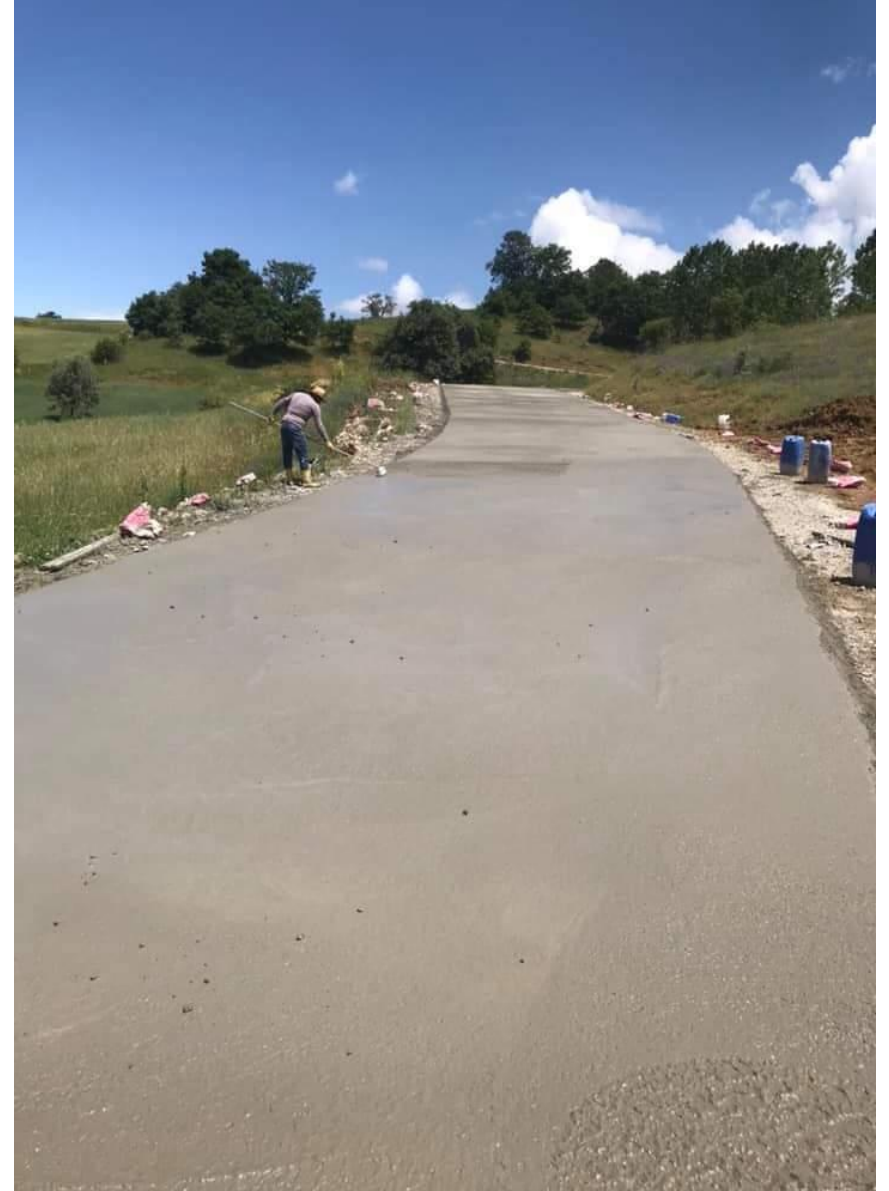

Merkez-İlyasbey-Erkoca Grup Köyyolu



Merkez-Koyunköy-Bahçecik-İnegöl Grup Köyyolu BSK Yapımı



Merkez-Kavaklı BSK Yapımı



Bozüyük Çokçapınar-Eceköy-Karaçayır Grup Köyyolu BSK Yapımı



Bozüyük Karaağaç Kandilli Grup Köyyolu BSK Yapımı



Gölpazarı-Seyfeler-Köprücek Grup Köyyolu BSK Yapımı



Gölpazarı-İly.İlt.-By.Belen-Bedi-İnhisar Grup Köyyolu



Osmaneli-Çerkeşli BSK Yapımı



Osmaneli-Medetli BSK Yapımı



Pazaryeri-Dülgerođlu-Esemen BSK Yapımı



Onarım Çalışmaları



Sanat Yapısı Çalışmaları



Trafik Levhaları Çalışmaları



Trafik Levhaları Çalışmaları





BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ

**SU ve KANAL HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ**

SU ve KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İCMALİ

İşin Adı	Program (Proje Ad.)	Uygulama (Proje Ad.)	Fiziki (%)	Program Ödeneği (TL)			Harcama (TL)			Maddi (%)
				Özel İdare	Genel İdare	TOPLAM	Özel İdare	Genel İdare	TOPLAM	
1.İÇMESUYU PROJELERİ	43	39	%91	1.335.000	2.000.000	3.335.000	97.340	1.578.200	1.675.540	%50
2.KANALİZASYON PROJELERİ	6	6	%100	300.000		300.000	137.215		137.215	%46
3.SULAMA PROJELERİ	3	2	%67	250.000		250.000	150.000		150.000	%60
4.DİĞER TARIM PROJELERİ	10	7	%70	991.396		991.396	591.396		591.396	%60
GENEL TOPLAM	62	54	%87	2.876.396	2.000.000	4.876.396	975.951	1.578.200	2.554.151	%52

İÇMESUYU PROJELERİ

İşin Adı0	PROGRAM (Proje Ad.)	UYGULAMA (Proje Ad.)	Fizi ki (%)	Program Ödeneği (TL)			HARCA MA (TL)	Maddi (%)	AÇIKLAMALAR
				Özel İdare	Genel İdare	TOPLAM ÖDENEK			
1.İÇMESUYU PROJELERİ	41	37	%90	510.000		510.000			37 adet Muhtelif köy ve ünitelerde içme suyu şebeke hattı, isale hattı, sondaj, drenaj ve depo bakım onarımları tamamlanmıştır. 4 köyde ise projeler başlamamıştır.(Gölpazarı-Derecikören, Osmaneli-Borçak, Pazaryeri-Büyükelmalı, Muhtelif Köyler içmesuyu projeleri)
2.İÇMESUYU BAKIM ONARIM	1	1	%100	800.000	2.000.000	2.800.000	1.675.540	%60	46 köyde içme suyu borusu ve malzeme verilerek devlet-vatandaş işbirliği ile pür emanet olarak tesislerin bakım onarımları tamamlandı.
3.İÇMESUYU DEPOLARI KLOR ALIMI	1	1	%100	25.000		25.000			İhtiyacı olan muhtelif köy ve ünitelere dağıtımlar tamamlandı.
GENEL TOPLAM	43	39	%91	1.335.000	2.000.000	3.335.000	1.675.540	%50	

Merkez Abadiye Depo Onarımı




Bozüyük Aksutekke Köyü İçmesuyu



Gölpazarı Muhtelif Köyler Himaye Çiti Yapımı



Osmaneli Medetli Terfi Hattı

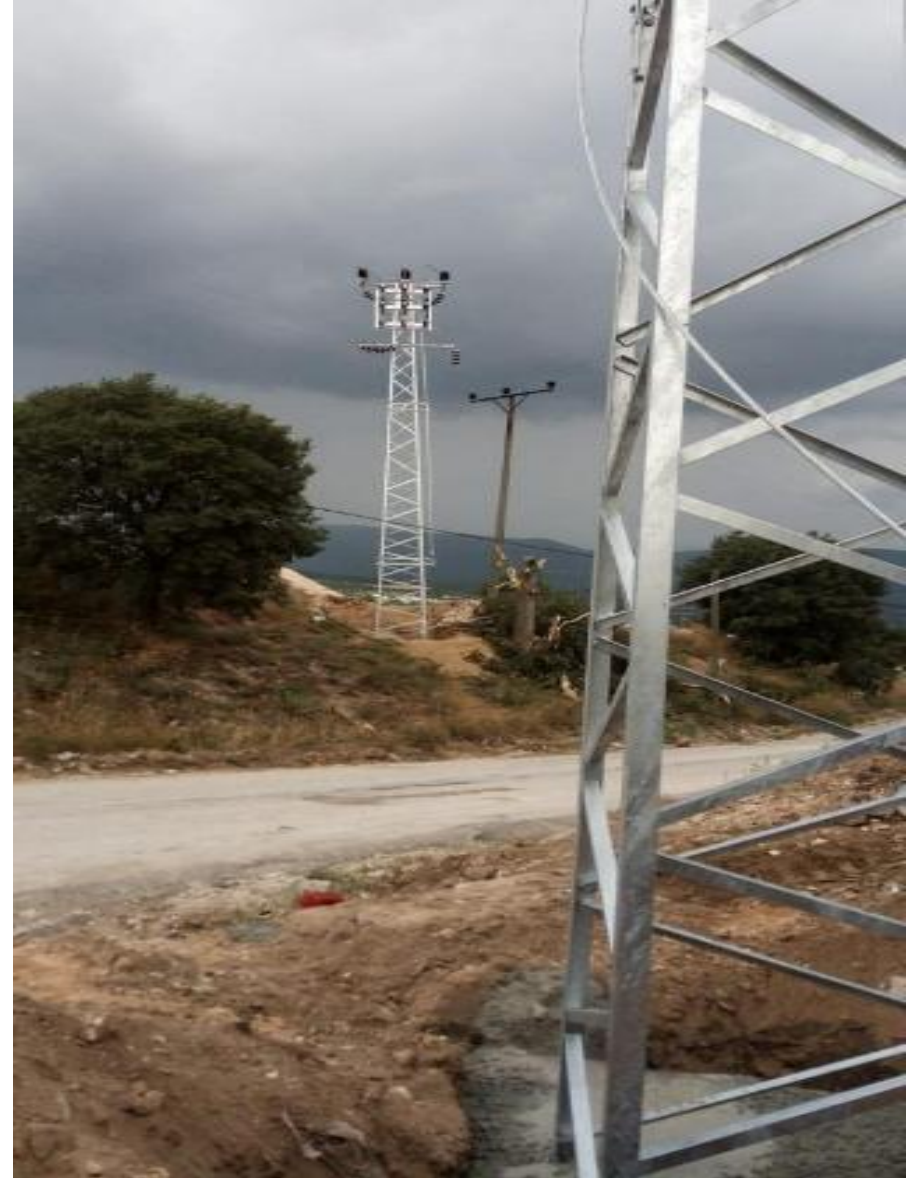

Pazaryeri Arpadere Terfi Hattı



Sögüt Zemzemiye Yenimahalle İçmesuyu



Yenipazar Esenköy Grubu



KANALİZASYON PROJELERİ

İŞİN ADI	PROGRAM (Proje Ad.)	UYGULAMA (Proje Ad.)	Fiziki (%)	PROGRAM ÖDENEĞİ (TL)			HARCAMA (TL)	MADDİ (%)	AÇIKLAMALAR
				ÖZEL İDARE	GENEL İDARE	TOPLAM			
1.KANALİZASYON YENİ İŞLER	4	4	%100						Bozüyük-Ormangözü, Gölpazarı-Büyüksürmeli-Kç.sürmeli, İnhisar-Tozman (MK), Pazaryeri-Sarnıç köylerinin kanalizasyon şebekeleri tamamlandı.
2.KANALİZASYON BAKIM ONARIM İŞLERİ	1	1	%100	200.000		200.000	137.215	%69	47 muhtelif köy ve ünitelerde korige boru ve malzeme yardımı yapılarak devlet-vatandaş işbirliği ile pür emanet olarak kanalizasyon hatlarının bakım ve onarımları tamamlandı.
3.FOSSEPTİK YAPIMI	1	1	%100	100.000		100.000			Gölpazarı-Aktaş-Beşevler Mah. Bitti.
GENEL TOPLAM	6	6	%100	300.000		300.000	137.215	%46	

Pazaryeri Sarnıç Köyü Yeni Kanalizasyon Şebekesi Yapımı



İnhisar Tozman Kanalizasyon Bakım Onarım



Merkez Aşağıköy Kanalizasyon Bakım Onarım



Yenipazar Belkese Kanalizasyon Bakım Onarım



Inhisar Harmanköy Kanalizasyon Bakım Onarım



Pazaryeri Karaköy Kanalizasyon Bakım Onarım



SULAMA PROJELERİ

İŞİN ADI	PROGRAM (Proje Ad.)	UYGULAMA (Proje Ad.)	Fiziki (%)	PROGRAM ÖDENEĞİ (TL)			HARCA MA (TL)	MADDİ (%)	AÇIKLAMALAR
				ÖZEL İDARE	GENEL İDARE	TOPLAM			
1.YERÜSTÜ SULAMA TESİSİ İNŞAATLARI	1			50.000		50.000			Söğüt-Tuzaklı Sulama Tesisi Projesinin keşifleri KHGB'ne gönderildi.
2-TARIMSAL ENH.PRJ.	1	1	%100	150.000		150.000	150.000	%100	Osmaneli-Selçik Tarımsa ENH Projesinin ödeneği KHGB'ne gönderildi.
3.SULAMA TESİSLERİ BAKIM ONARIM	1	1	%100	50.000		50.000			Muhtelif köy ve ünitelerde sulama tesislerinin bakım onarımları tamamlandı.
GENEL TOPLAM	3	2	%67	250.000		250.000	150.000	%60	

İnhisar Hisarcık Tarımsal Sulama Bakım Onarım



DİĞER TARIM PROJELERİ

İŞİN ADI	PROGRAM (Proje Ad.)	UYGULAMA (Proje Ad.)	Fiziki (%)	PROGRAM ÖDENEĞİ (TL)			HARCAMA (TL)	MADDİ (%)	AÇIKLAMALAR
				ÖZEL İDARE	GENEL İDARE	TOPLAM			
Ceviz Üretimini Yaygınlaştırma Projesi	1	1	%100	256.076		256.076	256.076	%100	TAHAGEL'E Aktarıldı.
Hayvan Sağlığı Zabıtası Payı	1	1	%100	16.220		16.220	16.220	%100	TAHAGEL'E Aktarıldı.
Tahagel Payı	1	1	%100	54.100		54.100	54.100	%100	TAHAGEL'E Aktarıldı.
Sebze Sınıflandırma ve Paketleme Tes.	1	1	%100	40.000		40.000	40.000	%100	Söğüt KHGB Gönderildi.
Çaltı Köyü Sebze Sınıflandırma ve Paketleme Tesisi	1	1	%100	125.000		125.000	125.000	%100	Söğüt KHGB Gönderildi.
Tarpak Köyü Sebze Sınıflandırma ve Paketleme Tesisi	1			275.000		275.000			Başlamadı.
Tarım Zararları ile Mücadele	1	1	%100	21.000		21.000	21.000	%100	Bitti.
Üyük Köyü Kantar Yapımı	1			75.000		75.000			Başlamadı.
Danışment Köyü Ayçiçek Eleme Tesisi	1			50.000		50.000			Başlamadı.
Fasulye Hasat ve Yolma Makinası Alımı	1	1	%100	79.000		79.000	79.000	%100	TAHAGEL'E Aktarıldı.
TOPLAM	10	7	%70	991.396		991.396	591.396	%60	

Söğüt Çaltı Sebze Sınıflandırma ve Paketleme Tesisi



Merkez Kurtköy Fasulye Hasat ve Yolma Makinası





BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ

**PLAN PROJE YATIRIM VE
İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ**

PLAN PROJE YATIRIM ve İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

İCMALİ

İşin Adı	Program (Ad.)	Uygulama (Ad.)	Fiziki (%)	Program Ödeneği (TL)			Harcama (TL)			Mad di (%)
				Özel İdare	Genel İdare	TOPLAM	Özel İdare	Genel İdare	TOPLAM	
1.EĞİTİM HİZMETLERİ	45	36	%80	11.934.600	22.811.730	34.746.330	9.088.602	16.316.862	25.405.464	%73
2.SAĞLIK HİZMETLERİ	7	4	%57		5.275.282	5.275.282		4.975.282	4.975.282	%94
3.GÜVENLİK HİZMETLERİ	6	4	%67		2.131.493	2.131.493		1.501.372	1.501.372	%70
4.TESİS BAKIM ONARIM	5	4	%80		909.731	909.731		909.731	909.731	%100
5.KÜLTÜR VE TURİZM	6	1	%17		4.420.439	4.420.439		2.920.439	2.920.439	%66
6.SOSYAL HİZMETLER	3	0	%0	67.545		67.545				
GENEL TOPLAM	72	49	%68	12.002.145	35.548.675	47.550.820	9.088.602	26.623.686	35.712.288	%75

EĞİTİM HİZMETLERİ

PROJE NO	PROJENİN ADI	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	PROGRAM ÖDENEĞİ	TOPLAM HARCAMA	Fiziki (%)	AÇIKLAMALAR
EĞİTİM HİZMETLERİ (ONARIMLAR)							
1	Bilecik Merkez Ertuğrulgazi Lisesi Bakım Onarım İşi	124.844		124.844	124.844	100%	Bitti.
2	Bilecik Pazaryeri Hilmi Duralioğlu Anadolu Lisesi Onarım İşi	56.628		56.628	56.628	100%	Bitti.
3	Bilecik Bozüyük Mustafa Şeker Anadolu Lisesi Onarım İşi	96.329		96.329	96.329	100%	Bitti.
4	Bilecik Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Onarım İşi	128.620		128.620	128.620	100%	Bitti.
5	Bilecik Osmaneli Nilüfer Hatun Mes.ve Tek. Anadolu Lis.On.İşi	155.760		155.760	154.458	100%	Bitti.
6	Bilecik Söğüt Ertuğrulgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lis.On.İşi	140.184		140.184	136.916	100%	Bitti.
7	Bilecik Yenipazar Çok Programlı Lisesi Onarım İşi	51.920		51.920	51.919	100%	Bitti.
8	Bozüyük Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu Onarım İşi	64.192		64.192	64.192	100%	Bitti.
9	Bilecik Bozüyük 100.Yıl Ortaokulu İhata Duvarı Yap.İşi.	67.302		67.302	67.302	100%	Bitti.
T O P L A M :		885.779		885.779	881.208		

EĞİTİM HİZMETLERİ

PROJE NO	PROJENİN ADI	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	PROGRAM ÖDENEĞİ	TOPLAM HARCAMA	Fiziki (%)	AÇIKLAMALAR
NAKLİ YEKÜN		885.779	-	885.779	881.208		
10	Bilecik Bozüyük Dodurga Ortaokulu Onarım İşi	48.380		48.380	48.380	100%	Bitti.
11	Bozüyük Albay İbrahim Çolak İlkokulu ve Ortaokulu On.İşi	121.588		121.588	121.588	100%	Bitti.
12	Bilecik Bozüyük Öğretmen Bekir Aral İlk ve Ort.On.İşi	86.435		86.435	86.435	100%	Bitti.
13	Bilecik Bozüyük Yavuz Sultan Selim Ortaokulu Onarım İşi	211.220		211.220	210.648	100%	Bitti.
14	Bilecik Bozüyük Metristepe İlkokulu Isıtma Tes.Yenileme İşi	80.170		80.170	80.170	100%	Bitti.
15	Bilecik Merkez Kozabirlik İlkokulu Bakım Onarım İşi	48.639		48.639	48.639	100%	Bitti.
16	Bilecik Merkez 700.Yıl İlkokulu Onarım İşi	65.932		65.932	65.932	100%	Bitti.
17	Bilecik Merkez Osmangazi Ortaokulu Onarım İşi	219.215		219.215	219.215	100%	Bitti.
18	Bilecik Söğüt Orhangazi İmam Hatip Ort.Bin.Bakım On.İşi	59.450		59.450	59.450	100%	Bitti.
T O P L A M :		1.826.808		1.826.808	1.821.665		

EĞİTİM HİZMETLERİ

PROJE NO	PROJENİN ADI	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	PROGRAM ÖDENEĞİ	TOPLAM HARCAMA	Fiziki (%)	AÇIKLAMALAR
NAKLİ YEKÜN		1.826.808	-	1.826.808	1.821.665		
19	Bilecik Gölpazarı Gazimihal İlkokulu ve Ort.Çatı On.İşi	87.792		87.792	87.792	100%	Bitti.
20	Bilecik Söğüt Yaşar Musaoğlu İlkokulu Onarım İşi	70.092		70.092	69.424	100%	Bitti.
21	Bilecik Söğüt Ayşeküflü İlkokulu Onarım İşi	38.538		38.538	38.538	100%	Bitti.
22	Bilecik Osmaneli Atatürk Ortaokulu Onarım İşi	116.808		116.808	116.808	100%	Bitti.
23	Bilecik Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi Pansiyon Binası ve İşlik Atölyesi Onarım İşi	49.410		49.410	49.410	100%	Bitti.
24	Bilecik Pazaryeri Çok Programlı Anadolu Lis.On.İşi	34.311		34.311	34.311	100%	Bitti.
25	Bilecik Refik Arslan Öztürk Fen Lis.Enerji Tas.Etkin ve Çevreye Duyarlı Eğ.Kurumları Projesi Kapsamında On.İşi	184.080		182.665	182.665	100%	Bitti.
26	Bilecik Yavuz Selim MTAL Enerji Tasarrufunda Etkin ve Çevreye Duyarlı Eğt.Kurumları Prj.Kapsamında On.İşi	39.049		39.049	39.049	100%	Bitti.
ONARIMLAR TOPLAMI :		2.446.888		2.445.473	2.439.662		

EĞİTİM HİZMETLERİ

PROJE NO	PROJENİN ADI	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	PROGRAM ÖDENEĞİ	TOPLAM HARCAMA	Fiziki (%)	AÇIKLAMALAR
EĞİTİM HİZMETLERİ (GÜÇLENDİRMELER)							
27	Merkez Osmangazi Ortaokulu Güçlendirme İşi	1.869.710	1.319.883	549.826	549.826	100%	Bitti.
28	Bilecik Söğüt Anadolu İmam Hatip Lisesi Güç. ve On.İşi	1.114.156	568.706	539.024	539.024	100%	Bitti.
GÜÇLENDİRMELER TOPLAMI :		2.983.866	1.888.589	1.088.850	1.088.850		
EĞİTİM HİZMETLERİ (YENİ YAPIMLAR)							
29	Osmaneli 100 öğrenci kapasiteli Orta Öğretim Pansiyon Binası	4.455.654	4.400.637	55.017	55.017	100%	Bitti.
30	Gölpazarı 21 derslikli İmam Hatip Lis.ve100 öğrencili pan.binası tatbikat Camii ve çevre düz.İşi	10.027.640	8.983.463	936.405	936.405	100%	Bitti.
31	Osmaneli 24 Derslik Balaban İlkokulu	5.445.700	4.739.691	706.009	0	91%	Sözleşmesi fesih edilmiş olup, ikmal ihalesi Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılmıştır.İş devam ediyor.
TOPLAM		19.928.994	18.123.791	1.697.431	991.422		

EĞİTİM HİZMETLERİ

PROJE NO	PROJENİN ADI	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	PROGRAM ÖDENEĞİ	TOPLAM HARCAMA	Fiziki (%)	AÇIKLAMALAR
NAKLİ YEKÜN		19.928.994	18.123.791	1.697.431	991.422		
32	Bozüyük 24 Derslikli Mesleki Tek.Anadolu Lisesi	6.360.200	5.054.497	267.066		79%	Sözleşmesi fesih edilmiş olup, ikmal ihalesi için Milli Eğitim Bakanlığında ihale talimatı gelmiş olup ihaleye hazırlık çalışmaları devam etmektedir.
33	Gölpazarı 20 Derslikli Şehit Kemal AY Anadolu Lis.	7.428.455	4.443.509	2.287.053	2.287.053	100%	Bitti.
34	Bilecik Bilim Sanat Merkezi Yap.İşi	6.757.707	3.162.715	2.600.355	2.600.355	100%	Bitti.
35	Merkez Ertuğrulgazi Lis.100 Öğrenci kapasiteli Pansiyon Binası yapım işi	5.426.820	1.681.854	327.138	12.861	31%	Sözleşmesi fesih edilmiş olup, ikmal ihalesi için Milli Eğitim Bakanlığında ihale talimatı gelmiş olup ihaleye hazırlık çalışmaları devam etmektedir.
36	Merkez 20 Derslikli Hayme Ana Meslek ve Tek.Lis.	8.108.960	3.007.729	5.022.972	5.022.972	100%	Bitti.
37	Söğüt Ertuğrulgazi Mesleki ve Tek.Anadolu Lisesi Spor Salonu	2.174.740	594.424	1.571.176	1.571.176	100%	Bitti.
T O P L A M :		56.185.876	36.068.519	13.773.191	12.485.839		

EĞİTİM HİZMETLERİ

PROJE NO	PROJENİN ADI	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	PROGRAM ÖDENEĞİ	TOPLAM HARCAMA	FİZİKİ (%)	AÇIKLAMALAR
NAKLİ YEKÜN		56.185.876	36.068.519	13.773.191	12.485.839		
38	Bilecik Merkez 8 Derslikli Anaokulu Yap.İşi	3.291.020	1.444.894	1.780.585	1.780.585	100%	Bitti.
39	Bozüyük 32 Derslikli Ortaokulu Yap.İşi	11.139.200	3.528.672	7.610.528	7.610.528	100%	Bitti.
40	Bilecik Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yapım.İşi	21.000.000		1.600.000	0		Milli Eğitim Bakanlığında ihale talimatı beklenmektedir.
41	Bilecik Merkez Kız İHL Spor Salonu Yapım İşi	2.400.000		223.342	0		Milli Eğitim Bakanlığında ihale talimatı beklenmektedir.
42	Pazaryeri 16 Derslikli Mesleki ve Teknik Lise Yapım İşi	8.400.000		4.163.210	0		Milli Eğitim Bakanlığında ihale talimatı beklenmektedir.
43	Bilecik Merkez 21 Derslikli Kız İHO Yapım İşi	7.200.000		2.059.151	0		Milli Eğitim Bakanlığında ihale talimatı beklenmektedir.
44	Bozüyük Yeni Mah.8 Derslikli Anaokulu Ypm İşi	3.900.000		1.000	0		Milli Eğitim Bakanlığında ihale talimatı beklenmektedir.
45	Osmaneli 8 Derslikli Anaokulu Yapım İşi	2.500.000		1.000	0		Milli Eğitim Bakanlığında ihale talimatı beklenmektedir.
YENİ YAPIMLAR TOPLAMI :		116.016.096	41.042.085	31.212.007	21.876.952		
EĞİTİM HİZMETLERİ TOPLAMI		121.446.850	42.930.674	34.746.330	25.405.464		

Bilecik Merkez Osmangazi Ortaokulu Güçlendirme ve Büyük Onarım İŖi

İhale Bedeli : 1.869.710 TL
Yüklenici Firma :Mes-Ko
İnŖ. Müh. Mim. Bilg. San. Tic. Ltde. Ŗti. -Ezgin KAYA
İhale Tarihi : 02.07.2018
İŖe BaŖlama Tarihi : 21.01.2018
İŖin süresi : 180 Gün
İŖin bitiŖ tarihi :09.05.2019
Fiziki gerçekteŖme : % 100
Mevcut Durum : Bitti.



Bilecik Söğüt İmam Hatip Lisesi Güçlendirme ve Büyük Onarım İşi

İhale Bedeli : 1.114.156.00 TL
Yüklenici Firma : Abdulsamet GÜVEN
İhale Tarihi : 19.06.2018
İşe Başlama Tarihi : 23.07.2018
İşin süresi : 180 Gün
İşin bitiş tarihi : 19.01.2018
Fiziki gerçekleşme : % 100
Mevcut Durum : Bitti.



Bilecik Osmaneli 100 öğrenci Kapasiteli Orta Öğretim Pansiyon Binası Yapım İşi

İhale Bedeli : 4.455.654,00 TL
Yüklenici Firma : Cihat AKTUNA-AKM Yapı
Dek. İnş.San. Ve Tic.Ltd.Şti. İş Ortak.
Sözleşme Tarihi : 01.05.2017
Yer Teslim Tarihi : 08.05.2017
İşin süresi : 450+59 gün
İşin bitiş tarihi : 29.09.2018
Fiziki gerçekleştirme : % 100
Mevcut Durum : Bitti.



Bilecik Gölpaazarı 21 Ders.İmam Hatip Lis. 100 Öğr.Pans.Bin., Tatbikat Camii ve Çevre Düz.İşi.

İhale Bedeli : 10.027.640,00 TL
Yüklenici Firma : Mehmet Salih
ÇELİK/Mehmet AYTAŞ İş Ortaklığı.
Sözleşme Tarihi : 20.06.2017
Yer Teslim Tarihi : 23.06.2017
İşin süresi : 700 gün
İşin bitiş tarihi : 24.05.2019
Fiziki gerçekleştirme : % 100
Mevcut Durum : Bitti.



Sögüt Ertuğrulgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu Yapım İşi

İhale Bedeli	: 2.174.740 TL
Yüklenici Firma	: Alve İnş.İnş.Malz.Gıda
San.Tic.Ltd.Şti.	
İhale Tarihi	: 26.06.2018
İşe Başlama Tarihi	: 23.07.2018
İşin süresi	: 210 Gün
İşin bitiş tarihi	: 18.02.2019
Fiziki gerçekleşme	: % 100
Mevcut Durum	: Bitti.



Bilecik Merkez 8 Derslikli Anaokulu Yapım İŖi

İhale Bedeli : 3.291.020 TL
Yüklenici Firma :Ufuk AYTAÇ/ Utay
Dek.İnŖ. Müh.San.Tic.Ltd.Ŗti. İŖ Ortaklığı
İhale Tarihi : 09.07.2018
İŖe BaŖlama Tarihi : 31.07.2018
İŖin süresi : 240 Gün
İŖin bitiŖ tarihi :28.03.2019
Fiziki gerçekteŖme : % 100
Mevcut Durum : Bitti.



Bilecik Bozüyük 32 Derslikli Ortaokulu Yapım İşi

İhale Bedeli : 11.139.200 TL
Yüklenici Firma : Korgun Yapı San.ve
Tic.Ltd.Şti.-Mehmet Kızıl İş Ortaklığı
İhale Tarihi : 23.07.2018
İşe Başlama Tarihi : 17.08.2018
İşin süresi : 360 Gün
İşin bitiş tarihi : 12.08.2019
Fiziki gerçekleştirme : % 100
Mevcut Durum : Bitti.



Merkez 20 Derslikli Hayme Ana Meslek ve Tek.Lise Yapım İŖi

İhale Bedeli : 8.108.960 TL
Yüklenici Firma :Alve İnŖ.İNŖ.Malz.Gıda
San.Tic.Ltd.Ŗti.
İhale Tarihi : 06.06.2018
İŖe BaŖlama Tarihi : 13.07.2018
İŖin süresi : 300 Gün
İŖin bitiŖ tarihi :09.05.2019
Fiziki gerçekteŖme : % 100
Mevcut Durum : Bitti.



Gölpazarı Şehit Kemal AY Anadolu Lisesi Yapım İşi

İhale Bedeli : 7.428.455,00 TL
Yüklenici Firma : MEHMET SALİH ÇELİK-
Mehmet AYTAŞ İş Ortaklığı
İhale Tarihi : 12.02.2018
İşe Başlama Tarihi : 12.03.2018
İşin süresi : 450 gün
İşin bitiş tarihi : 05.06.2019
Fiziki gerçekleştirme : % 100
Mevcut Durum : Bitti.



Bilecik Bilim Sanat Merkezi Yapım İŖi

İhale Bedeli : 6.757.707,00 TL
Yüklenici Firma : Ufuk AYKAÇ-Utay Dek.
İnŖ. Müh. San. Tic. Ltd.Ŗti. İŖ Ortaklıđı
İhale Tarihi : 27.02.2018
İŖe BaŖlama Tarihi : 30.03.2018
İŖin süresi : 400 gün
İŖin bitiŖ tarihi : 04.05.2019
Fiziki gerçekteŖme : % 100
Mevcut Durum : Bitti.



Bilecik Osmaneli 24 Derslikli Balaban İlkokulu Yapım İşi.

İhale Bedeli : 5.445.700,00 TL
Yüklenici Firma : Hazantem Tem.İnş.Gıda Otomosyon Taah.San.Tic.Ltd.Şti.
İhale Tarihi : 20.11.2017
İşe Başlama Tarihi : 18.12.2017
İşin süresi : 500 gün
İşin bitiş tarihi : 01.05.2019
Fiziki gerçekleşme : % 91
Mevcut Durum : Sözleşmesi fesih edilmiş olup, ikmal ihalesi Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılmıştır.



Bilecik Bozüyük 24 Derslikli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yapım İşi

İhale Bedeli : 6.360.200,00 TL
Yüklenici Firma : Hazantem Tem. İnş. Gıda
Otomosyon Taah. San. Tic. Ltd. Şti.
İhale Tarihi : 20.11.2017
İşe Başlama Tarihi : 18.12.2017
İşin süresi : 550 gün
İşin bitiş tarihi : 20.06.2019

Fiziki gerçekleştirme : % 79

Mevcut Durum : Sözleşmesi fesih edilmiş olup,
ikmal ihalesi için Milli Eğitim Bakanlığında ihale talimatı
gelmiş olup ihaleye hazırlık çalışmaları devam etmektedir.



Bilecik Merkez Ertuğrul Gazi Lisesi 100 Öğrenci Kapasiteli Pansiyon Binası Yapım İşi

İhale Bedeli : 5.426.820 TL
Yüklenici Firma : Mevlut Ali KONYA
İhale Tarihi : 21.05.2018
İşe Başlama Tarihi : 18.06.2018
İşin süresi : 360 Gün
İşin bitiş tarihi : 12.06.2019
Fiziki gerçekleşme : % 31
Mevcut Durum : Sözleşmesi fesih edilmiş olup, ikmal ihalesi için Milli Eğitim Bakanlığında ihale talimatı gelmiş olup ihaleye hazırlık çalışmaları devam etmektedir.



SAĞLIK HİZMETLERİ

PROJE NO	PROJENİN ADI	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	PROGRAM ÖDENEĞİ	TOPLAM HARCAMA	Fiziki (%)	AÇIKLAMALAR
1	BOZÜYÜK 5-6 Hek.ASM+TSM+112 ASHİ Bina Yapım işi	2.781.260	1.100.386	14.518	14.518	40%	Sözleşme Fesih Edildi. İkmal İhalesi Yapıldı. İş devam ediyor.
2	Osmaneli 5-6 Hek.ASM+TSM+112 ASHİ Bina Yapım işi	3.363.000	1.141.447	2.176.951	2.176.951	100%	Bitti.
3	Yenipazar Entegre Has. Ek Bina işi	1.780.000	325.747	1.451.765	1.451.765	100%	Bitti.
4	Bilecik Merkez Hürriyet Mah.4-5 Hekimli ASM Merkezi Yapım işi	1.223.660		1.215.228	1.215.228	100%	Bitti.
5	Bozüyük Palyotif TRSM+Diş Protez Merk.Yapımı	116.820		116.820	116.820	100%	Projesi Bitti.
6	BOZÜYÜK 5-6 Hek.ASM+TSM+112 ASHİ Bina Yapım işi	1					Sağlık Bakanlığınca yürütülecektir
7	Merkez 2 Hek.ASM+TSM Bina yap.İşi	300.000		300.000			Proje Yeri Değerlendirilmektedir.
SAĞLIK HİZMETLERİ TOPLAMI		9.564.741	2.567.580	5.275.282	4.975.282		

Bilecik Hürriyet Mahallesi 4-5 Hekimli ASM Merkezi Yapım İşi

İhale Bedeli	: 1.223.660,00 TL
Yüklenici Firma	:MEHMET ZEKİ ADIYAMAN
İhale Tarihi	: 14.11.2018
İşe Başlama Tarihi	: 07.12.2018
İşin süresi	: 180 GÜN
İşin bitiş tarihi	: 05.06.2018
Fiziki gerçekleştirme	: % 100
Mevcut Durum	: Bitti.



Osmaneli 5-6 Hekimli ASM+TSM+112 AŞİ Bina Yapım İşi

İhale Bedeli : 3.363.000.00TL
Yüklenici Firma :Muhammet KOCAMAN-
Özay Mad.Müh.İnş.San.Tic. Ltd. Şti.
İhale Tarihi : 17.08.2018
İşe Başlama Tarihi : 18.09.2018
İşin süresi : 270 Gün
İşin bitiş tarihi :15.06.2019
Fiziki gerçekleşme : % 100
Mevcut Durum : Bitti.



Yenipazar İlçe Devlet Hastanesi Ek Bina Yapım İşi

İhale Bedeli : 1.780.000.00TL
Yüklenici Firma : Hanet İnş.San.ve
Tic.Ltd.Şti./ Tekin Tanış İnş.Taah.Temz.Hizm.İş
Ortaklığı
İhale Tarihi : 06.05.2018
İşe Başlama Tarihi : 31.07.2018
İşin süresi : 270 Gün
İşin bitiş tarihi : 27.04.2018
Fiziki gerçekleşme : % 100
Mevcut Durum : Bitti.



Bozüyük 5-6 Hekimlik ASM+TSM+112 ASHİ Bina Yapım işi

İhale Bedeli : 2.781.260.00TL
Yüklenici Firma : Mehmet TANYELİ
İnş.Pet.Ür.Mob.Day.Tük.Mal.San.ve Tic.Ltd.Şti
İhale Tarihi : 12.06.2018
İşe Başlama Tarihi : 06.07.2018
İşin süresi : 270 Gün
İşin bitiş tarihi : 02.04.2019
Fiziki gerçekleşme : % 40
Mevcut Durum : Yapım işinin ilk sözleşmesi
fesih edilmiştir. İkmal İhalesi yapıldı. İş devam
ediyor.



GÜVENLİK HİZMETLERİ

PROJE NO	PROJENİN ADI	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	PROGRAM ÖDENEĞİ	TOPLAM HARCAMA	Fiziki (%)	AÇIKLAMALAR
1	Bilecik Gölpazarı İlçe Emniyet Amirliği Loj.Doğalgaz Dön.İşi	125.552	87.627	0	0	100%	Bitti.
2	Bozüyük Bölge trafik Den.İst.Hiz.Binası Yapım İşi	1.791.240		1.791.240	1.167.605	70%	Devam ediyor.
3	Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü D Blok Loj.On.İşi	203.500		203.196	203.196	100%	Bitti.
4	Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Kapalı Atış Poligonu Onarım İşi	66.500		66.493	66.169	100%	Bitti.
5	Bilecik Merkez Trafik Tescil Bina Önü Otopark Yapımı	70.600		70.564	64.402	100%	Bitti.
6	Bilecik Söğüt Jan.Ulaş. Eğt. Tab. Kom. Defansif Sürüş Eğt.Parkuru Pro.Hiz.Alım İşi	578.200		0	0		İhalesi yapıldı. Sözleşmesi yapıldı. Yer teslimi sürecinde .
GÜVENLİK HİZMETLERİ TOPLAMI		2.835.592	87.627	2.131.493	1.501.372		

Bilecik Bozüyük Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliđi Hizmet Binası Yapım İŖi

İhale Bedeli : 1.791.240.00 TL
Yüklenici Firma : CAKS MİM. MÜH. İNŞ. TAAH. A.Ş
İŖe BaŖlama Tarihi : 18.06.2019
İŖin süresi : 300 Gün
İŖin bitiŖ tarihi : 13.04.2020
Fiziki gerçekteŖme : % 70
Mevcut Durum : Devam Ediyor.



Bilecik Trafik Tescil Binası Önü Otopark Yapım İŖi



KÜLTÜR TURİZM HİZMETLERİ

PROJE NO	PROJENİN ADI	PROJE TUTAR	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	PROGRAM ÖDENEĞİ	TOPLAM HARCAMA	FİZİKİ (%)	AÇIKLAMALAR
1	Hükümet Konağı Restorasyon Yapım işi	5.403.951	3.449.988	1.954.053	1.954.053	85%	Tasfiye Edildi.
2	Malhatun İlkokulu Eski Taş Mektep Bin.Restorasyon Yap.İşi	1.307.277	355.675	466.219	466.219	80%	Tasfiye Edildi.
3	Pazaryeri Halk Kütüphanesi Güç.ve Onarım İşi	713.310		475.167	475.167	95%	Devam Ediyor. Geçici Kabul Aşamasında.
4	Bilecik Müzesi Onarımı,Teşhir Tanzimi ve Çevre Düzenlemesi	900.000		900.000			Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yaklaşık maliyetin hazırlanması bekleniyor.
5	Söğüt Müzesi Onarımı,Teşhir Tanzimi ve Çevre Düzenlemesi	600.000		600.000			Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yaklaşık maliyetin hazırlanması bekleniyor.
6	Gölpazarı Aktaş Köyü Camii Röleve Projesi Hazırlama İşi	25.000		25.000	25.000	100%	Projesi Bitti.
KÜLTÜR ve TURİZM TOPLAMI		9.545.587	3.805.663	4.420.439	2.920.439		

Hükümet Konağı Restorasyon Yapım İşi

İhale Bedeli : 5.403.951,00 TL
Yüklenici Firma : Yavuz Mimarlık-
Sözleşme Tarihi : 07.03.2017
Yer Teslim Tarihi : 13.03.2017
İşin süresi : 600 gün
İşin bitiş tarihi : 28.01.2019
Fiziki gerçekleşme : % 85
Mevcut Durum : Tasfiye Edildi.



Malhatun İlkokulu Eski Taş Mektep Binası Restorasyon İşi Yapılması

İhale Bedeli : 1.307.277,00 TL
Yüklenici Firma : Emine Yavuz-Yavuz
Mimarlık-
Yer Teslim Tarihi : 28.09.2018
İşin süresi : 300 gün
İşin bitiş tarihi : 25.07.2019
Fiziki gerçekleşme : % 80
Mevcut Durum : Tasfiye Edildi.



Pazaryeri İlçe Halk Kütüphanesi Güçlendirme ve Onarım İşi

İhale Bedeli : 745.544,00 TL

Fiziki gerçekleşme : % 95

Mevcut Durum : Devam Ediyor.

Geçici Kabul Aşamasında.



TESİS BAKIM ONARIM HİZMETLERİ

PROJE NO	PROJENİN ADI	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	PROGRAM ÖDENEĞİ	TOPLAM HARCAMA	FİZİKİ (%)	AÇIKLAMALAR
1	Bilecik Çocuk Evleri Spor Salonu Onarım İşi	97.940	91.702	6.238	6.238	100%	Bitti.
2	Yeniköy Teşhir Tanzim Merkezi (BEBKA)	584.303		584.303	584.303	100%	Bitti.
3	Bilecik Vezirhan Belediyesi Sentetik Kap.Spor Sahası Yap.İşi	345.740	26.550	319.190	319.190	100%	Bitti.
4	Bilecik Valilik Yerleşkesi Proje çalışması	1				100%	Proje Çalışmaları tamamlandı.
5	Edebalı Türbesi Asansör Yap. İşi	1					İhalesi yapıldı.Komisyon Kararı TOBB Tarafından Onaylandı. Sözleşme sürecinde.
TESİS BAKIM ONARIM TOPLAMI		1.027.985	118.252	909.731	909.731		

Bilecik Yeniköy Yöresel Ürün Merkezi Yapımı (BEBKA)

İhale Bedeli : 584.303,00 TL
Yüklenici Firma : EZGİN KAYA
İşe Başlama Tarihi : 16.11.2018
İşin süresi : 30 gün
İşin bitiş tarihi : 16.12.2018
Fiziki gerçekleştirme : % 100
Mevcut Durum : Bitti.



Bilecik Vezirhan Belediyesi Sentetik Kapalı Halı Saha Yapımı

İhale Bedeli : 345.740,00 TL
Yüklenici Firma : SERÇİM SPORT TEKSTİL
İNŞ. SANÇ VE TİC.LTD.ŞTİ.
Yer Teslim Tarihi : 02.11.2018
İşin süresi : 60 gün
İşin bitiş tarihi : 01.01.2019
Fiziki gerçekleşme : % 100
Mevcut Durum :Bitti.




Edebali Türbesi Asansör Yapımı

İhalesi yapıldı.Komisyon kararı TOBB tarafından onaylandı.Sözleşme sürecinde



Bilecik Valilik Yerleşkesi Proje Çalışması

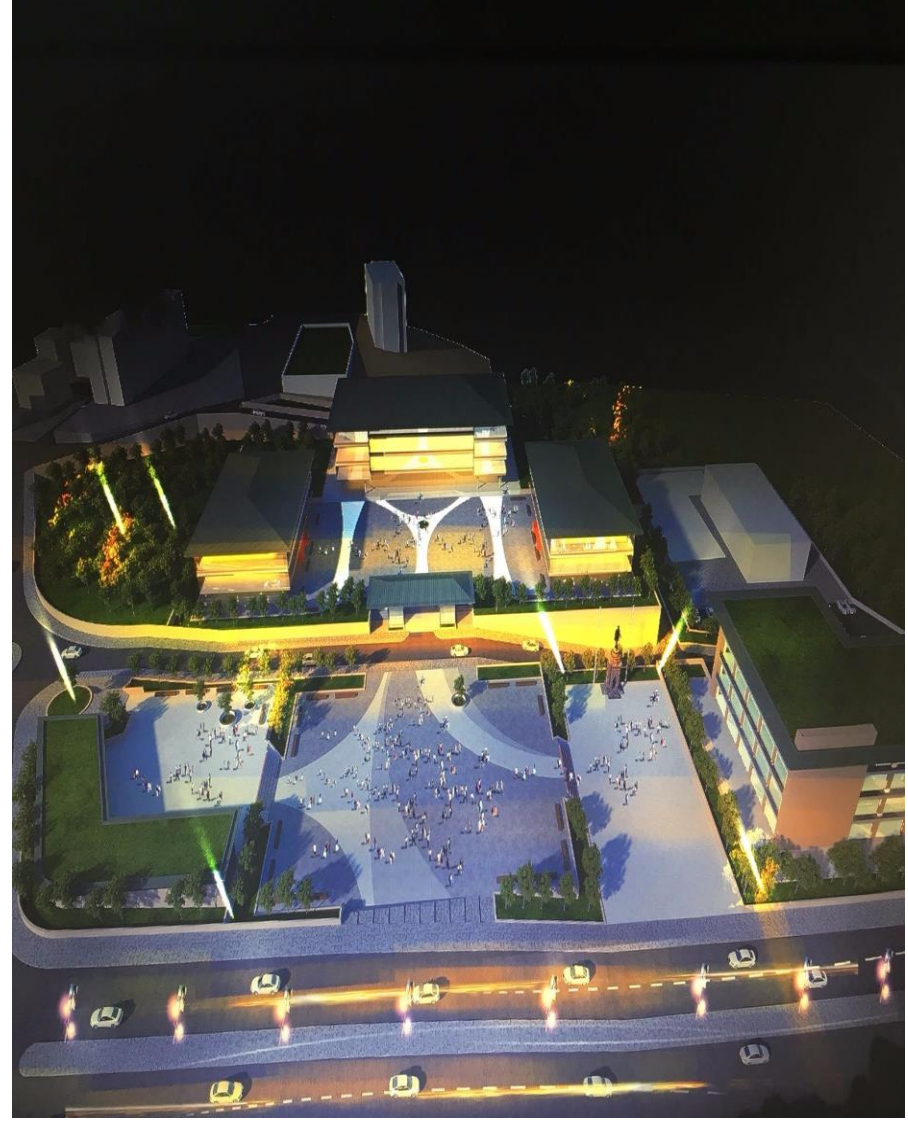

SÖĞÜT ERTUĞRULGAZİ CAMİİ ve KUR-AN KURSU PROJESİ



SÖĞÜT ERTUĞRULGAZİ CAMİİ ve KUR-AN KURSU PROJESİ



MERKEZ İLÇE KÜPLÜ KÖYÜ SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA PROJESİ



SOSYAL HİZMETLER

PROJE NO	PROJENİN ADI	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	PROGRAM ÖDENEĞİ	TOPLAM HARCAMA	Fiziki (%)	AÇIKLAMALAR
1	Semt Sahaları Bakım ve Onarımı	50.000		47.545			Ödenek yetersiz.
2	Karaköy Köyü Futbol Sahası Yapım İşi	10.000		10.000			Ödenek yetersiz.
3	Geçitli Köyü Futbol Sahası Yapım İşi	10.000		10.000			Ödenek yetersiz.
SOSYAL HİZMETLER TOPLAMI		70.000		67.545			



BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ

**ÇEVRE KORUMA ve
KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ**

ÇEVRE KORUMA ve KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE NO	PROJENİN ADI	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	PROGRAM ÖDENEĞİ	TOPLAM HARCAMA	FİZİKİ (%)	AÇIKLAMALAR
1	Çocuk Oyun Grubu	100.000		100.000	0		Başlamadı.
2	Temizlik Hizmetleri Alımı	180.000		176.907	98.000	%100	144 Ad. Çöp Konteynırı Alındı.
3	Sahipsiz Sokak Hayvanlarının Kısırlaştırılması	90.000		86.880	86.854	%100	Bitti.
4	Parkların Bakım Onarımı	25.000		25.000			Başlamadı.
5	Çaltı Jeotermal Çevre Düzenlemesi	50.000		50.000			Başlamadı.
6	Bilecik Belediyeler Birliği Payı	125.000		123.093	123.093	%100	Belediyeler Birliğine Aktarıldı.
6	ÇEVRE KORUMA ve KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAMI	570.000		561.880	307.947		



BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ

**KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER
MÜDÜRLÜĞÜ**

KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE NO	PROJENİN ADI	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	PROGRAM ÖDENEĞİ	TOPLAM HARCAMA	Fiziki (%)	AÇIKLAMALAR
1	Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Yardımı	150.000	0	150.000	6.672	%100	Bitti.
2	Tanıtım, Fuar Organizasyon Prj.	35.000	0	35.000	3.263	%100	Bitti.
3	Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım	45.000	0	45.000	27.500	%100	Bitti.
3	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAMI	230.000	0	230.000	37.435		

2019 YILI
KÖYDES PROJELERİ UYGULAMALARI

(31.12.2019 Tarihi İtibariyle)

BİLECİK İLİNE YILLAR İTİBARIYLA TAHSİS EDİLEN KÖYDES ÖDENEKLERİ İCMALİ

TAHSİS EDİLEN ÖDENEK	YILLAR															TOPLAM
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
KÖY YOLLARI	508.000	11.330.750	10.625.000	2.076.976	1.333.351	1.378.338	3.280.111	2.580.000	4.056.000	2.471.631	2.444.603	2.477.747	8.567.533	9.301.959	10.577.465	73.009.464
İÇME SULARI	315.000	1.085.000	1.230.000	1.313.024	1.209.649	1.211.714	1.263.430	820.000	1.574.503	1.438.087	1.594.337	1.727.123		4.243.303	2.242.908	21.268.078
KANALİZASYON		273.250				0										273.250
SULAMA		701.000				1.368.674	1.274.564	100.000	26.497			145.606				3.616.341
ORTAK ALIM (Trafik Levhaları)									30.000					356.978	142.478	529.456
ORTAK ALIM (ARAÇ KİRALAMA)															284.957	284.957
SAYISAL HARİTA						175.000	125.000							356.982	1.000.000	1.656.982
YÖNETİM GİDERLERİ											45.782	12.000		20.000		77.782
TOPLAM	823.000	13.390.000	11.855.000	3.390.000	2.543.000	4.133.726	5.943.105	3.500.000	5.687.000	3.909.718	4.084.722	4.362.476	8.567.533	14.279.222	14.247.808	100.716.310

KÖYYOLLARI UYGULAMALARI

(31.12.2019 Tarihi İtibariyle)

İLÇE ADI	2019 YILI TAHSİS EDİLEN ÖDENEK (TL)	KÖYDES ÖNCEKİ YILLAR VE BİRLİK ÖDENEKLERİ (TL)	TOPLAM ÖDENEK (TL)	HARCAMA (TL)	UYGULAMA (Km)			Biten	Devam Eden	Başlamayan	TOPLAM	AÇIKLAMALAR
					BSK (Km)	BETON YOL (Km)	PARKE TAŞI (m2)					
MERKEZ	1.937.497		1.937.497	1.937.497	5,0			1			1	1.İlyasbey-Erkoca Grup Köyyolu bitti.
BOZÜYÜK	1.660.882	88.567	1.749.449	1.660.882	4,0			1	1		2	1.İly.İlt.Karaağaç-Gr.Ky.İlt bitti. 2.Bozalan devam ediyor.
GÖLPAZARI	2.355.248		2.355.248	2.355.226	9,5		33,050	4			4	1.İly.İlt.-By.Belen-Bedi-İnhisar Hd.İlt.bitti. 2.Hacıdurmuşlar-Köprücek bitti. 3.Muhtelif Köyler Parke Taşı (24 Köy) bitti.4. 3.Muhtelif Köyler Parke Taşı (14 köy) bitti.
İNİSAR	639.685		639.685	639.685		2,0		1			1	1.Söğüt Hd.İlt.-Samrı-Söğüt Hd.İlt.bitti
OSMANELİ	1.681.972		1.681.972	1.681.972	5,0			1			1	1.Gr.Ky.İlt.Medetli-Gölpazarı Hd.İlt.bitti.
PAZARYERİ	743.000	40.000	783.400	783.262			36.000	2			2	1.Muhtelif Köyler Parke Taşı (20 Köy) bitti. 2.Bulduk Köyü Köyiçi Trapez Kanal Kanalı Sanat Yapısı bitti.
SÖĞÜT	1.438.781		1.438.781	1.438.781		5,0		1			1	1.İly.İlt.-Yeşilyurt-Ortaca-İnhisar Hd.İlt bitti.
YENİPAZAR	120.000	54.000	174.000	0						1	1	1.İly.İlt.Tohumlar-Belenören-Doğubelenören-Selim-Ulucak-Gölpazarı Hd.İlt. Başlamadı.
TOPLAM	10.577.465	182.567	10.760.032	10.497.305	23,5	7,0	69.050	11	1	1	13	

İÇMESULARI UYGULAMALARI

(31.12.2019 Tarihi İtibariyle)

İLÇE ADI	2019 YILI TAHSİS EDİLEN ÖDENEK (TL)	KÖYDES ÖNCEKİ YILLAR VE BİRLİK ÖDENEKLERİ (TL)	TOPLAM ÖDENEK (TL)	HARCAMA (TL)	UYGULAMA DURUMU				AÇIKLAMALAR
					BİTEN	DEVAM EDEN	BAŞLAMAYAN	TOPLAM	
MERKEZ	573.000		573.000	572.993	11	-	-	11	1.Yeniköy, 2.Cumalı, 3.Abadiye, 4-Kınık, 5-Necmiye, 6-Gülümbe,7-Selöz,8-Kepirler, 9-İlyasça, 10-Muh.Ky.Yangın vanası, 11-Muh.Ky.seviye kont.cih.alımı işleri bitti.
BOZÜYÜK	0		0		-	-	-	-	
GÖLPAZARI	240.212	701.000	941.212	471.766	5	-	1	6	1. Bedi bitti, 2.Gökçeözü bitti. 3.Armutçuk bitti, 4.Muhtelif Köyler Himaye Çiti bitti, 5.Gözaçanlar bitti, 6.Derecikören başlamadı.
İNİSAR	0		0		-	-	-	-	
OSMANELİ	120.000		120.000	110.952	2	-	1	3	1.Borçak bitti, 2.Sarıyazı bitti. 3-Borçak yeni sondaj başlamadı.
PAZARYERİ	452.553	67.246	519.749	389.749	1	-	1	2	1.Arpadere bitti, 2-Büyükelmalı başlamadı.
SÖĞÜT	0	260.742	260.742	260.742	1	-	-	1	1.Zemzemiye-Yenimahalle bitti.
YENİPAZAR	857.193	1.013.064	1.870.257	1.839.151	2	-	-	2	1.Kösüre bitti, 2.Esenköy Grubu (Esenköy-Esenköy-Tekeçiler Mah, Caferler, Caferler-Ümitler Mah) bitti.
TOPLAM	2.242.908	2.042.052	4.284.960	3.645.353	22	-	3	25	
