

**T.C.  
BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ  
2020 YILI YATIRIMLARI**



## YATIRIM ve UYGULAMALAR

- 216 Proje
- 71.702.402 TL Ödenek

- 183 Proje Tamamlandı
- 49.049.391 TL Harcama

- % 85 Proje Uygulaması
- % 68 Harcama

# İL ÖZEL İDARESİ YATIRIM PROJELERİ ve UYGULAMALARI

## (31.12.2020 Tarihi İtibariyle)

BİRİM ADI	YILI PROGRAMI ve ÖDENEĞİ				UYGULAMA ve HARCAMA						
	TOPLAM PROJE (Ad)	ÖZEL İDARE	GENEL İDARE	TOPLAM ÖDENEK	BİTEN PROJE	DEVAM EDEN PROJE	İHALE AŞAMASINDA PROJE	BAŞLAMAYAN	TOPLAM HARCAMA	PROJE UYGULAMA ORANI (%)	HARCA MA ORANI (%)
1.YOL ve ULAŞIM HİZMETLERİ MÜD.	102	11.021.790	9.724.001	20.745.791	101	1	-	-	18.811.442	%99	%91
2.SU ve KANAL HİZMETLERİ MÜD.	43	2.284.523	421.800	2.706.323	35	1	2	5	1.252.796	%81	%46
3.PLAN PROJE YATIRIM ve İNŞAAT MÜD.	63	13.391.471	31.826.211	45.217.682	43	9	-	11	28.238.900	%68	%62
4.ÇEVRE KORUMA ve KONTROL MÜD.	5	2.788.632	73.775	2.862.407	3	-	-	2	682.429	%60	%24
5.KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜD.	3	170.199	0	170.199	1	-	-	2	63.824	%33	%37
<b>İL ÖZEL İDARESİ GENEL TOPLAMI</b>	<b>216</b>	<b>29.656.615</b>	<b>42.045.787</b>	<b>71.702.402</b>	<b>183</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>49.049.391</b>	<b>%85</b>	<b>%68</b>



**BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ**

**YOL ve ULAŞIM HİZMETLERİ  
MÜDÜRLÜĞÜ**

# YOL ve ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İCMALI

SAYFA: 1

İŞİN ADI	PROGRAM (Proje Ad.)	UYGULAMA (Proje Ad.)	PROGRAM (Km)	UYGULAMA (Km)	FİZİKİ (%)	ÖZEL İDARE ÖDENEK	GENEL İDARE ÖDENEK	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA (TL)	MAD Dİ (%)	AÇIKLAMALAR
1.TESVİYE	1	1	15	15	%100						Bitti.
2.ONARIM	12	12	38,3	38,3	%100						Bitti.
3.STABİLİZE KAPLAMA	52	52	204	204	%100						Bitti.
4.BSK	4	4	14,2	14,2	%100	1.500.000	3.356.819	4.856.819	3.356.819	%69	Bitti.
5.SATHİ KAPLAMA	18	17	48,8	45,8	%94	-	4.386.234	4.386.234	4.386.234	%100	Pazaryeri-Burçalık Dev.Ed.
6.II.KAT ASFALT	5	5	35,5	35,5	%100	-	1.527.388	1.527.388	1.527.388	%100	Bitti.
7.SANAT YAPILARI	1	1			%100	145.000	-	145.000	110.267	%76	Bitti. (2440,5 Mt. Büz konuldu.)
8.TRAFİK LEVHALARI	1	1			%100	150.000	142.478	292.478	0	-	Bitti. (1341 Adet konuldu)
9.YOL İŞARETLEME	1	1			%100	30.000	-	30.000	0	-	Bitti.

# YOL ve ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İCMALİ

SAYFA: 2

İŞİN ADI	PROGRAM (Proje Ad.)	UYGULAMA (Proje Ad.)	PROGRAM (Km)	UYGULAMA (Km)	Fiziki (%)	ÖZEL İDARE ÖDENEK	GENEL İDARE ÖDENEK	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA (TL)	MAD Dİ (%)	AÇIKLAMALAR
<b>10.BAKIM PROGRAMLARI</b>											
ASFALT YAMA (MALZEME ALIMI)	1	1			%100	100.000	-	100.000	100.000	%100	Bitti.
ASFALT YOL YAPIM ve MALZEME GİDERLERİ	1	1			%100	9.096.790	-	9.096.790	9.031.479	%99	Bitti.
Atık Doğal Taşların Konkorsör Yardımıyla Kırılarak Yol Yap. Mal.Yap.	1	1			%100	-	46.020	46.020	46.020	%100	Bitti.
GREYDERLİ BAKIM	1	1		2251,3 Km							Bitti.
ASFALT BAKIM	1	1		700 Km							Biti.
<b>11.MENFEZ YAPIMI</b>	1	1			%100		65.062	65.062	65.062	%100	Bitti.(KÖYDES) Pazaryeri Sarıdayı
<b>12.PARKE TAŞI ALIMI (MERKEZ KHGB)</b>	1	1			%100		200.000	200.000	188.173	%94	Bitti. (6.329 m2 parke taşı, 750 adet bordür, 1005 ton taş tozu)
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>102</b>	<b>101</b>			<b>%99</b>	<b>11.021.790</b>	<b>9.724.001</b>	<b>20.745.791</b>	<b>18.811.442</b>	<b>%91</b>	

## Merkez-Kızıldamlar BSK Yapımı Bitti.



# Bozüyük Çokçapınar-Eceköy-Karaçayır BSK Yapımı Bitti.





# Sögüt Küre Köyüolu BSK Yapımı Bitti.



# Bozüyük-TCK\_Poyra-Oluklu Sathi Kaplama Bitti.



# Bozüyük Bozalan Sathi Kaplama Bitti.



# İnhisar Tarpak – (Behçetiye) Sathi Kaplama Bitti.



# Pazaryeri Arapdede Sathi Kaplama Bitti.



# Söğüt Ortaca – Yeşilyurt – Rızapaşa Sathi Kaplama Bitti.



## Yenipazar Selim – Katran Sathi Kaplama Bitti.



## Bozüyük Ormangözü – Erikli II.Kat Asfalt Kaplama Bitti.





# Stabilize Çalışmaları



# Onarım Çalışmaları



# Sanat Yapısı Çalışmaları



# Trafik Levhaları Çalışmaları





**BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ**

**SU ve KANAL HİZMETLERİ  
MÜDÜRLÜĞÜ**

# SU ve KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

## İCMALİ

İşin Adı	Program (Proje Ad.)	Uygulama (Proje Ad.)	Fiziki (%)	Program Ödeneği (TL)			Harcama (TL)			Maddi (%)
				Özel İdare	Genel İdare	TOPLAM	Özel İdare	Genel İdare	TOPLAM	
<b>1.İÇMESUYU PROJELERİ</b>	31	28	<b>%90</b>	1.372.560	421.800	<b>1.794.360</b>	807.883	35.419	<b>843.302</b>	<b>%47</b>
<b>2.KANALİZASYON PROJELERİ</b>	3	1	<b>%33</b>	370.000	-	<b>370.000</b>	127.531	-	<b>127.531</b>	<b>%34</b>
<b>3.SULAMA PROJELERİ</b>	3	2	<b>%67</b>	195.000	-	<b>195.000</b>	120.000	-	<b>120.000</b>	<b>%62</b>
<b>4.DİĞER TARIM PROJELERİ</b>	6	4	<b>%67</b>	346.963	-	<b>346.963</b>	161.963	-	<b>161.963</b>	<b>%47</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>43</b>	<b>35</b>	<b>%81</b>	<b>2.284.523</b>	<b>421.800</b>	<b>2.706.323</b>	<b>1.217.377</b>	<b>35.419</b>	<b>1.252.796</b>	<b>%46</b>

# İÇMESUYU PROJELERİ

İşin Adı0	PROGRAM (Proje Ad.)	UYGULAMA (Proje Ad.)	Fizi ki (%)	Program Ödeneği (TL)			HARCA MA (TL)	Madd i (%)	AÇIKLAMALAR
				Özel İdare	Genel İdare	TOPLAM ÖDENEK			
<b>1.İÇMESUYU PROJELERİ</b>	29	26	%90	0	0	0	0	-	26 adet proje tamamlanmıştır. 1 proje devam etmekte, 2 proje ihale aşamasındadır.
<b>2.İÇMESUYU BAKIM ONARIM</b>	1	1	%100	1.372.560	421.800	1.794.360	843.302	%47	44 köy 6 bağlısında içme suyu borusu ve malzeme verilerek devlet-vatandaş işbirliği ile pür emanet olarak tesislerin bakım onarımları tamamlanmıştır.
<b>3.İÇMESUYU DEPOLARI KLOR ALIMI</b>	1	1	%100	0	0	0	0	-	İhtiyacı olan muhtelif köy ve ünitelere dağıtımlar tamamlanmıştır.
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>31</b>	<b>28</b>	<b>%90</b>	<b>1.372.560</b>	<b>421.800</b>	<b>1.794.360</b>	<b>843.302</b>	<b>%47</b>	

## Merkez Kınık İçmesuyu Depo Onarımı



## Bozüyük Erikli İçmesuyu isale Hattı





# Bozüyük Muratdere Grubu İçmesuyu



# Gölpazarı Gözaçanlar – Karaahmetler Grubu İçmesuyu Projesi



## Gölpazarı Arıcaklar Nitrat Arıtma Tesisi



# Pazaryeri Fıranlar İçmesuyuYeni GÖmme Depo İnşaatı



## İnhisar Samrı İçmesuyu İsale Hattı




## Yenipazar Sorguncukahiler Terfili İsale Hattı Yapımı



# KANALİZASYON PROJELERİ

İŞİN ADI	PROGRAM (Proje Ad.)	UYGULAMA (Proje Ad.)	FİZİKİ (%)	PROGRAM ÖDENEĞİ (TL)			HARCAMA (TL)	MADDİ (%)	AÇIKLAMALAR
				ÖZEL İDARE	GENEL İDARE	TOPLAM			
<b>1.KANALİZASYON BAKIM ONARIM İŞLERİ</b>	1	1	<b>%100</b>	150.000	0	<b>150.000</b>	<b>127.531</b>	<b>%85</b>	45 muhtelif köy ve ünitelerde korige boru ve malzeme yardımı yapılarak devlet-vatandaş işbirliği ile pür emanet olarak kanalizasyon hatlarının bakım ve onarımları tamamlanmıştır.
<b>2.FOSSEPTİK YAPIMI</b>	1	-	-	200.000	0	<b>200.000</b>	0	-	Başlamadı.
<b>3. DOĞAL ARITMA</b>	1	-	-	20.000	0	<b>20.000</b>	0	-	Ödenek yetersiz.
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>%33</b>	<b>370.000</b>	<b>0</b>	<b>370.000</b>	<b>127.531</b>	<b>%34</b>	

# Muhtelif Köy ve Ünitelerde Kanalizasyon Bakım Onarım

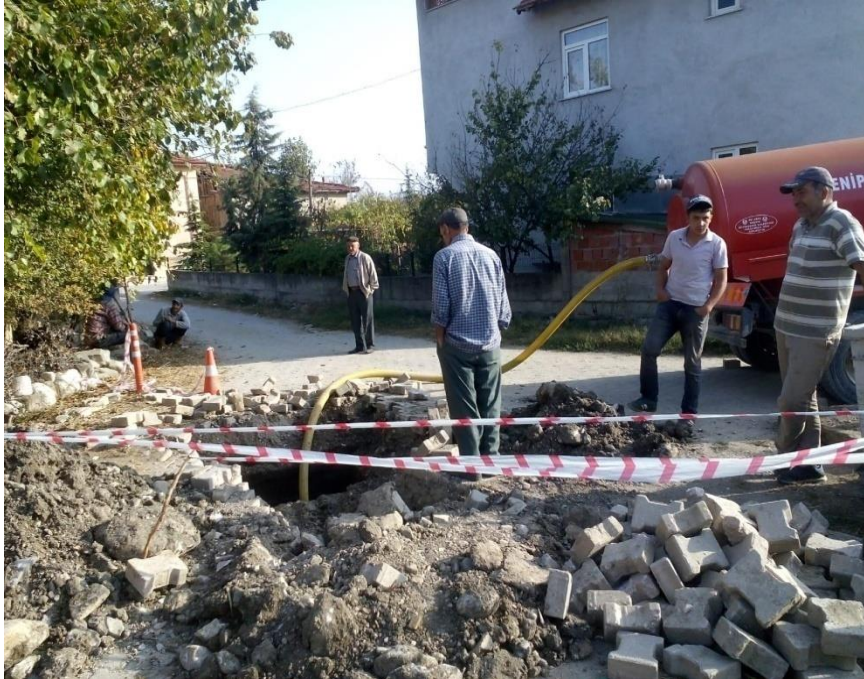

# Muhtelif Köy ve Ünitelerde Kanalizasyon Bakım Onarım



# SULAMA PROJELERİ

İŞİN ADI	PROGRAM (Proje Ad.)	UYGULAMA (Proje Ad.)	Fiziki (%)	PROGRAM ÖDENEĞİ (TL)			HARCA MA (TL)	MADDİ (%)	AÇIKLAMALAR
				ÖZEL İDARE	GENEL İDARE	TOPLAM			
<b>1.YERÜSTÜ SULAMA TESİSİ İNŞAATLARI</b>	1	-	-	50.000	0	50.000	0	-	Söğüt-Tuzaklı Sul.Tes.(keşifleri gönderildi.)
<b>2-TARIMSAL ENH.PRJ.</b>	1	1	%100	120.000	0	120.000	120.000	%100	Osmaneli-Akçapınar Tarımsal ENH Projesi ödeneği KHGB'ye aktarıldı. İş Bitti
<b>3.SULAMA TES. BAKIM ONARIM</b>	1	1	%100	25.000	0	25.000	0	-	Muhtelif köy ve ünitelerde sulama tesislerinin bakım onarımları tamamlanmıştır.
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>%67</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>195.000</b>	<b>120.000</b>	<b>%62</b>	



# DİĞER TARIM PROJELERİ

İŞİN ADI	PROGRAM (Proje Ad.)	UYGULAMA (Proje Ad.)	Fiziki (%)	PROGRAM ÖDENEĞİ (TL)			HARCAMA (TL)	MADDİ (%)	AÇIKLAMALAR
				ÖZEL İDARE	GENEL İDARE	TOPLAM			
1.Meyveciliği Geliştirme Projesi	1	-	-	155.000	0	155.000	0		Başlamadı.
2.Hayvan Sağlığı Zabitası Payı	1	1	%100	15.453	0	15.453	15.453	%100	Sahipsiz Sokak Hayvanları için mama alındı.
3.Tahagel Payı	1	1	%100	51.510	0	51.510	51.510	%100	TAHAGEL'e Aktarıldı.
4.Osmaneli Gübre Dağıtım Makinası Alımı	1	1	%100	45.000	0	45.000	45.000	%100	Bitti.
5.Tarım Zararları ile Mücadele	1	-	-	30.000	0	30.000	0	-	Başlamadı.
6.Danışмент Köyü Ayçiçek Eleme Tesisi Sundurma Yapımı	1	1	%100	50.000	0	50.000	50.000	%100	Yenipazar KHGB'ye Aktarıldı. İş Bitti.
<b>TOPLAM</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>%67</b>	<b>346.963</b>	<b>0</b>	<b>346.963</b>	<b>161.963</b>	<b>%47</b>	



**BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ**

**PLAN PROJE YATIRIM VE  
İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ**

# PLAN PROJE YATIRIM ve İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

## İCMALİ

İşin Adı	Program (Ad.)	Uygulama (Ad.)	Fiziki (%)	Program Ödeneği (TL)			Harcama (TL)			Mad di (%)
				Özel İdare	Genel İdare	TOPLAM	Özel İdare	Genel İdare	TOPLAM	
1.EĞİTİM HİZMETLERİ	41	29	%71	13.291.471	23.608.994	36.900.465	11.400.031	10.664.905	22.064.936	%60
2.SAĞLIK HİZMETLERİ	3	1	%33	0	2.116.920	2.116.920		2.116.920	2.116.920	%100
3.GÜVENLİK HİZMETLERİ	10	9	%90	0	2.116.071	2.116.071		2.116.071	2.116.071	%100
4.TESİS BAKIM ONARIM	1	1	%100	0	1.384.140	1.384.140		1.384.140	1.384.140	%100
5.KÜLTÜR VE TURİZM	6	2	%33	100.000	1.962.772	2.062.772		462.772	462.772	%22
6.SOSYAL HİZMETLER	2	1	%50		637.314	637.314		94.061	94.061	%15
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>63</b>	<b>43</b>	<b>%68</b>	<b>13.391.471</b>	<b>31.826.211</b>	<b>45.217.682</b>	<b>11.400.031</b>	<b>16.838.869</b>	<b>28.238.900</b>	<b>%62</b>

# EĞİTİM HİZMETLERİ

PROJE NO	PROJENİN ADI	Program (Ad)	Uygulama (Ad)	PROJE TUTARI	PROGRAM ÖDENEĞİ	TOPLAM HARCAMA	Fiziki (%)	AÇIKLAMALAR
<b>EĞİTİM HİZMETLERİ</b>								
1-13	İlk ve Ortaöğretim On.İşleri	13	13	884.205	873.653	873.653	%100	13 proje tamamlandı.
<b>ONARIM TOPLAMI</b>		<b>13</b>	<b>13</b>	<b>884.205</b>	<b>873.653</b>	<b>873.653</b>		
<b>GÜÇLENDİRME İŞLERİ</b>								
14-25	Güçlendirme Projeleri	12	12	1.100.114	1.100.114	10.100.114	%100	12 proje tamamlandı.
26	Merkez Atatürk İlkokulu Güçlendirme ve Onarım İşi	1	-	2.760.020	2.760.020	1.326.315	%85	Devam Ediyor.
27	Merkez Kozabirlik İlkokulu Güçlendirme ve Onarım İşi	1	-	1.249.620	1.249.620	888.208	%97	Devam Ediyor.
28	Bilecik Öğretmenevi Güçlendirme ve Onarım İşi	1	-	2.251.921	2.251.921	865.455	%40	Devam Ediyor.
29	Bilecik Vezirhan İlkokulu Güçlendirme ve Onarım İşi	1	-	2.542.900	2.542.900	588.158	%30	Devam Ediyor.
30	Söğüt Ertuğrulgazi İlkokulu Güçlendirme ve On.İşi	1	-	2.660.900	2.660.900	841.688	%35	Devam Ediyor.
<b>GÜÇLENDİRME TOPLAMI</b>		<b>17</b>	<b>12</b>	<b>12.565.475</b>	<b>12.565.475</b>	<b>5.609.938</b>		

# EĞİTİM HİZMETLERİ

PROJE NO	PROJENİN ADI	Program (Ad)	Uygulama (Ad)	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	PROGRAM ÖDENEĞİ	TOPLAM HARCAMA	Fiziki (%)	AÇIKLAMALAR
<b>YENİ YAPIMLAR</b>									
31	Gölpazarı 20 Derslikli Şehit Kemal AY Anadolu Lis.	1	1	7.428.455	<b>4.443.509</b>	2.650.102	2.650.102	100%	Bitti.
32	Bilecik Bilim Sanat Merkezi Yap.İşi	1	1	6.690.600	<b>3.162.715</b>	3.504.979	3.504.979	100%	Bitti.
	Osmaneli 24 Derslik Balaban İlkokulu			5.233.300	<b>4.739.691</b>	0	0		Sözleşme fesih edilmiştir.
33	Osmaneli 24 Derslik Balaban İlkokulu İkmal Yapım İşi	1	1	1.510.400		1.510.400	1.510.400	100%	Bitti.
	Bozüyük 24 Derslikli Mesleki Tek.Anadolu Lisesi			6.360.200	<b>5.054.497</b>	0	0		Sözleşme fesih edilmiştir.
34	Bozüyük 24 Derslikli Mes.Tek. Anadolu Lisesi İkmal Yap.İşi	1	1	2.496.791		2.496.791	2.496.791	100%	Bitti.
	Merkez Ertuğrulgazı Lis.100 Öğrenci kapasiteli Pansiyon Binası Yapım İşi			5.426.820	<b>1.694.715</b>	0	0		Sözleşme fesh edilmiştir.
35	Merkez Ertuğrulgazı Lis.100 Öğrenci kapasiteli Pansiyon Binası İkmal Yapım İşi	1	-	6.187.920		5.419.073	5.419.073	99%	Geçici Kabul Aşamasında
	<b>TOPLAMI</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>41.334.486</b>	<b>19.095.127</b>	<b>15.581.345</b>	<b>15.581.345</b>		

# EĞİTİM HİZMETLERİ

PROJE NO	PROJENİN ADI	Program (Ad)	Uygulama (Ad)	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	PROGRAM ÖDENEĞİ	TOPLAM HARCAMA	Fiziki (%)	AÇIKLAMALAR
	<b>NAKLİ YEKÜN</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>41.334.486</b>	<b>19.095.127</b>	<b>15.581.345</b>	<b>15.581.345</b>		
36	Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yapım.İşi	1	-	21.000.000		1.600.000			M.E.Bakanlığından ihale talimatı beklenmektedir.
37	Bilecik Merkez Kız İHL Kapalı Spor Salonu Yapım İşi	1	-	2.400.000		223.342			M.E.Bakanlığından ihale talimatı beklenmektedir.
38	Pazaryeri 16 Derslikli Mesleki ve Teknik Lise Yap.İşi	1	-	8.400.000		4.163.210			M.E.Bakanlığından ihale talimatı beklenmektedir.
39	Bilecik Merkez 21 Derslikli Kız İ.H. Ortaokulu Yapım İşi	1	-	7.200.000		1.891.440			M.E.Bakanlığından ihale talimatı beklenmektedir.
40	Bozüyük Yeni Mah.8 Derslikli Anaokulu Ypm İşi	1	-	3.900.000		1.000			M.E.Bakanlığından ihale talimatı beklenmektedir.
41	Osmaneli 8 Derslikli Camicedit Mah. Anaokulu Yap.İşi	1	-	2.500.000		1.000			M.E.Bakanlığından ihale talimatı beklenmektedir.
	<b>YENİ YAPIMLAR TOPLAMI</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>86.734.486</b>	<b>19.095.127</b>	<b>23.461.337</b>	<b>15.581.345</b>		
	<b>EĞİTİM HİZMETLERİ TOPLAMI</b>	<b>41</b>	<b>29</b>	<b>100.184.166</b>	<b>19.095.127</b>	<b>36.900.465</b>	<b>22.064.936</b>		

# Gölpazarı 20 Derslikli Şehit Kemal AY Anadolu Lisesi Yapım İşi

İhale Bedeli : 7.428.455,00 TL  
Yüklenici Firma : MEHMET SALİH ÇELİK-  
Mehmet AYTAŞ İş Ortaklığı  
İhale Tarihi : 12.02.2018  
İşe Başlama Tarihi : 12.03.2018  
İşin süresi : 450 gün  
**Fiziki gerçekleşme : % 100**  
**Mevcut Durum : Bitti.**



# Bilecik Bilim Sanat Merkezi Yapım İŖi

İhale Bedeli : 6.690.600,00 TL  
Yüklenici Firma : Ufuk AYKAÇ-Utay Dek.  
İnŖ. Müh. San. Tic. Ltd.Ŗti. İŖ Ortaklıđı  
İhale Tarihi : 27.02.2018  
İŖe BaŖlama Tarihi : 30.03.2018  
İŖin süresi : 400 gün  
**Fiziki gerçekteŖme : % 100**  
**Mevcut Durum : Bitti.**





# Bilecik Osmaniye 24 Derslikli Balaban İlkokulu İkmal Yapım İşi

İhale Bedeli : 1.510.400,00 TL

**Fiziki gerçekteşme : % 100**

Mevcut Durum : Sözleşmesi fesih edilmiş olup, ikmal ihalesi Köylere Hizmet Götürme Birliđi tarafından yapıldı iş bitti.



# Bozüyük 24 Derslikli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İkmal Yapım İşi

İhale Bedeli : 2.496.791,00 TL  
Yüklenici Firma : Fahri BOY  
İhale Tarihi : 09.03.2020  
İşe Başlama Tarihi : 27.03.2020  
İşin süresi : 120 GÜN  
İşin bitiş tarihi : 29.07.2020  
**Fiziki gerçekleştirme : % 100**  
**Mevcut Durum : Sözleşmesi fesih edilmiş olup, ikmal ihalesi yapıldı, iş bitti.**



# Bilecik Merkez Ertuğrul Gazi Lisesi 100 Öğrenci Kapasiteli Pansiyon Binası İkmal Yapım İşi

İhale Bedeli : 6.187.920,00 TL

Yüklenici Firma : Wox Yapı Aş.

İhale Tarihi : 28.04.2020

İşe Başlama Tarihi : 22.05.2020

İşin süresi : 300 GÜN

İşin bitiş tarihi : 22.03.2021

**Fiziki gerçekleşme : % 99**

**Mevcut Durum : Sözleşmesi fesih edilmiş olup, ikmal ihalesi yapıldı, iş devam etmekte olup Geçici Kabul Aşamasındadır.**



## Bilecik Merkez Atatürk İlkokulu Güçlendirme (Devam Eiyor %85)



## Bilecik Merkez Kozabirlik İlkokulu Güçlendirme (Devam Ediyor %97)



## Bilecik Vezirhan İlkokulu Güçlendirme (Devam Ediyor. %30)



## Bilecik Söğüt Ertuğrulgazi İlkokulu Güçlendirme (Devam Ediyor %35)



# SAĞLIK HİZMETLERİ

PROJE NO	PROJENİN ADI	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	PROGRAM ÖDENEĞİ	TOPLAM HARCAMA	Fiziki (%)	AÇIKLAMALAR
	BOZÜYÜK 5-6 Hekimli ASM+TSM+112 ASHİ Bina Yapım işi	2.781.260	1.114.904	0	0		Sözleşme Fesih Edildi.
1	BOZÜYÜK 5-6 Hek.ASM+TSM+112 ASHİ Bina Yapım işi	2.116.920		2.116.920	2.116.920	100%	Bitti.
2	BOZÜYÜK 4-5 Hek.ASM+112 ASHİ Bina Yapım işi (İstasyon Mevki)	1					Arsa işlemleri devam etmektedir.
3	Merkez 2 Hek.ASM+112 ASHİ Bina yap.ışi	1					Arsa işlemleri devam etmektedir.
	<b>SAĞLIK HİZMETLERİ TOPLAMI</b>	<b>4.898.182</b>	<b>1.114.904</b>	<b>2.116.920</b>	<b>2.116.920</b>	<b>%33</b>	

# Bozüyük 5-6 Hekimlik ASM+TSM+112 AŞİ Bina İkmal Yapım İşi

İhale Bedeli : 2.116.920.00 TL  
Yüklenici Firma : On-Taş İnş ve Yapı  
Malz.San.Tic.Şti.  
İhale Tarihi : 04.12.2019  
İşe Başlama Tarihi : 09.01.2020  
İşin süresi : 240 GÜN  
İşin bitiş tarihi : 04.09.2020  
**Fiziki gerçekleşme : % 100**  
Mevcut Durum : Yapım işinin ilk sözleşmesi fesih edilmiştir. İkmal İhalesi yapılmış olup iş bitti.



# GÜVENLİK HİZMETLERİ

PROJE NO8	PROJENİN ADI	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	PROGRAM ÖDENEĞİ	TOPLAM HARCAMA	Fiziki (%)	AÇIKLAMALAR
1	Bozüyük Bölge trafik Den.İst.Hiz.Binası Yapım İşi	1.964.416	1.167.605	796.811	796.811	100%	Bitti.
2	Bilecik Söğüt Jan.Ulaş. Eğt. Tab. Kom. Güvenli Sürüş Eğt.Alanı Pro.Yak.Mal.Hiz.Alım İşi	578.200		578.200	578.200	100%	Bitti.
3	Bilecik Merkez F ve G Blok Polis Lojmanları Kazan Yenileme İşi	15.930		15.930	15.930	100%	Bitti.
4	Bilecik 2. Jandarma Eğt. Tug. Kom. Hiz. Bin. Tuvalet ve Bulaşıkxhane Onarım İşi.	24.190		24.190	24.190	100%	Bitti.
5	Bilecik 2. Jandarma Eğt. Tug. Kom. 1-2-3 Tab. Kom. Bulaşıkxhaneleri On.İşi.	33.453		33.453	33.453	100%	Bitti.
6	Bilecik Jand.1.Eğt.Tab.Kom. Hiz.Bin.Su Deposu Hidrafor ve Elektrik Hat.Yapım İşi	113.280		113.280	113.280	100%	Bitti.
7	Bilecik 2. Jand. Eğt.Tug. Kom. Loj. Daire kapılarının Değişimi İşi	86.258		86.258	86.258	100%	Bitti.
8	Bilecik 2. Jand. Eğt.Tug. Kom. Kışla Mutfağında Bulunan Soğuk Hava Dep. Onr. Ve Yenilenmesi	352.313		348.182	348.182	100%	Bitti.
9	Bilecik 2. Jan.Eğt.Tug.Kom. 1 ve 2. Tab.Koğ.Böl.Onr.İşi	119.767		119.767	119.767	%100	Bitti.
10	Bilecik 2. Jan.Eğt.Tug.Kom. 3. Tab.Hiz.Bin.Onr. İşi	475.245		0	0	%10	Devam Ediyor.
<b>GÜVENLİK HİZMETLERİ TOPLAMI</b>		<b>3.763.052</b>	<b>1.167.605</b>	<b>2.116.071</b>	<b>2.116.071</b>		



# Bilecik Bozüyük Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği Hizmet Binası Yapım İşi

İhale Bedeli : 1.964.416.00 TL  
Yüklenici Firma : CAKS MİM. MÜH. İNŞ.  
TAAH. A.Ş  
İşe Başlama Tarihi : 18.06.2019  
İşin süresi : 300 Gün  
İşin bitiş tarihi : 13.04.2020  
**Fiziki gerçekleşme : % 100**  
**Mevcut Durum : Bitti.**



# KÜLTÜR TURİZM HİZMETLERİ

PROJE NO	PROJENİN ADI	PROJE TUTAR	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	PROGRAM ÖDENEĞİ	TOPLAM HARCAMA	FİZİKİ (%)	AÇIKLAMALAR
	Hükümet Konağı Restorasyon Yap.İşi	5.403.951	5.403.948	0	0		Tasfiye Edildi.
1	Hükümet Konağı Restorasyon İkmal Yapım İşi	3.180.000		0	0	%20	Devam Ediyor.
	Malhatun İlkokulu Eski Taş Mektep Bin.Restorasyon Yap.İşi	1.307.277	1.224.595	0	0		Tasfiye Edildi.
2	Bilecik Eski Malhatun İlkokulu Çevre Düzenlemesi Yapım İşi	200.010		200.010	200.010	100%	Bitti.
3	Pazaryeri Halk Kütüphanesi Güç.ve Onarım İşi	737.930	475.167	262.762	262.762	100%	Bitti.
4	Bilecik Müzesi Onarımı,Teşhir Tanzimi ve Çevre Düzenlemesi	900.000		900.000			Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yaklaşık maliyetin hazırlanması bekleniyor.
5	Söğüt Müzesi Onarımı,Teşhir Tanzimi ve Çevre Düzenlemesi	600.000		600.000			
6	Sokak Sağlıklaştırma Projesi	100.000		100.000			Talep Halinde Değerlendirilecek.
	<b>KÜLTÜR ve TURİZM TOPLAMI</b>	<b>12.429.168</b>	<b>7.103.710</b>	<b>2.062.772</b>	<b>462.772</b>	<b>%33</b>	

# Hükümet Konağı Restorasyon Yapım İşi

**Mevcut Durum** : Tasfiye Edildi.  
İkmal ihalesi KHGB. Tarafından  
Yapılmış olup iş devam etmektedir.

**Fiziki gerçekleştirme** : % 20

**Mevcut Durum** : Devam Ediyor.



# Malhatun İlkokulu Eski Taş Mektep Binası Restorasyon İşi Yapılması

İhale Bedeli : 200.010,00 TL  
Yüklenici Firma : Bimaş Mer.San.Tic.Aş  
İhale Tarihi : 12.03.2020  
İşe Başlama Tarihi : 23.03.2020  
İşin Süresi : 75 GÜN  
İşin bitiş tarihi : 08.06.2020  
**Fiziki gerçekleşme : % 100**  
**Mevcut Durum : Tasfiye Edildi.İkmal**  
**İhalesi yapıldı, İş Bitti.**



# Pazaryeri İlçe Halk Kütüphanesi Güçlendirme ve Onarım İşi

İhale Bedeli : 737.930,00 TL

Fiziki gerçekleşme : % 100

Mevcut Durum : İş Bitti.



# TESİS BAKIM ONARIM HİZMETLERİ

PROJE NO	PROJENİN ADI	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	PROGRAM ÖDENEĞİ	TOPLAM HARCAMA	Fiziki (%)	AÇIKLAMALAR
1	Edebalı Türbesi Asansör Yap.İşi	1.384.140	0	1.384.140	1.384.140	100%	Bitti.(TOBB)
<b>TESİS BAKIM ONARIM TOPLAMI</b>		<b>1.384.140</b>	<b>0</b>	<b>1.384.140</b>	<b>1.384.140</b>		

## SOSYAL HİZMETLER

PROJE NO	PROJENİN ADI	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	PROGRAM ÖDENEĞİ	TOPLAM HARCAMA	Fiziki (%)	AÇIKLAMALAR
1	Bilecik Huzurevi Rehabilitasyon Merkezi Onarım İşi	564.154		564.154	20.901	%15	Devam Ediyor.
2	Bilecik Merkez Sevgi Evleri Onarım İşi	73.160		73.160	73.160	100%	Bitti.
<b>SOSYAL HİZMETLER TOPLAMI</b>		<b>637.314</b>		<b>637.314</b>	<b>94.061</b>	<b>%50</b>	

# Edebalı Türbesi Asansör Yapımı Bitti. (TOBB)





**BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ**

**ÇEVRE KORUMA ve  
KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ**



# ÇEVRE KORUMA ve KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE NO	PROJENİN ADI	Özel İdare	Genel İdare	TOPLAM ÖDENEK	TOPLAM HARCAMA	Fiziki (%)	AÇIKLAMALAR
1	Çocuk Oyun Grubu Yapımı	75.000	0	<b>75.000</b>	75.000	<b>%100</b>	4 Köy (Merkez-Yeniköy, Osmaneli-Oğulpaşa, Söğüt-Çaltı, Hamitabat)
2	Temizlik Hizmetleri Alımı	2.500.000		<b>2.500.000</b>	514.876	%100	Bitti.
3	Çaltı Jeotermal Çevre Düzenlemesi	50.000		<b>50.000</b>			Başlamadı.
4	Sahipsiz Sokak Hayvanlarının Kısırlaştırılması	19.338	73.775	<b>93.113</b>	92.553	<b>%100</b>	Bitti.
5	Bilecik Belediyeler Birliği Payı	144.294		<b>144.294</b>			Başlamadı.
	<b>ÇEVRE KORUMA ve KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAMI</b>	<b>2.788.632</b>	<b>73.775</b>	<b>2.862.407</b>	<b>682.429</b>	<b>%60</b>	



**BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ**

**KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER  
MÜDÜRLÜĞÜ**

# KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE NO	PROJENİN ADI	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	PROGRAM ÖDENEĞİ	TOPLAM HARCAMA	Fiziki (%)	AÇIKLAMALAR
1	Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Yardımı	150.000		149.999	63.824	%100	Bitti.
2	El Sanatları Geliştirme Prj.	15.000		15.000	0	-	Başlamadı.
3	Muhtaç Asker Ailelerine Yardım	5.200		5.200	0	-	Başlamadı.
<b>3</b>	<b>KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAMI</b>	<b>170.200</b>		<b>170.199</b>	<b>63.824</b>	<b>%33</b>	

**2020 YILI**  
**KÖYDES PROJELERİ UYGULAMALARI**

**( 31.12.2020 Tarihi İtibariyle )**

# BİLECİK İLİNE YILLAR İTİBARIYLA TAHSİS EDİLEN KÖYDES ÖDENEKLERİ İCMALİ

TAHSİS EDİLEN ÖDENEK	YILLAR																TOPLAM
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
KÖY YOLLARI	508.000	11.330.750	10.625.000	2.076.976	1.333.351	1.378.338	3.280.111	2.580.000	4.056.000	2.471.631	2.444.603	2.477.747	8.567.533	9.301.959	10.577.465	9.201.829	82.211.293
İÇME SULARI	315.000	1.085.000	1.230.000	1.313.024	1.209.649	1.211.714	1.263.430	820.000	1.574.503	1.438.087	1.594.337	1.727.123		4.243.303	2.242.908	4.618.544	25.886.622
KANALİZASYON		273.250				0											273.250
SULAMA		701.000				1.368.674	1.274.564	100.000	26.497			145.606					3.616.341
ORTAK ALIM (Trafik Levhaları)									30.000					356.978	142.478	142.478	671.934
ORTAK ALIM (ARAÇ KİRALAMA)															284.957	284.957	569.914
SAYISAL HARİTA						175.000	125.000							356.982	1.000.000		1.656.982
YÖNETİM GİDERLERİ											45.782	12.000		20.000			77.782
<b>TOPLAM</b>	<b>823.000</b>	<b>13.390.000</b>	<b>11.855.000</b>	<b>3.390.000</b>	<b>2.543.000</b>	<b>4.133.726</b>	<b>5.943.105</b>	<b>3.500.000</b>	<b>5.687.000</b>	<b>3.909.718</b>	<b>4.084.722</b>	<b>4.362.476</b>	<b>8.567.533</b>	<b>14.279.222</b>	<b>14.247.808</b>	<b>14.247.808</b>	<b>114.964.118</b>

# KÖYYOLLARI UYGULAMALARI

İLÇE ADI	2020 YILI TAHSİS EDİLEN ÖDENEK (TL)	KÖYDES ÖNCEKİ YILLAR VE BİRLİK ÖDENEKLERİ (TL)	TOPLAM ÖDENEK (TL)	HARCAMA (TL)	UYGULAMA (Km)				Biten	Devam Eden	TOPLAM	AÇIKLAMALAR
					BSK	SATHI KAPLAMA	II.KAT ASFALT	PARKE TAŞI (m2)				
MERKEZ	2.006.359	0	2.006.359	1.994.532	4,6			6.329	2		2	1.Kızıldamlar BSK Bitti. 2.Muhtelif Köyler Parke Taşı Bitti.
BOZÜYÜK	950.460	88.567	1.039.027	1.039.027	0,4	1,0	11,0		4		4	1.Bozalan Sathi Kap.Bitti.. 2.Çokçapınar-Eceköy-Karaçayır BSK Bitti. 3.Ormangözle-Camiliyayla II.kat Bitti. 4.Erikli II.kat Bitti.
GÖLPAZARI	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	3,6				1		1	1.By.Belen-Bedi-İnhisar Hd.BSK Bitti.
İNHİSAR	689.380	0	689.380	689.380		3,2			1		1	1.Tarpak (Behçetiye) Sathi Kap.Bitti.
OSMANELİ	1.467.333	0	1.467.333	1.467.333		7,5	24,5		6		6	1.Osmaneli-Balçıkhisar Sathi Kap.Bitti.2.Bereket-Avdan II.kat Bitti. 3.Düzmeşe-Çiftlik II.kat Bitti.4.Sarıyazı-Benli-Ağlan II.kat Bitti. 5.Yeşilçimen-Oğulpaşa-Boyunkaya-Hisarçık-Adliye Sathi Kap.Bitti.6.Sarıyazı-Benli Sathi Kap.Bitti.
PAZARYERİ	977.266	0	977.266	977.266		5,2			3	1	4	1.Arapdede-Sarıdayı Sathi Kap.Bitti. 2.Kınık-Bulduk Sathi Kap.Bitti. 3.Sarıdayı Menfez Bitti. 4.Burçalık-By.Elmalı-Arpadere Sathi Kap.dev.ed.
SÖĞÜT	1.551.031	0	1.551.031	1.551.031		8,8			3		3	1.Yeşilyurt-Ortaca, 2.Rızapaşa 3.Rızapaşa Yeşilyurt Sathi Kaplama işleri Bitti
YENİPAZAR	160.000	245.107	405.107	405.107		4,0			2		2	1.Tohumlar-Belenören-Doğubelenören-Selim-Ulucak, 2.Selim Sathi Kaplama işleri Bitti.
<b>TOPLAM</b>	<b>9.201.829</b>	<b>333.674</b>	<b>9.535.503</b>	<b>9.523.676</b>	<b>8,6</b>	<b>29,7</b>	<b>35,5</b>	<b>6.329</b>	<b>22</b>	<b>1</b>	<b>23</b>	

# İÇMESULARI UYGULAMALARI

İLÇE ADI	2020 YILI TAHSİS EDİLEN ÖDENEK (TL)	KÖYDES ÖNCEKİ YILLAR VE BİRLİK ÖDENEKLERİ (TL)	TOPLAM ÖDENEK (TL)	HARCAMA (TL)	UYGULAMA DURUMU					AÇIKLAMALAR
					BİTEN	DEVAM EDEN	İHALE AŞ.	BAŞLAMAYAN	TOPLAM	
MERKEZ	700.000	0	<b>700.000</b>	<b>68.640</b>	2	-	-	-	<b>2</b>	1-İlyasça Sondaj bitti. 2- Kınık Depo On.bitti.
BOZÜYÜK	840.000	81.668	<b>921.668</b>	<b>891.050</b>	5	1	-	-	<b>6</b>	1.Erikli İsale Hattı bitti. 2.Muratdere Grubu Boru Güzergahının Haritasal Ölç.bitti.3. Muratdere Grubu Cazibeli İsale Hat.Yapımı bitti. 4.Kozpınar Cazibeli İsale Hat.Yapımı bitti. 5.Darıdere Sondaj bitti., 6.Yeşilçukurca isale hattı ihalesi Yapıldı.
GÖLPAZARI	1.397.951	223.629	<b>1.621.580</b>	<b>1.328.919</b>	5	-	2	-	<b>7</b>	1-Arıcaklar Nitrat Art.bitti. 2- Kurşunlu Nitrat Art. bitti. 3- Gözaçanlar ve Karaahmetler Grubu İnş.bitti. 4-Derecikören İnş.bitti. 5.Kavak İsale Hattı bitti. 6.Kuşçaören 30 m3 Yeni Depo Yapımı İhale Aşamasında. 7.Hamidiye 30 m3 Yeni Depo Yapımı İhale Aşamasında.
OSMANELİ	475.224	9.048	<b>484.272</b>	<b>269.107</b>	6	-	-	-	<b>6</b>	1-Borçak Jeofizik etüt bitti, 2.Büyükyenice Bak.On.bitti., 3.Adliye İsale Hattı Yenileme bitti. 4.Orhaniye Mev.Gömme Depodaki İçme Suyu Tesisatının Yenilenmesi bitti., 5.Soğucakpınar-Kaşıkcı Mah. Bak.On.bitti., 6.Oğulpaşa -Yeşilçimen Mah. Bakım Onarım bitti.
PAZARYERİ	311.938	224.400	<b>536.338</b>	<b>522.468</b>	6	-	-	-	<b>6</b>	1-Büyükelmalı İsale Hattı bitti., 2-Fıranlar Gömme Depo İnş.bitti. 3-Günyurdu Depo On.bitti. 4-Ahmetler Depo On.bitti. 5.Karadede Bakım Onarım bitti. 6.Bozcaarmut Şebeke Hattı bitti.
YENİPAZAR	893.431	0	<b>893.431</b>	<b>878.288</b>	2	-	-	-	<b>2</b>	1-Sorguncukahiler Terfili İsale Hattı bitti, 2-Kükürt İnş+ENH bitti.
<b>TOPLAM</b>	<b>4.618.544</b>	<b>538.745</b>	<b>5.157.289</b>	<b>3.958.472</b>	<b>26</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>29</b>	
