

T.C.
BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ
2022 YILI YATIRIMLARI



YATIRIM ve UYGULAMALAR

- 277 Proje
- 744.653.547 TL Proje Tutarı

- 235 Proje Tamamlandı
- 259.884.007 TL Harcama

- % 87 Proje Uygulaması
- % 74 Harcama

İL ÖZEL İDARESİ YATIRIM PROJELERİ ve UYGULAMALARI

(31.12.2022 Tarihi İtibariyle)

BİRİM ADI	YILI PROGRAMI ve ÖDENEĞİ		UYGULAMA ve HARCAMA						
	TOPLAM PROJE (Ad)	TOPLAM PROJE TUTARI	BİTEN PROJE	DEVAM EDEN PROJE	İHALE AŞAMASINDA PROJE	BAŞLAMAYAN	TOPLAM HARCAMA	PROJE UYGULAMA ORANI (%)	HARCA MA ORANI (%)
1.YOL ve ULAŞIM HİZMETLERİ MÜD.	104	186.140.721	104	-	-	-	102.742.677	100%	100%
2.SU ve KANAL HİZMETLERİ MÜD. (Püremant işlerle 130 adet proje yapılmıştır)	87	28.199.372	76	6	2	3	23.706.890	94%	87%
3.PLAN PROJE YATIRIM ve İNŞAAT MÜD.	77	522.781.149	55	16	3	3	125.670.003	92%	58%
4.ÇEVRE KORUMA ve KONTROL MÜD.	6	7.315.420	5	1	-	-	7.074.087	100%	96%
5.KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜD.	3	216.885	1	-	-	2	190.810	34%	87%
İL ÖZEL İDARESİ GENEL TOPLAMI	277	744.653.547	241	23	5	8	259.884.007	86%	73%



BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ

**YOL ve ULAŞIM HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ**

YOL ve ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İÇMALI


İŞİN ADI	PROGRAM (Proje Ad.)	UYGULAMA (Proje Ad.)	PROGRAM (Km)	UYGULAMA (Km)	FİZİKİ (%)	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA (TL)	MADDİ (%)	AÇIKLAMALAR
1.TESVİYE	1	1	19	19	100				Bitti.
2.ONARIM	8	8	18,5	18,5	100				Bitti.
3.STABİLİZE KAPLAMA	56	56	165,3	165,3	100				Bitti.
4.BSK	15	15	46,65	46,65	100	64.876.234	64.876.234	%100	Bitti.
5.SATHİ KAPLAMA	13	13	40,5	40,5	100	27.354.699	26.481.097	%100	Bitti.
6.II.KAT ASFALT	2	2	4,5	4,5	100	2.109.710	2.109.710	%100	Bitti.
6.SANAT YAPILARI	1	1				624.215	624.215	%100	Bitti.
7.TRAFİK LEVHALARI	1	1				1.039.311	1.039.311	%100	Bitti.
8.YOL İŞARETLEME	1	1				75.000	75.000	%100	Bitti.
9.BAKIM PROGRAMI									Bitti.
Greyderli Bakım	1	1							Bitti.
Asfalt Bakım	1	1							Bitti.
Asfalt Yama Malz.Alımı	1	1				5.523.860	5.523.860	%100	Bitti.
Asfalt Yol Yapım ve Malzeme Gideri	1	1				1.200.000	1.200.000	%100	Bitti.
10.PARKE TAŞI	2	2				813.250	813.250	%100	Bitti.
GENEL TOPLAM	104	104	294,45	294,45		102.742.677	102.742.677	%100	



BSK Yapımı



Merkez İlçe / Elmabahçe Köyü

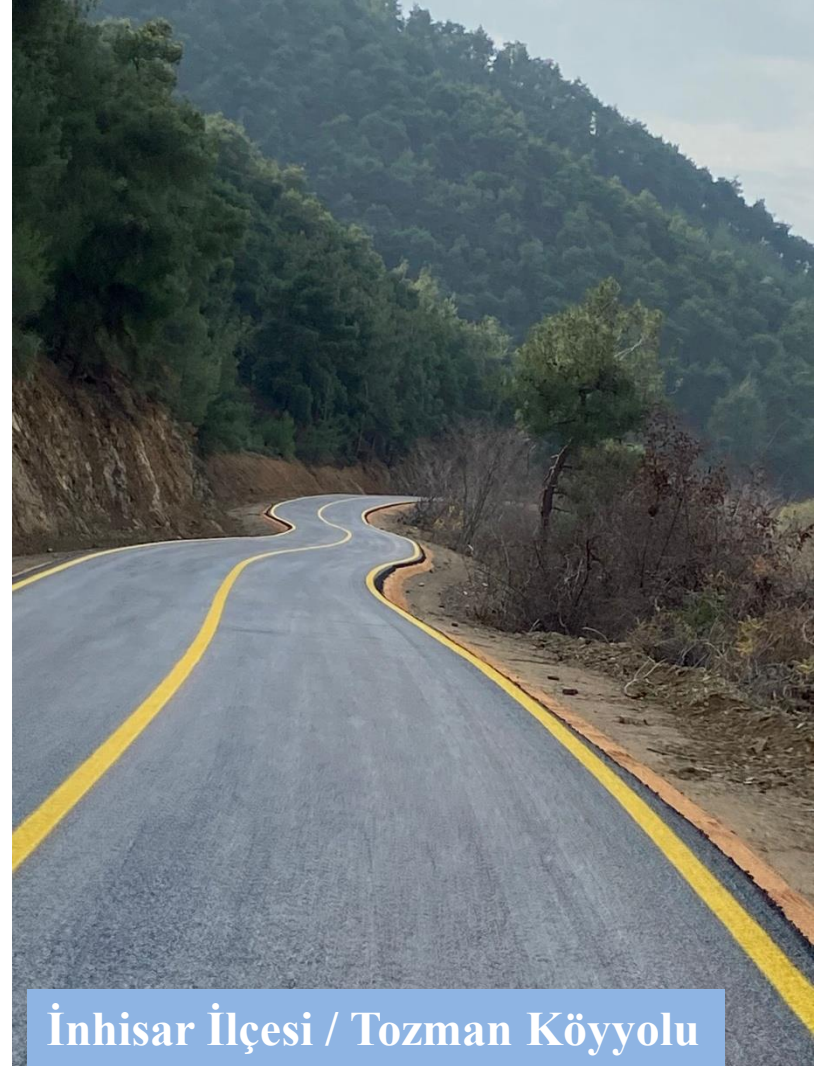

İnhisar İlçesi / Tozman Köyü



Sathi Kaplama Yapımı



Osmaneli İlçesi / Ağlan Köyü



Osmaneli İlçesi / Balçıkhisar Köyü



Onarım Çalışmaları



Merkez İlçe / Çakırpınar Köyü



İnhisar İlçesi / Tozman Köyü



Osmaneli İlçesi / Düzmeşe Köyü



Pazaryeri İlçesi / Büyükelmalı Köyü




Stabilize Çalışmaları






Asfalt Bakım Onarım Çalışmaları

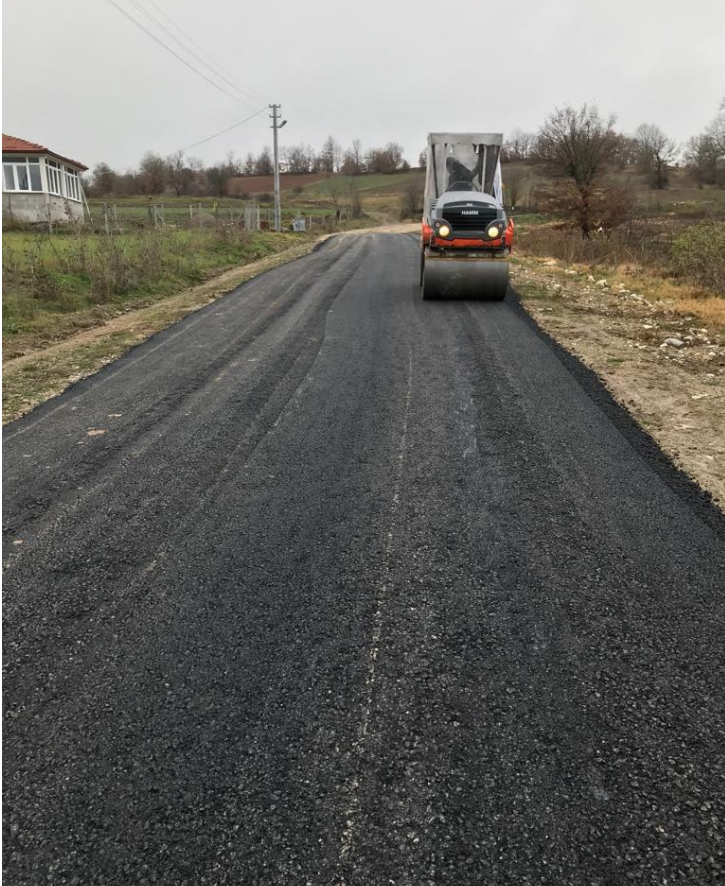

Yenipazar İlçesi / Sorguncukahiler Köy yolu

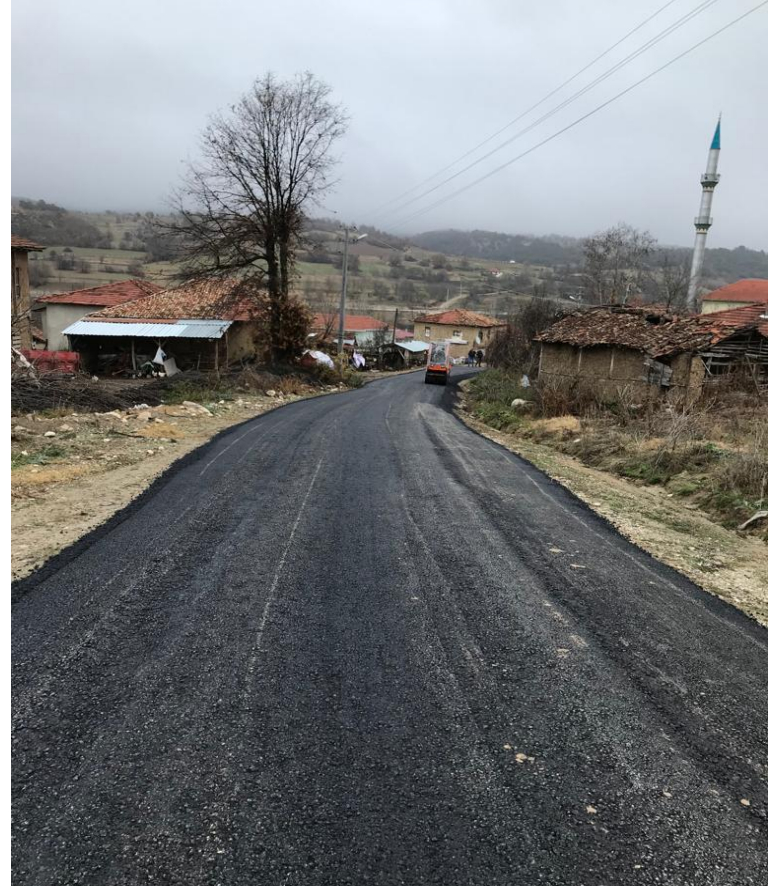

Yenipazar İlçesi / Sorguncukahiler Köy yolu



Sanat Yapısı Çalışmaları





BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ

**SU ve KANAL HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ**

SU ve KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İCMALİ

İşin Adı	Program (Proje Ad.)	Uygulama (Proje Ad.)	Fiziki (%)	Program Ödeneği (TL)	Harcama (TL)	Maddi (%)
				TOPLAM	TOPLAM	
1.İÇMESUYU PROJELERİ	72	62	%86	23.379.579	20.272.848	%86
2.KANALİZASYON PROJELERİ	2	2	%100	850.000	766.995	%90
3.SULAMA PROJELERİ	3	2	%66	697.989	296.079	%42
4.DİĞER TARIM PROJELERİ	10	10	%100	2.878.024	2.870.508	%99
GENEL TOPLAM (Püermanet işlerle 130 adet proje yapılmıştır)	87	76	%94	27.805.592	24.206.431	%87

İÇMESUYU PROJELERİ

İşin Adı0	PROGRAM (Proje Ad.)	UYGULAMA (Proje Ad.)	Fizi ki (%)	Program Ödeneği (TL)			HARCA MA (TL)	Madd i (%)	AÇIKLAMALAR
				Özel İdare	Genel İdare	TOPLAM ÖDENEK			
1.İÇMESUYU PROJELERİ	70	60	%86	580.000	20.910.524	21.490.524	18.219.733	%82	2021 yılından devam eden işler ve 2022 yılı KÖYDES Projelerinden toplam 60 proje tamamlanmış olup, 5 proje devam etmektedir.
2.İÇMESUYU BAKIM ONARIM	1	1	100	1.669.055		1.669.055	1.333.574	%79	Köylerde içme suyu borusu, kepçe ve malzeme verilerek tesislerin bakım onarımları devam etmektedir.
3.İÇMESUYU DEPOLARI KLOR ALIMI	1	1	100	220.000	-	220.000	220.000	%100	İhtiyacı olan muhtelif köy ve ünitelere dağıtımlar devam etmektedir.
GENEL TOPLAM	72	62	%86	2.469.055	20.910.524	23.379.579	19.773.307	%82	

İçmesuyu Projeleri



Bozüyük Dombayçayırı Yeni Modüler Depo




Gölpazarı Çengeller Terfili İsale Hattı

İçmesuyu Bakım Onarım İşleri



Pazaryeri Demirköy Mobil GES

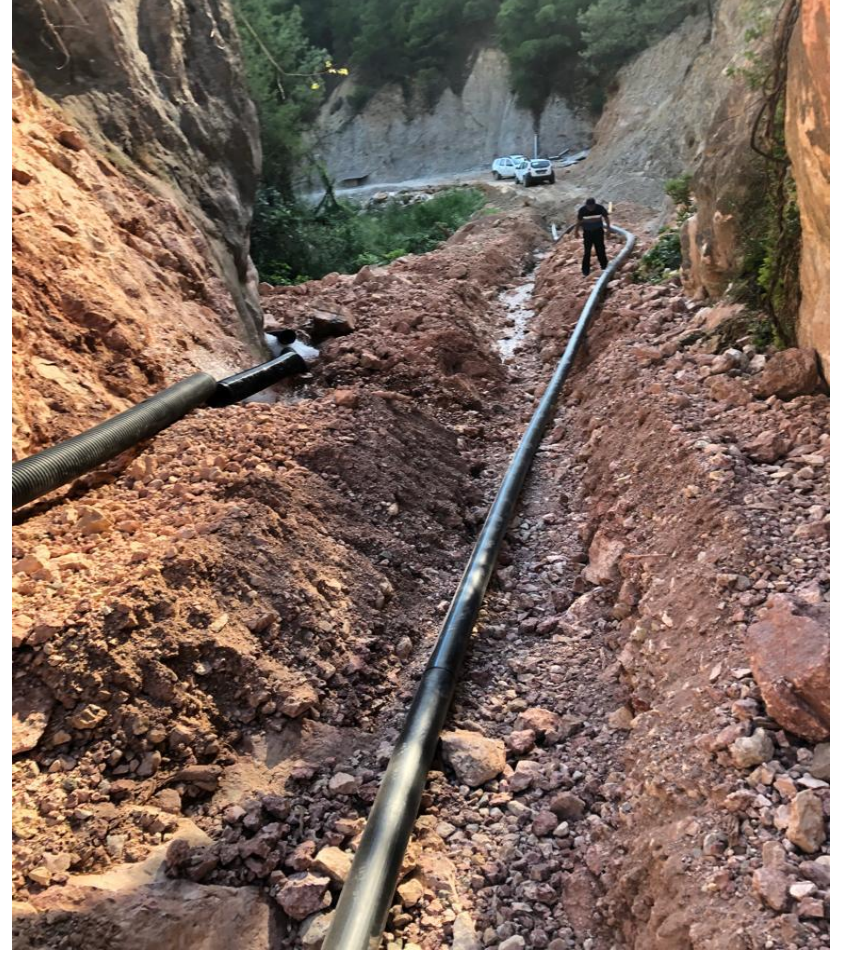

Söğüt Akçasu-Yakacık Cazibeli İsale Hattı

KANALİZASYON PROJELERİ

İŞİN ADI	PROGRAM (Proje Ad.)	UYGULAMA (Proje Ad.)	FİZİKİ Kİ (%)	PROGRAM ÖDENEĞİ (TL)			HARCAMA A (TL)	MADDİ İ (%)	AÇIKLAMALAR
				ÖZEL İDARE	GENEL İDARE	TOPLAM			
1.KANALİZASYON BAKIM ONARIM İŞLERİ	1	-	-	750.000	-	750.000	682.153	90	Köylerde kullanılmak üzere koruge boru alımı yapılmış olup, dağıtımlar yapılmaktadır.
2. KANALİZASYON YAPIMLARI	1	-	-	100.000	-	100.000	84.842	84	Gölpazarı Armutçuk Köyüne kanalizasyon tesisi yapılmıştır.
GENEL TOPLAM	2	-	-	850.000	-	850.000	766.995	-	

Kanalizasyon Yapım İşleri



Gölpazarı Armutçuk Köyü Yeni Kanalizasyon Tesisi

Kanalizasyon Hatları Bakım Onarım İşleri



Pazaryeri Küçükmalı Köyü
Kanalizasyon



Gölpazarı Gökçeler Köyü Kanalizasyon



Pazaryeri Kınık Köyü Kanalizasyon

SULAMA PROJELERİ

İŞİN ADI	PROGRAM (Proje Ad.)	UYGULAMA (Proje Ad.)	FİZİKİ (%)	PROGRAM ÖDENEĞİ (TL)			HARCA MA (TL)	MADDİ (%)	AÇIKLAMALAR
				ÖZEL İDARE	GENEL İDARE	TOPLAM			
1.YERÜSTÜ SULAMA TESİSİ İNŞAATLARI	1	-	-	117.989	-	117.989	-	-	İçmesuyu artan ödeneklerden Hisarcık Köyü için ayrıldı, devam ediyor.
2-TARIMSAL ENH.PRJ.	1	-	-	150.000	-	150.000	41.300	30	Bitti.
3.SULAMA TES. BAKIM ONARIM	1	1	-	430.000	-	430.000	254.779	59	Bitti.
GENEL TOPLAM	3	-	%0	697.989	-	697.989	296.079	%42	

Sulama Tesisi Bakım Onarım İşleri



Merkez Küplü Köyü Sulama Kanalı Onarımı



Merkez Bekdemir Köyü Sulama Kanalı
Temizliği

DİĞER TARIM PROJELERİ

İŞİN ADI	PROGRAM (Proje Ad.)	UYGULAMA (Proje Ad.)	FİZİKİ (%)	PROGRAM ÖDENEĞİ (TL)	HARCAMA (TL)	MADDİ (%)	AÇIKLAMALAR
				TOPLAM			
1.Meyveciliği Geliştirme Projesi	1	1	%100	250.000	250.000	%100	Tarım İl Müd.ne Aktarıldı.
2.Hayvan Sağlığı Zabıtası Payı	1	1	%100	16.710	16.710	%100	Tarım İl Müd.ne Aktarıldı.
3.Tahagel Payı	1	1	%100	105.700	105.700	%100	Tarım İl Müd.ne Aktarıldı.
4.Tarım Zararları ile Mücadele	1	1	%100	130.000	122.484	%93	Sinek ilacı alımı yapıldı.
5.Tarımsal Hizmetleri Destekleme Proj.	1	1	%100	765.000	765.000	%100	Tarım İl Müd.ne Aktarıldı.
6.Yem Bitkileri Alımı	1	1	%100	310.000	310.000	%100	Tarım İl Müd.ne Aktarıldı.
7. Buğday Tohumu Alımı	1	1	%100	840.000	840.000	%100	Tarım İl Müd.ne Aktarıldı.
8.Tarım Arazilerinin Kullanımının Yaygınlaştırılması	1	1	%100	153.158	153.158	%100	Tarım İl Müd.ne Aktarıldı.
9.Çukurören Biberi Kurutma Tesisi	1	1	%100	135.000	135.000	%100	Tarım İl Müd.ne Aktarıldı.
10.Osmaneli Yaylaları Sulan. Tarım. Üret. Katlanıyor Proj.	1	1	%100	172.456	172.456	%100	Tarım İl Müd.ne Aktarıldı.
TOPLAM	10	10	%100	2.878.024	2.870.508	%99	

DİĞER TARIM PROJELERİ





BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ

**PLAN PROJE YATIRIM VE
İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ**

PLAN PROJE YATIRIM ve İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ İCMALİ

İşin Adı	Program (Ad.)	Uygulama (Ad.)	Fiziki (%)	Program Ödeneği (TL)			Harcama (TL)			Mad di (%)
				Özel İdare	Genel İdare	TOPLAM	Özel İdare	Genel İdare	TOPLAM	
1.EĞİTİM HİZMETLERİ	56	44	%78		90.972.277	90.972.277	-	50.797.364	50.797.364	%55
2.SAĞLIK HİZMETLERİ	5	2	%40	-	35.677.927	35.677.927	-	3.680.054	3.680.054	%10
3.GÜVENLİK HİZMETLERİ	5	2	%40	-	80.818.174	80.818.174	-	70.122.741	70.122.741	%87
4.KÜLTÜR VE TURİZM	5	2	%40	-	4.801.553	4.801.553	-	448.270	448.270	%1
5.SOSYAL HİZMETLER	2	2	%100	-	533.815	533.815	-	-	-	-
6.ÖZEL İDARE HİZMETLERİ	4	3	%75	-	646.632	646.632		621.574	621.574	%96
GENEL TOPLAM	77	55	%71		213.450.198	213.450.198		125.670.003	125.670.003	%58

EĞİTİM HİZMETLERİ

PROJE NO	PROJENİN ADI	Program (Ad)	Uygulama (Ad)	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	YILI ÖDENEĞİ	YILI HARCAMASI	FİZİKİ (%)	AÇIKLAMALAR
EĞİTİM HİZMETLERİ								
1	2 adet Eğitim Yapısının Hurda Karşılığı Yıkım İşi	1	1		53.100	53.100	%100	Bitti.
2	Söğüt Yaşarmusaoğlu İlkokulu Çatı On.	1	1		150.296	132.514	%100	Bitti.
3	Bozüyük Halk Eğitim Merkezi Binası Onarım İşi	1	1		134.519	134.519	%100	Bitti.
4	Gölpazarı Cengiz Topel İlkokulu Bahçe Düzenlemesi	1	1		124.384	124.384	%100	Bitti.
5	Bozüyük Albay İbrahim Çolak İlk/Ortaokulu Onarım İşi	1	1		224.141	224.141	%100	Bitti.
6	Pazaryeri Nabi Avcı Erkek Öğrenci Yurdu Yangın Algılama Sis. Kurum İşi	1	1		218.740	218.740	%100	Bitti.
7	Bozüyük İMKB Anadolu Lisesi Onarım İşi	1	1		458.000	310.959	%100	Bitti.
8	Gölpazarı Gazimihal İlkokulu Doğalgaz Dönüşüm İşi	1	1		351.623	351.623	%100	Bitti.
9	Bozüyük İçköy İlkokulu Onarım İşi	1	1		210.091	189.366	%100	Bitti.
10	Bozüyük Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu Onarım İşi	1	1		250.716	250.716	%100	Bitti.
11	Bozüyük Kumral Abdal Anadolu Lisesi Onarım İşi	1	1		258.420	258.420	%100	Bitti.
12	Bozüyük Dodurga Beldesi Dodurga İlkokulu Onarım İşi	1	1		363.661	358.690	%100	Bitti.
13	Merkez Malhun Hatun İlkokulu Onarım İşi	1	1		702.399	702.399	%100	Bitti.
14	Merkez Ertuğrulgazi İlkokulu Onarım İşi	1	1		133.266	128.474	%100	Bitti.
15	Çevre Dostu 1000 Okul Projesi Kapsamında 7 Eğitim Yapısı Onarım İşi	1	1		818.884	818.884	%100	Bitti.
16	Bozüyük Halk Eğitim Merkezi Ana Bina Bakım Onarım İşi	1	1		545.544	545.544	%100	Bitti.
17	Bozüyük İçköy Ortaokul Onarım İşi	1	1		121.645	121.465	%100	Bitti.
17	ONARIM TOPLAMI	17	17		5.119.429	4.923.938		

EĞİTİM HİZMETLERİ

PROJE NO	PROJENİN ADI	Program (Ad)	Uygulama (Ad)	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	YILI ÖDENEĞİ	YILI HARCAMASI	FİZİKİ (%)	AÇIKLAMALAR
Nakli Yekün		17	17		5.119.429	4.923.938		
18	Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bakım Onarım İşi	1	1		1.859.729		100,00%	Bitti.
19	Merkez Pelitözü Ortaokulu Doğalgaz Dönüşüm İşi	1	1		421.065	421.065	100,00%	Bitti.
20	Bozüyük Dodurga Beldesi Dodurga Ortaokulu Doğalgaz Dönüşüm İşi	1	1		430.087	430.087	100,00%	Bitti.
21	Bozüyük Zafer İlkokulu Bakım Onarım İşi	1	1		250.160	250.160	100,00%	Bitti.
22	Bozüyük Metristepe İlkokulu Çatı Onarım İşi	1	1		423.694	423.694	100,00%	Bitti.
23	Bozüyük Öğretmen Bekir Aral İlkokulu Onarım İşi	1	1		192.683	183.075	100,00%	Bitti.
24	Bozüyük Saffet Şeker İlkokulu Bakım Onarım İşi	1	1		721.793	721.793	100,00%	Bitti.
25	Pazaryeri Beşeylül İlkokulu Onarım İşi	1	1		128.022	128.022	100,00%	Bitti.
26	Gölpazarı Halk Eğitim Merkezi Onarım İşi	1	1		645.253	645.253	100,00%	Bitti.
27	Pazaryeri Halk Eğitim Merkezi Onarım İşi	1	1		341.337	341.337	100,00%	Bitti.
28	Osmaneli 75. Yıl ANADOLU Lisesi Pansiyon KATI Bakım Onarım İşi	1	1		289.000	213.307	100,00%	Bitti.
29	Bozüyük Selahattin Şeker MTAL Bakım Onarım İşi	1	1		888.268	888.268	100,00%	Bitti.
30	Gölpazarı İsmail Kara Anaokulu Onarım İşi	1	1		142.071	139.350	100,00%	Bitti.
31	Pazaryeri Kınık İlkokulu Onarım İşi	1	1		552.504	552.504	100,00%	Bitti.
32	Osmaneli Çerkeşli İlkokulu Çevre Düzenleme İşi	1	1		452.235	452.235	100,00%	Bitti.
33	Söğüt Çaltı İlkokulu Onarım İşi	1	1		418.514	418.514	100,00%	Bitti.
34	Osmaneli Hisarcık Beşevler İlk-Orta Okulu Bakım Onarım	1	1		994.455	994.455	100,00%	Bitti.
34	ONARIM TOPLAMI	34	34		14.270.119	12.127.057		



EĞİTİM HİZMETLERİ

E NO	PROJENİN ADI	Program (Ad)	Uygulama (Ad)	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	ÖDENEK (TL)	HARCAMA (TL)	FİZİKİ (%)	AÇIKLAMALAR
GÜÇLENDİRME İŞLERİ								
1	Bozüyük Saffet Şeker Ortaokulu Güçlendirme ve Onarım İşi	1	1	302.995	1.758.721	1.758.721	100,00%	Bitti.
2	Bozüyük Necatibey İlkokulu Güçlendirme ve Onarım İşi	1	1	571.166	1.138.442	758.781	100,00%	Bitti.
3	İnhisar Atatürk İlkokulu Güçlendirme ve Onarım İşi	1	1		3.137.211	52.127	100,00%	Yıkım işi bitti.
4	Merkez Balahatun Anaokulu Güçlendirme ve Onarım İşi	1	1	442.810	1.462.656	1.462.656	100,00%	Bitti.
5	Bilecik Refik Aslan Öztürk Fen Lisesi Okul Bin. Güçlendirme ve onr. İşi	1	1		2.826.638	2.826.638	100,00%	Bitti.
6	Söğüt Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu Güçlendirme ve Onr. İşi	1	1		4.112.926	4.112.926	80,00%	Bitti.
7	Söğüt Anadolu Lisesi Güçlendirme ve Onr. İşi	1	1		3.303.199	3.303.199	85,00%	Bitti.
8	Gölpazarı Güner Orbay MTAL Güçlendirme ve Onr. İşi	1	1		3.201.396	3.201.396	100,00%	Bitti.
9	Osmaneli Atatürk Ortaokulu Güçlendirme ve Onr. İşi	1	1		2.891.000	761.681	100,00%	Fesh edildi.
10	Pazaryeri Hilmi Duralioğlu Anadolu Lisesi Güçlendirme ve Onr. İşi	1			4.506.461	2.275.561	30 %	Devam ediyor.
11	Söğüt 100. Yıl Atatürk Ortaokulu Güçlendirme ve Onr. İşi	1			450.000	289.527	25 %	Devam ediyor.
11	GÜÇLENDİRME TOPLAMI	11	9	1.316.971	28.788.650	20.803.213		

Bilecik Merkez Balahatun Anaokulu Güçlendirme ve Onarım Yapım İŖi

İhale Tarihi:09.06.2021

Sözleşme Tarihi:29.06.2021

Yer Teslim Tarihi:05.07.2021

Sözleşme Bedeli:1.444.000+KDV

Fiziki Gerçekleşme:% 100

Durumu: Bitti.



Bilecik Refik Aslan Öztürk Fen Lisesi Okul Binası Güçlendirme ve Onarım İşı

İhale Tarihi:15.10.2021

Sözleşme Tarihi:04.11.2021

Yer Teslim Tarihi:08.11.2021

Sözleşme Bedeli:1.979.000+KDV

Fiziki Gerçekleşme:% 100

Durumu: Bitti.



Bilecik Bozüyük Saffet Şeker Ortaokulu Güçlendirme ve Onarım İşi

İhale Tarihi: 17.06.2021

Sözleşme Tarihi:07.07.2021

Yer Teslim Tarihi:12.07.2021

Sözleşme Bedeli:1.674.499+KDV

Fiziki Gerçekleşme:% 100

Durumu: Bitti.



Bilecik Bozüyük Necatibey İlkokulu Güçlendirme ve Onarım İŖi

İhale Tarihi:07.07.2021

Sözleşme Tarihi:29.07.2021

Yer Teslim Tarihi:26.07.2021

Sözleşme Bedeli:1.563.346 +KDV

Fiziki Gerçekleşme:% 100

Durumu: Bitti.



Bilecik Sögüt Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu Güçlendirme İŖi

İhale Tarihi:23.10.2021

Sözleşme Tarihi:29.06.2021

Yer Teslim Tarihi:08.11.2021

Sözleşme Bedeli:2.737.000 +KDV

Fiziki Gerçekleşme:% 100

Durumu: Bitti.



Bilecik Sögüt Anadolu Lisesi Güçlendirme ve Onarım İşi

İhale Tarihi:01.11.2021

Sözleşme Tarihi:22.11.2021

Yer Teslim Tarihi:26.11.2021

Sözleşme Bedeli:2.073.000+KDV

Fiziki Gerçekleşme:% 100

Durumu: Bitti.



Bilecik Gölpaazarı Güner Orbay MTAL Güçlendirme İşi

İhale Tarihi:18.10.2021

Sözleşme Tarihi:01.11.2021

Yer Teslim Tarihi:03.11.2021

Sözleşme Bedeli:2.047.650+KDV

Fiziki Gerçekleşme:% 100

Durumu: Bitti.



Bilecik Osmaneli Atatürk Ortaokulu Güçlendirme İŖi

İhale Tarihi:25.11.2021

Sözleşme Tarihi:03.01.2021

Yer Teslim Tarihi:07.01.2021

Sözleşme Bedeli:2.450.000+KDV

Fiziki Gerçekleşme:% 10

Durumu: Fesh edildi,Yıkım ihalesi yapıldı.



Bilecik İnhisar Atatürk İlkokulu Güçlendirme İŖi

İhale Tarihi: 04.04.2022

Sözleşme Tarihi: 09.05.2022

Yer Teslim Tarihi: 30 05 2022

Sözleşme Bedeli: 1.600.000+KDV

Fiziki Gerçekleşme: % 100

Durumu: Yıkım işi Bitti.



Bilecik Pazaryeri Hilmi Duraliođlu Anadolu Lisesi Güçlendirme İŖi

İhale Tarihi:14.09.2022

Sözleşme Tarihi:06.10.2022

Yer Teslim Tarihi:07.10.2022

Sözleşme Bedeli:4.375.000+KDV

Fiziki Gerçekleşme:%70

Durumu: Güçlendirme imalatları tamamlandı, ek bina betonarme imalatları devam ediyor.



Söğüt 100.Yıl Atatürk Ortaokulu Güçlendirme ve Onarım İşi

İhale Tarihi:05.10.2022

Sözleşme Tarihi:01.11.2022

Yer Teslim Tarihi:04.11.2022

Sözleşme Bedeli:2.899.000+KDV

Fiziki Gerçekleşme:% 10

Durumu: Güçlendirme ve ek bina betonarme imalatları devam ediyor.



2 Adet Eğitim Yapısının Hurda Karşılığı Yıkım İşi

İhale Tarihi:07.02.2022

Sözleşme Tarihi:09.02.2022

Yer Teslim Tarihi:10.02.2022

Sözleşme Bedeli:45.000+KDV

Fiziki Gerçekleşme:% 100

Durumu: Bitti.



EĞİTİM HİZMETLERİ

PROJE NO	PROJENİN ADI	Program (Ad)	Uygulama (Ad)	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	YILI ÖDENEĞİ	YILI HARCAMASI	FİZİKİ (%)	AÇIKLAMALAR
YENİ YAPIMLAR								
1	Bilecik Merkez 24 Derslikli İlkokul Yapım İşi	1			7.000.000	5.004.384		Devam ediyor.
2	Bilecik Merkez MTAL ve 5 Atölye Binası Yapım.İşi	1						Proje onaylanmak üzere Milli Eğitim Müd.ne gönderilmiştir.
3	Bilecik Merkez Kız İHL Kapalı Spor Salonu Yapım İşi	1	1		113.328	113.328		İş tasfiye edilmiştir. Hazine Bakanlığında gelen görüş neticesinde yeniden yapımı uygun görülmemiştir.
4	Pazaryeri 8 Derslikli Ortaokul ve 8 Derslikli İHO Yapım İşi	1			25.500.000	7.744.998	%10	İş devam ediyor.
5	Bilecik Merkez 21 Derslikli Kız İ.H. Ortaokulu Yapım İşi	1						Sözleşme aşamasında
6	Bozüyük Yeni Mah.8 Derslikli Anaokulu Ypm İşi	1			4.500.000			Yer teslimi yapıldı.
7	Osmaneli 24 Derslikli İlkokul Yapım İşi	1			7.000.000	5.004.384		İş devam ediyor.
8	Osmaneli 24 Derslikli Ortaokul Yapım İşi	1			3.800.000			İhale süreci devam ediyor.
9	Merkez Anaokulu Yapımı	1						İhale süreci devam ediyor.
10	Pelitözü Özel Eğitim Anaokulu	1						İşe başlandı.
11	Bilecik İnhisar 8 Derslikli İlkokul/Ortaokul Yapım İşi	1						İhale süreci devam ediyor.
11	YENİ YAPIMLAR TOPLAMI	11			47.913.328	17.867.094		
EĞİTİM HİZMETLERİ TOPLAMI		56	44		90.972.097	50.797.364		

Bilecik Merkez 24 Derslikli İlkokul Yapım İŖi

İhale Tarihi:06.09.2022

Sözleşme Tarihi:27.09.2022

Yer Teslim Tarihi:30.09.2022

Sözleşme Bedeli:28.433.000+KDV

Fiziki Gerçekleşme:%23

Durumu: Zemin kat döşemesi döküldü, birinci kat kolon çalışmalarını devam ediyor.



Bilecik Merkez MTAL ve 5 Atölye Binası Yapım İşi

PROJE DURUMU:
10.06.2022 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. Proje kontrollüğü Bilecik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Projeler **13.01.2023** tarihinde İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmiştir.



Bilecik Merkez Kız İHL Kapalı Spor Salonu Yapım İşi

PROJE DURUMU:
İHALE EDİLDİ
PROJE BEDELİ:
4.279.860
PROJE BİTİM
TARİHİ:
03.09.2022



Yüklenicinin 4735 sayılı
Kanunun Geçici
6.maddesi kapsamında
tasfiye talebi gereği iş
tasfiye edilmiştir.

BİLECİK MERKEZ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ SPOR SALONU



GÖKSEL TUR. İNŞ. VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
İstiklal Mh. Santral Sk. No:1 / 16 ESKİŞEHİR
0222 234 40 50 / www.gokselinsaat.com.tr

Bilecik İli Pazaryeri İlçesi 8 Derslik Ortaokul ve 8 Derslik İ.H.O Yapım İşi

İhale Tarihi:13.05.2022

Sözleşme Tarihi:27.07.2022

Yer Teslim Tarihi:01.08.2022

Sözleşme Bedeli:25.500.000+KDV

Fiziki Gerçekleşme:%25

Durumu: Birinci kat betonarme imalatlarına başlandı.



Bilecik Merkez 24 Derslikli Kız İHO Yapım İŖi

İhale Tarihi: 20.12.2022

Sözleşme Tarihi: İhale kararı

19.01.2023

Yer Teslim Tarihi:-

İhale Bedeli:32.770.000+KDV

Fiziki Gerçekleşme:%0

Durumu: Sözleşme aşamasında.



Bilecik Bozüyük Yeni Mah. 8 Derslikli Anaokulu Yapım İŖi

İhale Tarihi:27.09.2022

Sözleşme Tarihi:25.10.2022

Yer Teslim Tarihi:25.10.2022

Sözleşme

Bedeli:15.619.014+KDV

Fiziki Gerçekleşme:%0

Durumu: İnşaat ruhsatı alındı,
kazı çalışmalarına başlanacaktır.



Bilecik Osmaneli 24 Derslikli İlkokul Yapım İŖi

İhale Tarihi:21.07.2022


Sözleşme Tarihi:15.09.2022

Yer Teslim Tarihi:20.09.2022

Sözleşme Bedeli:32.228.011+KDV

Fiziki Gerçekleşme:%22

Durumu: Bodrum perde ve kolon imalatları bitti, döşeme betonu döküldü.

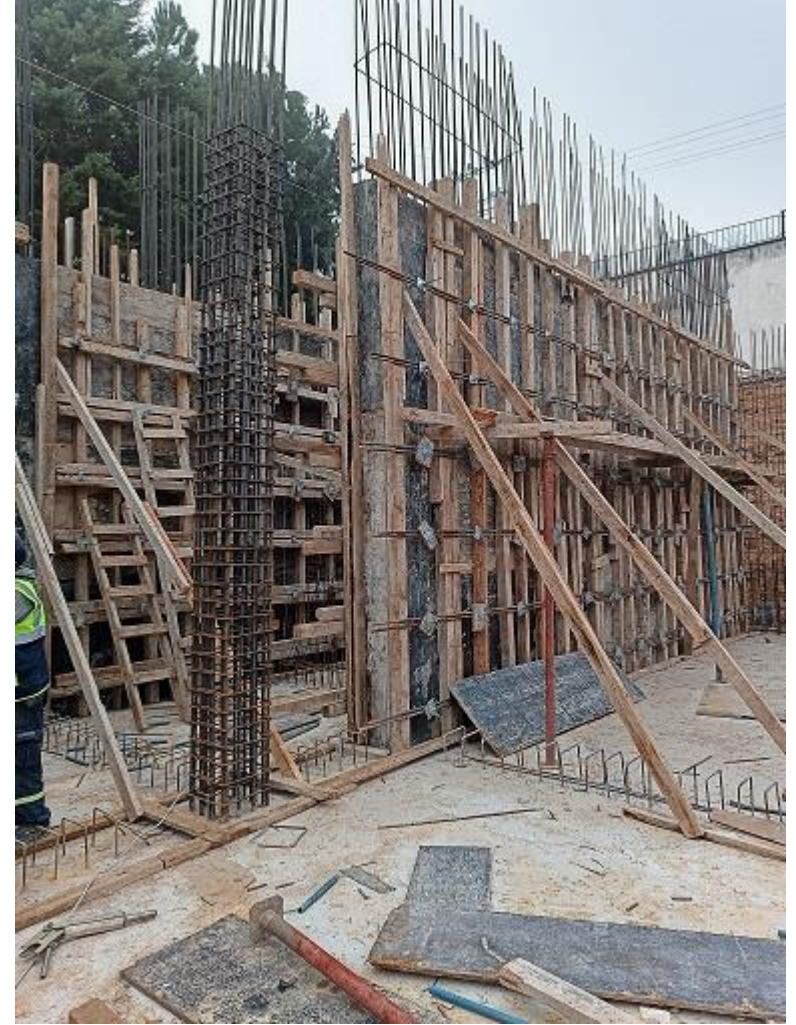

Bilecik Osmaneli 24 Derslikli Ortaokul Yapım İŖi

İhale Tarihi:01.12.2022

Sözleşme Tarihi:17.01.2023

Yer Teslim

Tarihi:18.01.2023

Sözleşme

Bedeli:37.763.000+KDV

Fiziki Gerçekleşme:%0

Durumu: 18.01.2023

tarihinde yer teslimi yapıldı.




ONARIM HİZMETLERİ ÇALIŞMALARI




Bozüyük İlçesi İçköy İlkokulu Onarım İşi



Sögüt Yaşar Musaoğlu İlk/Ortaokulu Onarım Çalışmaları

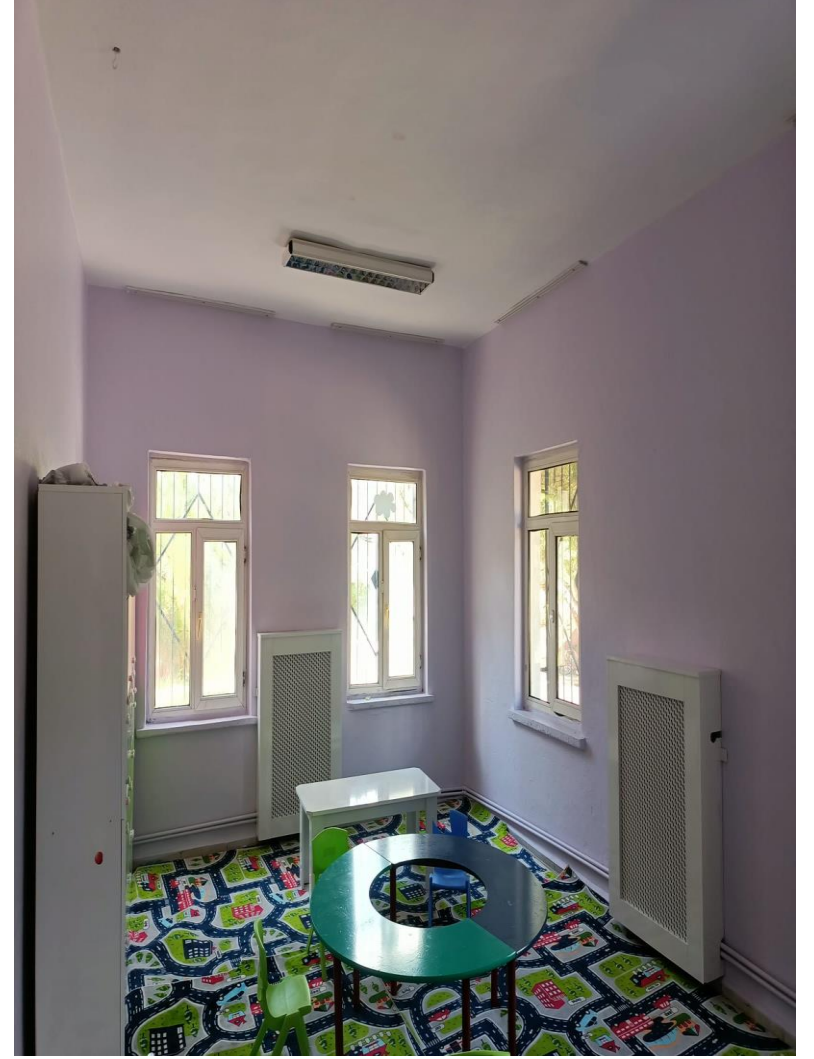

Merkez Küplü Köyü İlkokulu Onarım İŖi

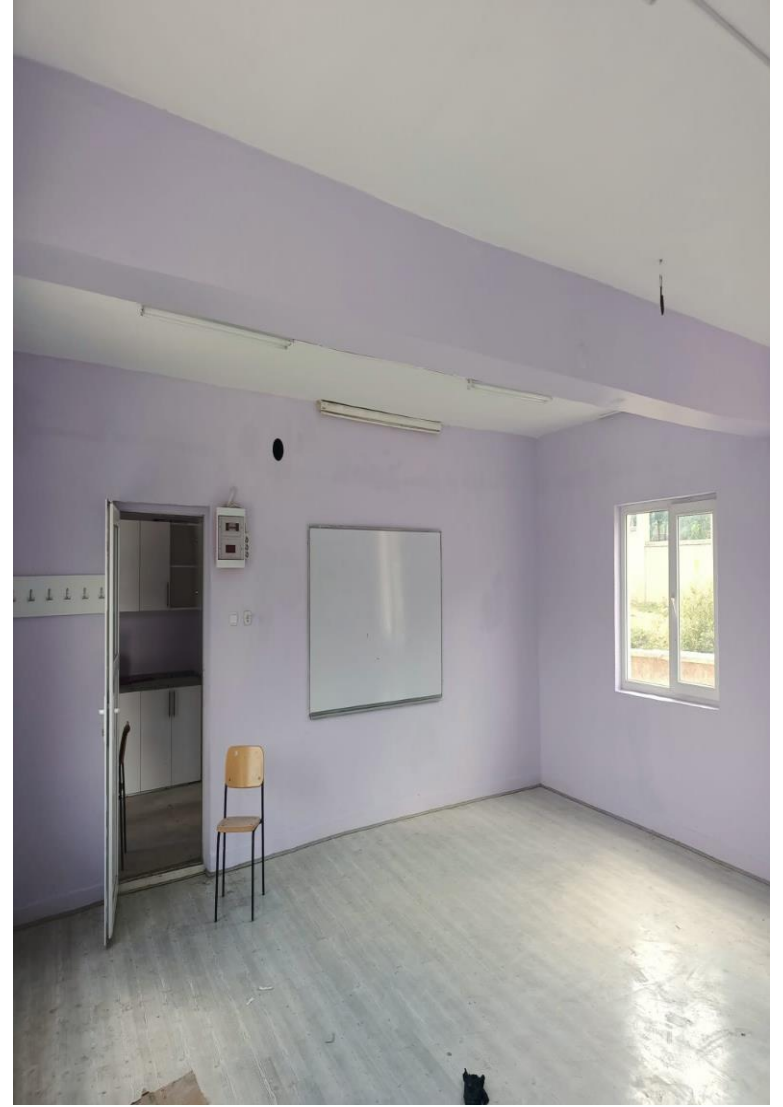

Bozüyük Kapanalan İlkokulu Onarım İŖi

SAĞLIK HİZMETLERİ

PROJE NO	PROJENİN ADI	Program (Ad)	Uygulama (Ad)	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	PROGRAM ÖDENEĞİ	TOPLAM HARCAMA	FİZİKİ (%)	AÇIKLAMALAR
1	BOZÜYÜK 5-6 Hek.ASM+112 ASHİ Bina Yapım işi	1	-		7.847.000	2.171.888	%20	İş devam ediyor.
2	Merkez ASM+112 Sağlık Hiz. Bina İstasyonu işi	1	-		1.450.000	229.131	%10	İş devam ediyor.
3	Pazaryeri 112 ASHİ Binası Yapım İşİ	1	1		1.010.821	1.010.821	%100	Bitti.
4	Merkez Eski Devlet Hastanesi yıkılarak Sağlık Hayat Merkezi ve ASM+112 ASHİ ve 112 LMB Yapım İşİ	1	1		370.106	268.214	%100	Bitti.
5	Bilecik Merkez SHM ASM 112 Lojistik Merkez Binası Yapım İşİ	1			25.000.000			Binanın yapılacağı yerdeki eski binanın yıkım işi yapılıyor.
	SAĞLIK HİZMETLERİ TOPLAMI	5	2		35.677.927	3.680.054		

Bilecik Bozüyük 5-6 Hek. ASM+112 ASHİ Bina Yapım İşi

İhale Tarihi:17.08.2022

Sözleşme Tarihi:08.09.2022

Yer Teslim Tarihi:13.09.2022

Sözleşme Bedeli:7.847.000+KDV

Fiziki Gerçekleşme:%25

Durumu: Birinci kat döşeme kalıbı imalatları devam ediyor.



Bilecik Merkez 2 Hek. ASM Bina ve 112 Acil Saęlık Hiz. İstasyon Yapım İŖi

İhale Tarihi:29.09.2022

Sözleşme Tarihi:25.10.2022

Yer Teslim Tarihi:02.11.2022

Sözleşme Bedeli:7.224.571+KDV

Fiziki Gerçekleşme:% 11

Durumu: Kolon döşeme yapımı işleri devam ediyor.



Bilecik Pazaryeri 112 ASHİ Binası Yapım İşi

İhale Tarihi:22.02.2022

Sözleşme Tarihi:25.03.2022

Yer Teslim Tarihi:30.03.2022

Sözleşme Bedeli:864.000+KDV

Fiziki Gerçekleşme:% 100

Durumu: Bitti.



Bilecik Merkez Sađlıklı Hayat Merkezi -Aile Sađlığı Merkezi-112 Acil Sađlık İstasyonu-112 Lojistik Merkezi Yapım İŖi

İhale Tarihi:01.11.2022

Sözleşme Tarihi:24.11.2022

Yer Teslim Tarihi:28.11.2022

Sözleşme Bedeli:38.300.000+KDV

Fiziki Gerçekleşme:%0

Durumu: Eski bina söküm ve yıkım işleri devam etmektedir.



GÜVENLİK HİZMETLERİ

PROJE NO8	PROJENİN ADI	Program (Ad)	Uygulama (Ad)	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	PROGRAM ÖDENEĞİ	TOPLAM HARCAMA	FİZİKİ (%)	AÇIKLAMALAR
1	Bilecik Bölge Trafik Otopark Yapım İşi	1	-					Yaklaşık maliyet işlemleri devam ediyor.
2	Söğüt Jan.Ulaş.Eğit. Tab. Kom. Defansif Sürüş Eğt.ParkurYap.İşi	1	1	16.398.231	59.609.950	59.609.950	100,00%	Bitti., İkmal ihalesi yapılacak.
3	Söğüt Jan.Ulaş.Eğit.Tab. Kom. Simülasyon Merkezi Yap.İşi	1	1	5.105.216	19.464.744	8.769.311	40,00%	İş fesh edildi.
4	Söğüt Jan.Ulaş.Eğit.Tab. Kom. Defansif Sürüş Eğt. ParkurYap.İşi Müşavirlik Hizmet Alım İşi	1	-	785.293	1.743.480	1.743.480	60,00%	Devam ediyor.
5	Bozüyük Dodurga Jandarma KarakoluDoğalgaz Dönüşüm İşi	1						
GÜVENLİK HİZMETLERİ TOPLAMI		5	2	22.288.740	80.818.174	70.122.741	%40	

Bilecik Sögüt Jan. Ulaş. Eğit. Tab. Kom. Defansif Sürüş Eğit. Parkur Yapım İşi

İhale Tarihi:15.02.2021

Sözleşme Tarihi:16.03.2021

Yer Teslim

Tarihi:22.03.2021

Sözleşme

Bedeli:45.552.000+KDV

Fiziki Gerçekleşme:% 80

Durumu: Tasfiye edildi,
İkmal ihale çalışması devam
etmektedir.



Bilecik Sögüt Jan. Ulaş. Eğit. Tab. Kom. Simülasyon Merkezi Yapım İşi

İhale Tarihi:09.03.2021

Sözleşme Tarihi:15.04.2021

Yer Teslim Tarihi:22.04.2021

Sözleşme

Bedeli:20.822.000+KDV

Fiziki Gerçekleşme:%45

Durumu: Yüklenici verilen sürede işi yapamadığından sözleşmesi fesh edildi, ikmal ihalesi yapılacaktır.



KÜLTÜR TURİZM HİZMETLERİ

PROJE NO	PROJENİN ADI	Program (Ad)	Uygulama (Ad)	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	PROGRAM ÖDENEĞİ	TOPLAM HARCAMA	FİZİKİ (%)	AÇIKLAMALAR
1	Bilecik Müzesi onarımı,teşhir tanzimi ve çevre düzenlemesi	1			540.000			Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yaklaşık maliyetin hazırlanması bekleniyor.
2	Bilecik Müzesi onarımı,teşhir tanzimi ve çevre düzenlemesi	1			600.000			
3	Bozüyük İlçe Halk Kütüphanesi Yapımı	1			2.500.000			Binanın yapılacağı yerdeki eski bina yıkılıyor.
4	Bilecik Osmaneli Necla Hanım Konağı Kış Bahçesi Yapım İşi	1	1		448.270	448.270	100,00%	Bitti.
KÜLTÜR ve TURİZM TOPLAMI		4	2		4.801.553	448.270		

SOSYAL HİZMETLER

PROJE NO	PROJENİN ADI	Program (Ad)	Uygulama (Ad)	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	PROGRAM ÖDENEĞİ	TOPLAM HARCAMA	FİZİKİ (%)	AÇIKLAMALAR
1	Söğüt Millet Bahçesi Yapım İşi	1	-		193.250		100%	Proje uygulama ve mimarı uyg. Proje işi bitti.
2	Bilecik Çocuk Evleri Yağmur Olukları Değişimi ve Taş Duvar Yapımı	1	-		340.565		%100	Bitti.
SOSYAL HİZMETLER TOPLAMI		2	-		533.815		0	

ÖZEL İDARE HİZMETLERİ

PROJE NO	PROJENİN ADI	Program (Ad)	Uygulama (Ad)	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	PROGRAM ÖDENEĞİ	TOPLAM HARCAMA	FİZİKİ (%)	AÇIKLAMALAR
1	Osmaneli Çerkeşli Köyü Metip Proje Yapım İşi	1	1	917.763	202.057	179.047	%100	Bitti.
2	Bilecik Küplü Meyve Kurutma Tesisi	1						Proje imalat fiyatlarındaki artış sebebiyle durduruldu.
3	Bilecik Söğüt Millet Bahçesi Peyzaj Projesi Uygulama ile mimari uygulama Projesi	1	1		220.375	218.327	100,00%	Bitti.
4	Bilecik Hükümet Konağı Bahçesinde Kullanılmak Üzere Pergole Mal Alımı	1	1		224.200	224.200	100,00%	Bitti.
5	Hükümet Konağı ve İl Emniyet Müdürlüğü Proje Hizmet Alım İşi	1	1		743.400		%100	Bitti.
ÖZEL İDARE HİZMETLER TOPLAMI		5	4	917.763	646.632	621.574		

Bilecik Osmaneli erkeşli Ky METİP Proje Yapım İŖi

İhale Tarihi:116.08.2021

Yer Teslim Tarihi:16.09.2021

Szleşme Bedeli:949.000+KDV

Fiziki Gerçekleşme:% 100

Durumu: Bitti.



Bilecik Küplü Köyü 214 Ada,5 Parsele Meyve Kurutma Tesisi Yapım İşı

PROJE DURUMU:

BEBKA'ya proje sunulmuş olup ; maliyetlerdeki fiyat artışı nedeni ile değerlendirme dışı bırakılmıştır.



Bilecik Sögüt Millet Bahçesi Yapım İşi

PROJE DURUMU:
PROJE
DURUMU:25/04/2022
tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. Proje uygulama ve mimari uygulama projesi tamamlanmıştır. İller Bankası tarafından ayrılan hibe ödenek (2.000.000 TL) ile proje+yürüyüş yolu+otopark peyzaj işleri bitti.



Hükümet Konağı ve İl Emniyet Müdürlüğü Proje Hizmet Alım İşi

PROJE DURUMU:

Proje hizmet işi
tamamlanmış, Hükümet
Konağı ve Hizmet Binası
Yapım İşi ihalesi
30.01.2023 tarihinde
yapılacaktır.



Bozüyük İlçesi Halk Kütüphanesi Yapım İŖi

PROJE DURUMU:

Yıkım ruhsatı alındı. Eski Kaymakamlık Lojmanı yıkımıyla iŖ baŖlıyor.



Osmaneli Necla Hanım Konađı Onarımı

İhale Tarihi:23.08.2022

Sözleşme Tarihi:12.09.2022

Yer Teslim Tarihi:13.09.2022

Sözleşme Bedeli:379.890+KDV

Fiziki Gerçekleşme:% 100

Durumu: Bitti.



Bilecik Çocuk Evleri Yağmur Olukları Değişimi ve Taş Duvar Yapımı





BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ

**ÇEVRE KORUMA ve
KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ**

ÇEVRE KORUMA ve KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE NO	PROJENİN ADI	Özel İdare	Genel İdare	TOPLAM ÖDENEK	TOPLAM HARCAMA	FİZİKİ (%)	AÇIKLAMALAR
1	Çocuk Parkı Yapımı	70.634	-	70.634			Devam ediyor.
2	Temizlik Hizmetleri Alımı	6.634.979	-	6.634.979	6.634.979	100,00%	Bitti.
3	Sahipsiz Sokak Hayvanlarının Kısırlaştırılması	170.000	-	170.000		100,00%	Bitti.
4	Sokak Hayvanları Yem Alımı	50.000	-	50.000	49.950	100,00%	Bitti.
5	Engelli Çocuklara Oyun Grubu Alımı	218.949	-	218.949	218.300	100,00%	Bitti.
6	Bilecik Belediyeler Birliği Payı	170.858		170.858	170.858	100,00%	Bitti.
	ÇEVRE KORUMA ve KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAMI	7.315.420	-	7.315.420	7.074.087		





BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ
KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER
MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE NO	PROJENİN ADI	Program (Ad)	Uygulama (Ad)	PROGRAM ÖDENEĞİ	TOPLAM HARCAMA	FİZİKİ (%)	AÇIKLAMALAR
1	Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Yardımı	1	1	190.810	190.810	100,00%	Bitti.
2	El Sanatları Geliştirme Prj.	1	-	10.000			Başlamadı.
3	Muhtaç Asker Ailelerine Yardım	1	-	16.075			Başlamadı.
3	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAMI	3	1	216.885	190.810		
