

**T.C.**  
**BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ**  
**2014 YILI YATIRIMLARI**



## YATIRIM ve UYGULAMALAR

- 229 Proje
- 50.438.009 TL Ödenek

- 197 Proje Tamamlandı
- 32.697.881 TL Harcama

- %86 Proje Uygulaması
- %65 Harcama

# İL ÖZEL İDARESİ YATIRIM PROJELERİ VE UYGULAMALARI

## ( 31.12.2014 Tarihi İtibariyle )

BİRİM ADI	YILI PROGRAMI ve ÖDENEĞİ				UYGULAMA ve HARCAMA						
	TOPLAM PROJE (Ad)	ÖZEL İDARE	GENEL İDARE	TOPLAM ÖDENEK	BİTEN PROJE	DEVAM EDEN PROJE	İHALE AŞAMASINDA PROJE	BAŞLAMAYAN	TOPLAM HARCAMA	PROJE UYGULAMA ORANI (%)	HARCA MA ORANI (%)
1.YOL ve ULAŞIM HİZMETLERİ MÜD.	77	1.978.000	3.304.171	5.282.171	77	-	-	-	4.993.287	%100	%95
2.SU ve KANAL HİZMETLERİ MÜD.	44	460.000	1.931.375	2.391.375	41	3	-	-	1.974.015	%93	%83
3.PLAN PROJE YATIRIM ve İNŞAAT MÜD.	90	4.987.739	34.245.446	39.233.185	65	13	1	11	23.624.036	%72	%60
4.ÇEVRE KORUMA ve KONTROL MÜD.	5	1.469.133	694.145	2.163.278	2	3	-	-	1.029.218	%40	%48
5.KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜD.	2	104.000		104.000	2	-	-	-	74.634	%100	%72
6.TARIMSAL HİZMETLER MÜD.	11	1.047.000	217.000	1.264.000	10	1	-	-	1.002.691	%91	%79
<b>İL ÖZEL İDARESİ GENEL TOPLAMI</b>	<b>229</b>	<b>10.045.872</b>	<b>40.392.137</b>	<b>50.438.009</b>	<b>197</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>32.697.881</b>	<b>%86</b>	<b>%65</b>

# YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

## ( 31.12.2014 Tarihi İtibariyle )

İŞİN ADI	PROGRAM (Proje Ad.)	UYGULAMA (Proje Ad.)	PROGRAM (Km)	UYGULAMA (Km)	Fiziki (%)	PROGRAM ÖDENEĞİ (TL)	HARCAMA (TL)	MADDİ (%)	AÇIKLAMALAR
1.TESVİYE	2	2	15,0	15,0	%100				Muhtelif içmesuyu depo yolları ve sulama tes.yolları bitti.
2.ONARIM	3	3	9,5	9,5	%100				Bitti.
3.STABİLİZE KAPLAMA	13	13	52,0	52,0	%100				Bitti.
4.I.KAT ASFALT	9	9	27,4	27,4	%100				Bitti.(KÖYDES'ten Yapıldı.)
5.II.KAT ASFALT	6	6	13,5	13,5	%100				Bitti.(KÖYDES'ten Yapıldı.)
6.BAKIM PROGRAMLARI									
GREYDERLİ BAKIM	1	1		1170					1170 km.uygulandı.
ASFALT BAKIM	1	1		860					860 km.uygulandı.
ASFALT YAMA (Hizmet Alımı)	1	1				315.000	282.765	%90	Bitti.
ASFALT YAMA (Mal Alımı)	1	1				4.904.171	4.658.367	%95	Bitti.
7.SANAT YAPILARI	1	1				25.000	21.936	%88	Bitti.(820 mt. Büz, 32 mt.menfez)
8.TRAFİK LEVHALARI	1	1				38.000	30.219	%80	Bitti.
9.KİLİTLİ PARKE TAŞI	35	35		30.500 m2					KÖYDES projesi kapsamında 35 köyde 30.500 m2 tamamlandı.
10.İŞ MAKİNALARI ALIMI	3	3							2 adet greyder, 1 adet ekskavatör alımı yapıldı.
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>77</b>	<b>77</b>			<b>%100</b>	<b>5.282.171</b>	<b>4.993.287</b>	<b>%95</b>	



**PAZARYERİ-AHMETLER**



**GÖLPAZARI-BAYAT**



**MERKEZ-ÇUKURÖREN**



**SÖĞÜT-GEÇİTLİ**



**MERKEZ-KINIK-ERKOCA**



**MERKEZ-KINIK-ERKOCA**



**SÖĞÜT-KÜRE-HAMİTABAT**



**SÖĞÜT-KÜRE-HAMİTABAT**



**BOZÜYÜK-METRİSTEPE**



**BOZÜYÜK-METRİSTEPE**



**MERKEZ-OKLUCA**



**MERKEZ-ÖREN**



**MERKEZ-SELBÜKÜ**



**SÖĞÜT-BORÇAK**



**İNHİSAR-TARPAK-BEHÇETİYE**



**İNHİSAR-TARPAK-BEHÇETİYE**





**OSMANELİ-SOĞUCAKPINAR**





## YAMA İŞLERİNDEN GÖRÜNTÜLER





**PARKE TAŐI ALIŐMALARINDAN GÖRÜNTÜLER**



# SU ve KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

## ( 31.12.2014 Tarihi İtibariyle )

İŞİN ADI	PROGRAM (Proje Ad.)	UYGULAMA (Proje Ad.)	Fiziki (%)	PROGRAM ÖDENEĞİ (TL)			HARCA MA (TL)	MAD Dİ (%)	AÇIKLAMALAR
				ÖZEL İDARE	GENEL İDARE	TOPLAM			
<b>1.İÇMESUYU KÖYDES PROJELERİ</b>	28	28	%100		1.618.925	<b>1.618.925</b>	1.594.447	%98	KÖYDES Prj.Kapsamında 28 Proje Bitti.
<b>2.İÇMESUYU YENİ İHALELİ İŞLER</b>	3	3	%100	1.000		<b>1.000</b>		%0	Gölpazarı-Kuşçaören, Pazaryeri-Sarıdayı Yenipazar-Selim bitti.(KÖYDES)
<b>3.İÇMESUYU BAKIM ONARIM MALZEME ALIM</b>	1	1	%100	80.000		<b>80.000</b>	73.927	%92	44 Köye Malzeme Tahsis Edildi. Bitti.
<b>4.İÇMESUYU DEPOLARI KLOR ALIMI</b>	1	1	%100	19.000		<b>19.000</b>	4.720	%25	Bitti.
<b>5.İÇMESUYU YENİ SONDAJ İŞLERİ</b>	2	2	%100	0		<b>0</b>		%0	Merkez-Bekdemir Bozüyük Osmaniye bitti.(KÖYDES)
<b>6.KANALİZASYON İŞLERİ</b>	3	3	%100	0		<b>0</b>		%0	Bozüyük-Eceköy, Söğüt-Oluklu, Gölpazarı-Arıcaclar bitti.
<b>7.FOSSEPTİK YAPIMI</b>	1	1	%100	50.000		<b>50.000</b>	50.000	%100	Gölpazarı-Arıcaclar ödeneği KHGB.ne aktarıldı.
<b>8.KANALİZASYON BAKIM ONARIM İŞLERİ</b>	1	1	%100	170.000		<b>170.000</b>	163.288	%96	Malzeme Alımı yapıldı. (37 köye Malzeme Tahsis Edildi.)
<b>9.GÖLPARK ÇEVRE DÜZENLEME</b>	1	1	%100	40.000		<b>40.000</b>	3.800	%10	Bitti.
<b>10.SOSYAL HAYATA KATILIMDA MEKANSAL GELİŞİM</b>	3			100.000	312.450	<b>412.450</b>	83.833	%20	Kamp-Karavan Alanı, Yürüyüş Yol. Düz. Engelli Wc.Banyo Yapımı devam ediyor.
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>44</b>	<b>41</b>	<b>%93</b>	<b>460.000</b>	<b>1.931.375</b>	<b>2.391.375</b>	<b>1.974.015</b>	<b>%83</b>	



**GÖLPAZARI-ARICAKLAR DEPO ONARIMI (Bitti)**



**GÖLPAZARI-GÖKÇEÖZÜ DEPO ONARIMI (Bitti)**



**GÖLPAZARI-GÖZAÇANLAR DEPO ONARIMI (Bitti)**



**GÖLPAZARI-KÇ.SUSUZ DEPO ONARIMI (Bitti)**



**OSMANELİ AKÇAPINAR-GAZİLER MAH. DEPO ONARIMI (Bitti)**



**OSMANELİ – SELÇİK DEPO ONARIMI (Bitti)**



**YENİPAZAR-ESENKÖY ARITMA ve DEPO ONARIMI (Bitti)**



**YENİPAZAR-YUKARIBOĞAZ DEPO ONARIMI (Bitti)**





## GÖLPAZARI-ARICAKLAR KANALİZASYON (Bitti)





**SÖĞÜT-OLUKLU KANALİZASYON (Bitti)**



**BOZÜYÜK-ECEKÖY KANALİZASYON (Bitti)**



**PAZARYERİ GÜMÜŞDERE FOSSEPTİK (Bitti)**



**PAZARYERİ GÜMÜŞDERE FOSSEPTİK (Bitti)**

# PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

## ( 31.12.2014 Tarihi İtibariyle )

İŞİN ADI	PROGRAM (Proje Ad.)	UYGULAMA (Proje Ad.)	FİZİKİ (%)	PROGRAM ÖDENEĞİ (TL)			HARCAMA (TL)			MAD Dİ (%)
				ÖZEL İDARE	GENEL İDARE	TOPLAM	ÖZEL İDARE	GENEL İDARE	TOPLAM	
1.EĞİTİM HİZMETLERİ	51	38	%75	3.209.716	24.478.104	27.687.820	3.009.716	14.539.127	17.548.843	%63
2.TESİS BAKIM ONARIM	6	3	%50	1.756.588	1.381.499	3.138.087	712.241	1.257.432	1.969.673	%63
3.SAĞLIK HİZMETLERİ	4		%0		3.081.096	3.081.096		1.226.106	1.226.106	%40
4.KÜLTÜR ve TURİZM HİZMETLERİ	5	3	%60		1.399.173	1.399.173		793.141	793.141	%57
5.GENÇLİK ve SPOR HİZMETLERİ	2	1	%50	21.435	1.250.000	1.271.435	11.918		11.918	%1
6.GÜVENLİK HİZMETLERİ	22	20	%91		2.655.574	2.655.574		2.074.355	2.074.355	%78
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>90</b>	<b>65</b>	<b>%72</b>	<b>4.987.739</b>	<b>34.245.446</b>	<b>39.233.185</b>	<b>3.733.875</b>	<b>19.890.161</b>	<b>23.624.036</b>	<b>%60</b>

**PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ**  
**EĞİTİM HİZMETLERİ SEKTÖRÜ**  
**(31.12.2014 Tarihi İtibariyle)**

PROJE NO	PROJENİN ADI	PROGRAM ÖDENEĞİ	TOPLAM HARCAMA	FİZİKİ (%)	AÇIKLAMALAR
1-30	İlköğretim Kurumları Onarım Prj.	2.230.584	2.230.584	%100	30 İş Bitti.
31-36	Ortaöğretim Kurumları Onarım Prj.	1.911.164	1.094.610	%100	6 İş Bitti.
37	Merkez YİBO Kapalı Spor Salonu	911.577	911.577	%100	Bitti.
38	Osmaneli Halk Eğitim Mrk.yapım işi	2.544.919	2.495.649	%100	Bitti.
39	Merkez Bahçelievler Orta Okulu	430.414	0		Arsa Hukuki işleri dev.ed.
40	Mrk.Ertuğrulgazi Mah.Orta Okulu	345.000	0		Arsa Hukuki işleri dev.ed.
41	Bozüyük Saraycık Mevkii Orta Okulu	1.765.932	1.765.932	%70	Devam Ediyor.
42	Merkez 21 Derslik Anadolu İmam Hat.Lis.	1.059.716	1.059.716	%80	Devam Ediyor.
43	Merkez 8 Derslik Özel Eğt.Uyg.Mer.	1.473.590	1.473.590	%75	Devam Ediyor.
44	Merkez 16 Derslik Anadolu Sağlık Mes.Lis.ve 100 öğrenci pansiyon bin.	2.367.139	2.367.139	%40	Devam Ediyor.
45	Bozüyük 24 Derslik Tek.End.Mes.Lis.	1.874.481	1.874.481	%60	Devam Ediyor.
46	Bozüyük 24 Derslik An. İmam Hat.Lis.	350.000	0		Arsa Problemi çözüldü.İhale Aşamasında.
47	Bozüyük 300 ögr.Fen Lis.Pansiyon Bin.	3.680.000	0		Arsa tereddütü var.İh.Talimatı bekleniyor.
48	Pazaryeri Sağlık Meslek Lisesi	1.802.000	0		Arsa Bilgileri bekleniyor.
49	Mrk.İmam Hatip Pansiyon Binası	408.000	0		Mevcut Hizmet Binasının yıkımı bekleniyor.
50	Bozüyük 8 Derslik Özel Eğt.Uy.Mer.	1.533.304	1.533.304	%80	Devam Ediyor.
51	10 Grup Okul Bina Güçlendirme (Toplam 81 Bina) 1.Etap 19 Okul 2.Etap 37 Okul	3.000.000	742.261	%90	1.Etap bitti. 2.Etap devam ediyor.
<b>51</b>	<b>T O P L A M :</b>	<b>27.687.820</b>	<b>17.548.843</b>		



## BİLECİK MERKEZ YİBO KAPALI SPOR SALONU (BİTTİ)





## OSMANELİ HALK EĞİTİM MERKEZİ (BİTİ)





## OSMANELİ HALK EĞİTİM MERKEZİ (BİTTİ)



MERKEZ 16 DERSLİK SAĞLIK MES.LİS. ve 100 ÖĞRENCİ PANSİYON BİN.  
(Devam Ediyor)







**BOZÜYÜK 8 DERSLİK ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZİ (Devam Ediyor)**



16 DERSLİK Lİ ORTAOKULU BİNASI VE  
8 DERSLİK Lİ ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZİ BİNASI  
(BİLEÇİK İLİ, BOZÜYÜK İLÇESİ, SARAYCIK MEVKİİ, ÇARŞI MAHALLESİ)



## BOZÜYÜK SARAYCIK MEVKİİ 16 DERSLİK ORTA OKULU (Devam Ediyor)





**MERKEZ 21 DERSLİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (Devam Ediyor)**





**MERKEZ 8 DERSLİK ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZİ (Devam Ediyor)**





**BOZÜYÜK 24 DERSLİK END.MES.LİSESİ (Devam Ediyor)**



# İLK ve ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI ONARIM İŞLERİNDEN GÖRÜNTÜLER



# İLK ve ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI ONARIM İŞLERİNDEN GÖRÜNTÜLER



# İLK ve ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI ONARIM İŞLERİNDEN GÖRÜNTÜLER





# İLK ve ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI ONARIM İŞLERİNDEN GÖRÜNTÜLER



**PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ**  
**SAĞLIK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ**  
**(31.12.2014 Tarihi İtibariyle)**

PROJE NO	PROJENİN ADI	PROGRAM ÖDENEĞİ	TOPLAM HARCAMA	FİZİKİ (%)	AÇIKLAMALAR
1	112 Acil Çağrı Merkezi Uygulama Proje	2.181.096	1.226.106	%24	İş Devam Ediyor.
2	Küre Sağlık Evi Yapım inş.	400.000			İhale Edildi.Yer Teslimi yapıldı.
3	Bilecik Merkez Toplum Sağlığı Mrk	400.000			İhale Süreci devam ediyor.
4	Bilecik Merkez 1.Nolu Aile Sağ.Mrk	100.000			İhale edildi.Yer teslimi Yapıldı.
<b>4</b>	<b>SAĞLIK SEKTÖRÜ TOPLAMI</b>	<b>3.081.096</b>	<b>1.226.106</b>		



## 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ (Devam Ediyor)





## BİLECİK MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ (İhale Süreci Devam Ed)





**BİLECİK MERKEZ 1 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ**  
(İhale Edildi.Yer Teslimi Yapıldı.)



# BİLECİK SÖĞÜT KÜRE SAĞLIK EVİ VE LOJMAN



**PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ**  
**GENÇLİK ve SPOR HİZMETLERİ**  
**(31.12.2014 Tarihi İtibariyle)**

PROJE NO	PROJENİN ADI	PROGRAM ÖDENEĞİ	TOPLAM HARCAMA	FİZİKİ (%)	AÇIKLAMALAR
1	Merkez, İlçe ve Köy Semt Sahalarının Bakım Onarım ve Yapımı	21.435	11.918	%100	Söğüt Futbol Sahası Tel Örgü Yapımı Bitti.
2	Dodurga Beldesi Kapalı Spor Salonu	1.250.000			Arsa bilgileri bekleniyor.
<b>2</b>	<b>GENÇLİK ve SPOR HİZMETLERİ TOPLAMI</b>	<b>1.271.435</b>	<b>11.918</b>		



## SÖĞÜT FUTBOL SAHASI TEL ÖRGÜ YAPIMI (Bitti)





**PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ**  
**KÜLTÜR ve TURİZM HİZMETLERİ SEKTÖRÜ**  
**(31.12.2014 Tarihi İtibariyle)**

PROJE NO	PROJENİN ADI	PROGRAM ÖDENEĞİ	TOPLAM HARCAMA	FİZİKİ (%)	AÇIKLAMALAR
1	İl Halk Kütüphanesi Güçlendirme işi	938.944	729.799	% 100	Bitti.
2	Osmaneli Sokak Sağlamaştırma	80.888			Proje uygulaması bitti.Yapım ödeneği ve talimatı bekleniyor.
3	Osmaneli Halk Kütüphanesi Güçlendirme Prj.	37.341	17.322	% 100	Bitti.
4	Bozüyük Halk Kütüphanesi Güçlendirme Prj.	295.500			Proje iptal oldu.Ödeneği demirbaş alımına aktarılması talimatı geldi.
5	İl Kültür Md.lüğü Engelli Rampası ve Asansör Yapımı	46.500	46.020	% 100	Bitti.
<b>5</b>	<b>KÜLTÜR ve TURİZM HİZMETLERİ TOPLAMI</b>	<b>1.399.173</b>	<b>793.141</b>		



## İL HALK KÜTÜPHANESİ GÜÇLENDİRME İŞİ (Bitti.)





## İL KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ ENGELLİ RAMPASI VE ASANSÖR YAPIMI (Bitti)



**PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ**  
**TESİS BAKIM ONARIM KONUT SEKTÖRÜ**  
**(31.12.2014 Tarihi İtibariyle)**

PROJE NO	PROJENİN ADI	PROGRAM ÖDENEĞİ	TOPLAM HARCAMA	FİZİKİ (%)	AÇIKLAMALAR
1	Lojman Bakım ve Onarım Gideri	109.088	92.069	%100	Bitti.
2	Gölpark Çevre Düz.ve Onarım İşi	32.000	6.672	%100	Bitti.
3	İl Özel İdaresi Yeni Hiz.Bin.Yapım işi	1.000.000	0		Uygulama Projeleri Hazır. İhale Talimatı Bekleniyor.
4	İl Özel İd. Yeni Lojman Bin.Yapım işi	1.000	0		Uygulama Projeleri Hazır. İhale Talimatı Bekleniyor.
5	Gölpark Turizm Tan.Mrk.yapım işi	1.994.999	1.870.932	%100	Bitti.
6	Yol Hizmetleri binası Atölye ve Depoları yapım işi	1.000	0		İller bankası kredisi ile ihale edildi. (2.330.500 TL.KDV Dahil)
<b>6</b>	<b>TESİS BAKIM ONARIM TOPLAMI</b>	<b>3.138.087</b>	<b>1.969.673</b>		


# İL ÖZEL İDARESİ YENİ HİZMET BİNASI

(Uygulama Projeleri Hazır İhale Talimatı Bekleniyor.)

T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ HİZMET BİNASI  
(BİLECİK İLİ, MERKEZ İLÇESİ)



T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ HİZMET BİNASI  
(BİLECİK İLİ, MERKEZ İLÇESİ)

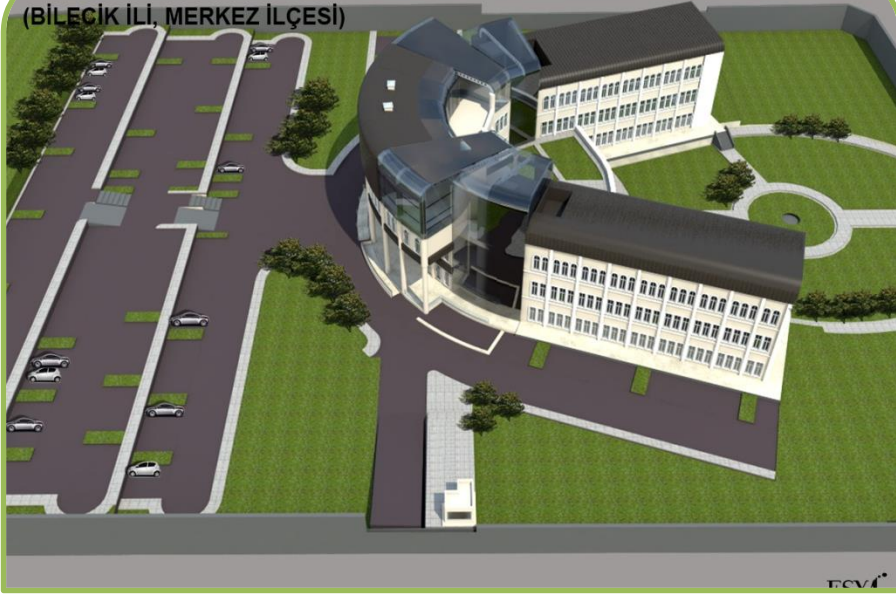

T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ HİZMET BİNASI  
(BİLECİK İLİ, MERKEZ İLÇESİ)



## İL ÖZEL İDARESİ YENİ HİZMET BİNASI

T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ HİZMET BİNASI  
(BİLECİK İLİ, MERKEZ İLÇESİ)



T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ HİZMET BİNASI  
(BİLECİK İLİ, MERKEZ İLÇESİ)



## GÖLPARK TURİZM TANITIM MERKEZİ (Bitti)



# YOL HİZMETLERİ BİNASI ATÖLYE ve DEPOLARI YAPIM İŞİ (İller Bankası Kredisi ile İhale Edildi)





**PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ**  
**GÜVENLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ**  
**(31.12.2014 Tarihi İtibariyle)**

PROJE NO	PROJENİN ADI	PROGRAM ÖDENEĞİ	TOPLAM HARCAMA	FİZİKİ (%)	AÇIKLAMALAR
1-18	Jandarma Hizmet Binaları Mantolama Yapım İşi	1.600.000	1.421.638	%95	17 İş Bitti.1 İş Devam Ediyor.
19	Polis Mes.Eğt.Mrk.Yatakh.Dış Cep.Boya ve Mantolama İşleri	65.000	46.020	%100	Bitti.
20	Polis Mes.Eğt.Mrk.Güvenli Sürüş Pisti Yapımı	270.574	270.574	%100	Bitti.
21	Jandarma Lojman Binaları Mantolama Yapım İşi	450.000	336.123	%100	Bitti.
22	Pomem Halı Saha ve Doğalgazlı Pide Fırını Yapım İşi	<b>270.000</b>			Devam Ediyor.
<b>22</b>	<b>GÜVENLİK SEKTÖRÜ TOPLAMI</b>	<b>2.655.574</b>	<b>2.074.355</b>		

# POMEM GÜVENLİ SÜRÜŞ PİSTİ (Bitti)



# JANDARMA HİZMET ve LOJMAN MANTOLAMA İŞLERİ (Bitti)



# JANDARMA HİZMET ve LOJMAN MANTOLAMA İŞLERİ (Bitti)



# JANDARMA HİZMET ve LOJMAN MANTOLAMA İŞLERİ (Bitti)



**ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ**  
**( 31.12.2014 Tarihi İtibariyle )**

PROJE NO	PROJENİN ADI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL)	PROGRAM ÖDENEĞİ (TL)	HARCAMA (TL)	FİZİKİ (%)	AÇIKLAMALAR
1	Çaltı Jeotermal Kaynak Arama ve Tesis Projesi	85.669	77.225	61.414	%90	Devam Ediyor.
2	Çocuk Oyun Parkı Grubu Alımı İşi		246.000	5.900		30 Adet Çocuk Oyun Grubu Montaj Aşamasında
3	Mesire Alanı Piknik Masası Alımı İşi		117.405	116.525	%100	Bitti. (450 adet oturma bankı alımı yapıldı.)
4	İnert Maden Atık Sahası		1.028.503	169.795	%25	Devam Ediyor.
5	Yenipazar Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı		694.145	675.584	%100	Bitti.
<b>5</b>	<b>ÇEVRE KORUMA ve KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAMI</b>	<b>85.669</b>	<b>2.163.278</b>	<b>1.029.218</b>		

# ÇALTI JEOTERMAL KAYNAK ARAMA ve TESİS PROJESİ



# YENİPAZAR HARMANKAYA KANYONU TABİAT PARKI PROJESİ





# İNERT MADEN ATIK SAHASI PROJESİ



**KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ**  
**( 31.12.2014 Tarihi İtibariyle )**

PROJE NO	PROJENİN ADI	PROGRAM ÖDENEĞİ (TL)	HARCAMA (TL)	FİZİKİ	AÇIKLAMALAR
1	Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Yardımı	58.000	50.071	%100	Bitti.
2	Temsil ve Tanıtma giderleri	46.000	24.563	%100	Bitti.
<b>2</b>	<b>KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAMI</b>	<b>104.000</b>	<b>74.634</b>		

# AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE MALZEME YARDIMI



# AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE MALZEME YARDIMI



# TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

## ( 31.12.2014 Tarihi İtibariyle )

İŞİN ADI	PROGRAM (Proje Ad.)	UYGULAMA (Proje Ad.)	FİZİKİ (%)	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL)	PROGRAM ÖDENEĞİ (TL)	HARCAMA (TL)	MADDİ	AÇIKLAMALAR
<b>1.GÖLET İNŞAATLARI</b>	1	1	%100	1.423.220	145.000	122.688	%85	Merkez-Bahçecik Sulama Göleti Bitti.
<b>2.YER ÜSTÜ SULAMA TESİSİ İNŞAATLARI</b>	2	2	%100	900.000	485.000	485.000	%100	Osmaneli-Düzmeşe Yerüstü Sul.Tesisi Merkez-Gülümbe Sul.Tesisi
<b>3.SULAMA TESİSLERİ BAKIM ONARIM</b>	1	1	%100		35.000	13.003	%37	Çerkeşli Vana Alımı Bitti.
<b>4.YEM BİTKİLERİ TOHUMU TEMİN PROJESİ ve MEYVECİLİĞİ GELİŞTİRME PROJESİ</b>	2	2	%100		220.000	220.000	%100	KHGB'ne aktarıldı.
<b>5.TARIM MAKİNALARI ALIM PROJESİ</b>	2	2	%100		30.000	30.000	%100	Merkez ve Yenipazar KHGB'ne aktarıldı. 2 Adet Sellektör Makinası alımı yapıldı.
<b>6.TAHAGEL PAYI VE HİZMET ARACI ALIMI</b>	2	2	%100		132.000	132.000	%100	4 Adet Fiat Dablo Marka Hizmet aracı alındı.
<b>7.BİLECİK İLİNİN BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİNİN İZLENMESİ PROJESİ</b>	1				217.000			İş yıllara sari olarak devam ediyor.
<b>TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAMI</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>%91</b>	<b>2.323.220</b>	<b>1.264.000</b>	<b>1.002.691</b>	<b>%79</b>	



MERKEZ BAHÇECİK SULAMA GÖLETİNDEN GÖRÜNTÜLER





MERKEZ BAHÇECİK SULAMA GÖLETİNDEN GÖRÜNTÜLER





MERKEZ GÜLÜMBE SULAMA TESİSİNDEN GÖRÜNTÜLER







OSMANELİ DÜZMEŞE SULAMA TESİSİNDEN GÖRÜNTÜLER





## CEVİZ FİDANI DAĞITIM PROJESİNDEN GÖRÜNTÜLER



**2014 YILI**  
**KÖYDES PROJELERİ UYGULAMALARI**

**( 31.12.2014 Tarihi İtibariyle )**

# BİLECİK İLİNE YILLAR İTİBARIYLA TAHSİS EDİLEN KÖYDES ÖDENEKLERİ İCMALİ

TAHSİS EDİLEN ÖDENEK	YILLAR										TOPLAM
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
KÖYYOLLARI	508.000	11.330.750	10.625.000	2.076.976	1.333.351	1.378.338	3.232.105	2.580.000	4.056.000	2.471.631	39.592.151
İÇMESULARI	315.000	1.085.000	1.230.000	1.313.024	1.209.649	1.211.714	1.181.000	820.000	1.574.503	1.438.087	11.377.977
ORTAK ALIM (TRAFİK LEVHALARI)									30.000		30.000
KANALİZASYON		273.250									273.250
SULAMA		701.000				1.368.674	1.405.000	100.000	26.497		3.601.171
SAYISAL HARİTA						175.000	125.000				300.000
<b>TOPLAM</b>	<b>823.000</b>	<b>13.390.000</b>	<b>11.855.000</b>	<b>3.390.000</b>	<b>2.543.000</b>	<b>4.133.726</b>	<b>5.943.105</b>	<b>3.500.000</b>	<b>5.687.000</b>	<b>3.909.718</b>	<b>55.174.549</b>

# KÖYYOLLARI UYGULAMALARI

## ( 31.12.2014 Tarihi İtibariyle )

İLÇE ADI	2014 YILI TAHSİS EDİLEN ÖDENEK (TL)	ÖNCEKİ YILLAR ARTAN ÖDENEKLER (TL)	HARCA MA (TL)	UYGULANACAK PROGRAM					UYGULAMA DURUMU				AÇIKLAMALAR	
				TAŞ DUVAR (m3)	STABİLİZE (KM)	I.KAT ASFALT (Mt)	II.KAT ASFALT (Mt)	PARKE TAŞI (M2)	BİTEN (Ad)	DEVAM EDEN (Ad)	BAŞLAMAYAN (Ad)	TOPLAM (Ad)		
MERKEZ	700.000		700.000			6,3	4,5			4			4	1-Kıvık,2-Selbükü,3-Ören,4-İlyasbey Erkoca Grup Köy yolu Bitti.
BOZÜYÜK	512.176		511.898			4,3				1			1	1-Cihangazi-Karaçayır-Osmaniye-Gökçeli Grup Köy yolu Bitti.
GÖLPAZARI	198.936	54.939	114.815					15.250		2	2		4	1-Muhtelif Köylere Parke Taşı Bitti. 2-Kümbet-Demirhanlar Parke Taşı Bitti.3-Derelidamları Asfalt Dev. Ed. 4- Çımışkı Asfalt Dev. Ed.
İNİSAR	173.908	72.423	246.331				5,0	7.000		4			4	1-Çayköy-Akköy-Harmanköy Grup Köy yolu, 2-Tarapak, 3-Muhtelif Köylere Parke Taşı, 4-Samrı Köyü Parke Taşı Bitti.
OSMANELİ	404.589	395.601	799.636		6,1	6,1		3.250		3			3	1-Soğucakpınar-Gölpazarı Hd.İlt.Gr.Ky.Stabilize Bitti. 2-Soğucakpınar-Gölpazarı Hd.İlt.Gr.Ky. Asfalt Bitti. 3-Muh. Köylere Parke Taşı Bitti.
PAZARYERİ	100.000		100.000			1,0				1			1	1-Ahmetler Grup Köy Yolu Bitti.
SÖĞÜT	326.605	299.000	589.450	341,18		9,7	4,0			6			6	1-Borcak,2-Küre-Hamitabat-Tuzaklı-Kayabalı Grup Köy yolu,3-Geçitli,4-Küre,5-Hamitabat Taş Duvar,6-Çaltı Taş Duvar İşleri Bitti.
YENİPAZAR	55.417	10.577	65.994					5.000		2			2	1-Muhtelif Köylere Parke Taşı Bitti. 2-Yumaklı-Danişment Parke Taşı İşleri Bitti.
<b>TOPLAM</b>	<b>2.471.631</b>	<b>832.540</b>	<b>3.128.124</b>	<b>341,18</b>	<b>6,1</b>	<b>27,4</b>	<b>13,5</b>	<b>30.500</b>	<b>23</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>25</b>		

# İÇMESULARI UYGULAMALARI

## ( 31.12.2014 Tarihi İtibariyle )

İLÇE ADI	2014 YILI TAHSİS EDİLEN ÖDENEK (TL)	ÖNCEKİ YILLAR ARTAN ÖDENEKLER (TL)	HARCA MA (TL)	PROGRAM DURUMU			UYGULAMA DURUMU					AÇIKLAMALAR	
				SENE BAŞI PLANLANAN (Ad)	EK PROGRAM (Ad)	TOPLAM (Ad)	BİTEN (Ad)	DEVAM EDEN (Ad)	İHALE AŞAMASINDA (Ad)	BAŞLAMAYAN (Ad)	TOPLAM (Ad)		
MERKEZ	128.177	9.392	137.569	3		3	3					3	1-Erkoca 2-Ören 3-Bekdemir Bitti.
BOZÜYÜK	0	83.939	83.939	0	2	2	2					2	1-Bozalan Bitti,2-Kuyupınar,Kapanalan Grb.Bitti.
GÖLPAZARI	587.885		587.885	7	5	12	12					12	1-Keskin,2-Arıcaıklar,3-Dereli, 4-Gökçeözü,5-Gözaçanlar,6-Küçükşusuz, 7-Sarıhacılar-Cansızlar Mah., 8-Küçükyenice, 9-Softalar, 10-Söğütçük, 11-Hacıköy, 12-Tongurlar Bitti.
İNİSAR	0					0						0	
OSMANELİ	198.782		175.277	3	2	5	5					5	1-Selçik,2-Akçapınar-Gaziler Mah., 3-Sarıyazı-Benli Mah. 4-Ağlan,5-Avdan Bitti.
PAZARYERİ	266.901		266.901	1		1	1					1	1-Sarıdayı Bitti.
SÖĞÜT	0					0						0	
YENİPAZAR	256.342	87.507	342.876	4	1	5	5					5	1-Esenköy,2-Kavacık, 3-Kükürt,4-Yukarıboğaz, 5-Belkese-Tohumlar Bitti.
<b>TOPLAM</b>	<b>1.438.087</b>	<b>180.838</b>	<b>1.594.447</b>	<b>18</b>	<b>10</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	
